

वार्षिक प्रगति पुस्तिका

(आ.व. २०८१/८२)



नेपाल सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ

कीर्तिपुर, काठमाडौं

वार्षिक प्रगति पुस्तिका

(आ.व. २०८१/८२)



नेपाल सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ

कीर्तिपुर, काठमाडौं

वार्षिक प्रगति पुस्तिका (आ.व. २०८१/८२)

प्रकाशक:

**पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना
केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ
कीर्तिपुर, काठमाडौं**

फोन नं. : ०१-५५०५०३७

इमेल : cpmu.nafha@gmail.com

वेबसाइट : www.nafha.gov.np

प्रकाशन वर्ष : २०८३

©पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं।

प.क्षे.का.फ.वि.आ. (२०८३). वार्षिक प्रगति पुस्तिका (आ.व. २०८१/८२), पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं।

NAFHA (2026), Annual Progress Report Book (2024/2025), Nuts and Fruits in Hilly Areas Project, Central Project Management Unit, Kirtipur, Kathmandu.

दुई शब्द

भौगोलिक बनावट र विविधतायुक्त हावापानीका कारण नेपालमा विश्वमा खेती गरिने अधिकांश फलफूलहरूको खेती गर्न सकिन्छ। परापूर्वकालदेखि नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले फलफूलको महत्त्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको पाइन्छ भने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक सम्वृद्धि र वातावरणीय संरक्षणमा समेत यसको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यसैगरी पछिल्लो समयमा मध्यपहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूबाट देशका अन्य क्षेत्रमा हुने बसाइसराइ तथा कामको सिलसिलामा विदेशिने युवा जनशक्तिको बढ्दो क्रमले गर्दा त्यस क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो रहने क्रमसमेत कहालीलाग्दो अवस्थामा छ। यसैगरी फलफूलको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिको प्रशस्त सम्भाव्यता हुँदाहुँदै देश भित्रको उत्पादनले हाम्रो मागलाई धान्न सकिरहेको छैन भने तथ्याङ्कीय हिसाबले हेर्दा हालका वर्षहरूमा फलफूलको उपभोग तथा आयातमा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा पहाडी क्षेत्रहरूमा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति तथा कृषि क्षेत्रबाट युवाशक्ति पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहाडी क्षेत्रहरूमा फलफूल बालीहरूका बगैँचा विकास र विस्तारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना तथा लाभग्राही किसानहरूको आयस्तर वृद्धिमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य लिएर एसियाली विकास बैंकको सहूलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहलगानीमा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १०० वटा स्थानीय तहहरूमा आ.व. २०७९/८० देखि २०८६/८७ अवधि (जम्मा ७ वर्ष) को लागि दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई यस पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना लागू भएको छ। यस आयोजनाले कम्तीमा ३०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १०,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा एभोकाडो, ओखर, कागजी बदाम, किवी, मेकेडेमीया नट, पिकानट, स्याउ, सुन्तला, जुनार र कागतीको बगैँचा स्थापना साथै कम्तीमा १०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विकास, फलफूल बालीहरूको नर्सरी सुदृढीकरण तथा बागवानीजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यस आयोजनाको केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ र मातहतका ६ वटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट गत वर्ष सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने र सिकाइहरूको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले यस वार्षिक पुस्तिकामा आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या तथा सवालहरू लगायतका विषयहरूको तथ्यगत विश्लेषण प्रयास गरिएको छ।

यस प्रकाशनमा यसका अतिरिक्त केन्द्र सरकारबाट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको प्रगतिसमेत समेटिएको छ। यस प्रकाशनमा समावेश भएका विभिन्न विवरण, तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू यस क्षेत्रमा रुची राख्ने अध्ययनकर्ता, विद्यार्थीहरू, कृषक व्यवसायी, नीति निर्माता एवम् फलफूल विकासको क्षेत्रमा कार्य गर्ने जो कोहीलाई उपयोगी हुने र सञ्चालित कार्यक्रमहरूको विश्लेषणले आगामी योजना तर्जुमामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

यस प्रकाशनलाई सार्थकता दिने सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सन्तोष राज पौडेल एवम् सो कार्यमा सहयोग गर्नु हुने योजना अधिकृत कृष्ण प्रसाद उपाध्या लगायत पुस्तिका तयारीका सिलसिलामा सहयोग गर्नुहुने केन्द्रीय व्यवस्थापन एकाइका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरू एवम् अन्य सम्बद्ध सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अन्तमा, यस प्रकाशनका सन्दर्भमा रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाहको समस्त पाठक वर्गबाट अपेक्षा गरेको छ।

महेश चन्द्र आचार्य
आयोजना निर्देशक

विषयसूची

खण्ड-क

१. परिचय	१
१.१ पृष्ठभूमि	१
१.२ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रभावहरू (Impact)	१
१.३ आयोजनाले परिलक्षित गरेका उपलब्धिहरू (Outcomes)	१
१.४ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रतिफलहरू (Outputs).....	१
१.४.१ नर्सरी तथा बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि संस्थागत क्षमता विकास (Institutional capacity for nursery and horticulture sector management improved)...	१
१.४.२ आयोजनाका लाभग्राही कृषकहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (Production and productivity of project farmers increased).....	२
१.४.३ पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (Value addition to hilly area horticulture produce enhanced)	३
१.५ आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहहरू	३
१.६ आयोजनाको सङ्गठन संरचना	८
१.७ केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको सङ्गठन संरचना	९
१.८ आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको सङ्गठन संरचना	११
१.९ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्कको सङ्गठन संरचना.....	१२
१.१० आयोजना सम्बद्ध निकाय एवम् समितिहरूको कार्य विवरण र जिम्मेवारी (Project Implementation Organizations: Roles and Responsibilities)	१३
१.११ आयोजनाबाट प्रवाह हुने अनुदान सहयोग (स्किमहरू)	२०
१.१२ जनशक्ति विवरण	२१
१.१३ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण	२२
१.१४ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन भएका प्रयासहरू	२३
१.१५ आयोजनाका हालसम्मका आयोजना निर्देशकहरूको विवरण.....	२३


खण्ड-ख

२. आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र प्रगति विवरण	२७
२.१ आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा स्रोतगत विनियोजन विवरण.....	२७
२.२ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति विवरण.....	२८

२.२.१	आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्य तथा प्रगतिको विश्लेषणात्मक समीक्षा	२८
२.२.२	आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण.....	२८
२.२.३	आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको विस्तृत विवरण.....	३०
२.३	विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण	३८
२.३.१	कच्चेबारी प्रगति विवरण	३८
२.३.२	बेरुजु फछ्यौँटको वार्षिक प्रगति विवरण	६१
२.४	आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम.....	६२
२.४.१	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौँ.....	६२
२.४.२	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश	७१
२.४.३	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश	७४
२.४.४	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश.....	७८
२.४.५	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश.....	८१
२.४.६	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश	८४
२.४.७	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्	८९


खण्ड ग

३.१	आ.व. २०८१/८२ को लागि उपलब्ध आयोजना लक्षित फलफूल बिरुवाको विवरण.....	९५
३.२	आयोजना सञ्चालन हुने ब्याच १, ब्याच २ र ब्याच ३ का स्थानीय तहहरूको विवरण.....	१०१

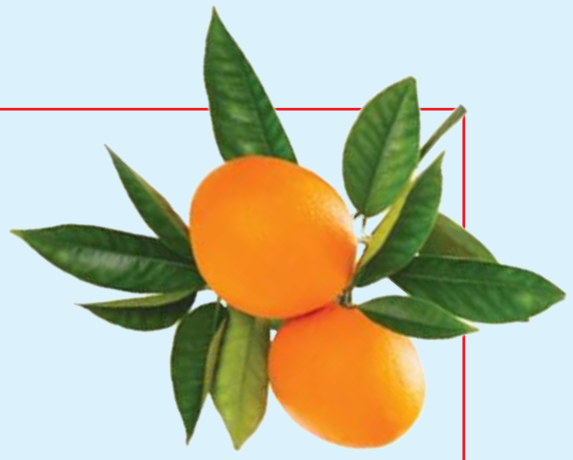

खण्ड-क

नीतिगत अवधारणा र सङ्गठन

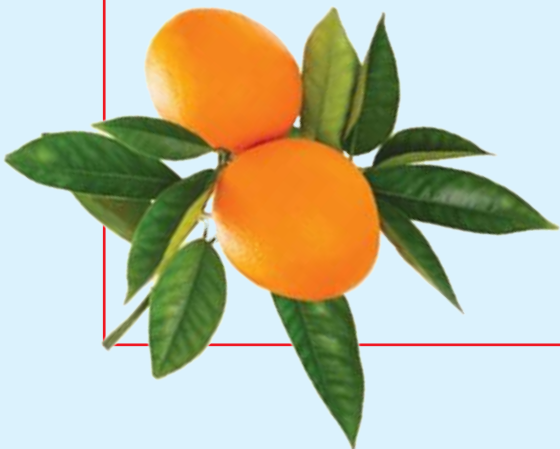

१. परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति तथा कृषि क्षेत्रबाट युवाशक्ति पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहाडी क्षेत्रहरूमा फलफूल बालीहरूका बगैँचा विकास र विस्तारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना तथा लाभग्राही किसानहरूको आयस्तर वृद्धिमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य लिएर एसियाली विकास बैंकको सहूलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहलगानीमा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १०० वटा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८६/८७ सम्म (जम्मा ७ वर्षको अवधि) लागि सञ्चालन हुने गरी एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारबीच मिति २०७९/०७/२१ मा सम्झौता भई यस पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना लागू भएको छ। यस आयोजनाले कम्तीमा ३०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १०,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तोकिएका फलफूल बालीहरू: एभोकाडो, ओखर, कागजी बदाम, कागती, किवी, जुनार, मेकाडेमिया नट, पेकान (चुच्चे ओखर), स्याउ (उच्च घनत्वसमेत) र सुन्तलाको बगैँचा विकास तथा विस्तारका साथै कम्तीमा १०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विकास, फलफूल बालीहरूको नर्सरी सुदृढीकरण र व्यवस्थापन तथा बागवानीजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

१.२ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रभावहरू (Impact)

- ग्रामीण घरपरिवारको जीवनस्तरमा सुधार,
- कृषकहरूको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमतामा सुधार।

१.३ आयोजनाले परिलक्षित गरेका उपलब्धिहरू (Outcomes)

- नर्सरी व्यवस्थापनमा सुधार (improved nursery management),
- फलफूल बगैँचाहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व सुधार,
- फलफूल मूल्य शृङ्खला तथा व्यावसायीकरणमा सुधार,
- बगैँचा विकासमा सहभागी हुन नसक्ने साना कृषकहरूलाई तरकारी तथा अन्य बालीमार्फत सहयोग।

१.४ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रतिफलहरू (Outputs)

यस आयोजनाले निम्नलिखित तीनवटा प्रतिफलहरू परिलक्षित गरेको छ।

१.४.१ नर्सरी तथा बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि संस्थागत क्षमता विकास (Institutional capacity for nursery and horticulture sector management improved)

यस प्रतिफल हासिल गर्न आयोजनाबाट निम्नलिखित क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनेछन्।

- फलफूल बालीहरूको गुणस्तरीय बिरुवाहरूको सुनिश्चितताको आवश्यक पर्ने कानुनी मापदण्डहरूको तयारी तथा कार्यान्वयन,

- सङ्घीय, प्रादेशिक तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतका आयोजना लक्षित बालीहरूसँग सम्बन्धित सरकारी फार्म/अनुसन्धान केन्द्रहरूको संस्थागत सुधारको लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, प्रयोगशालाको क्षमता सुधार, लक्षित बालीहरूका नवीन जातहरूको जर्मप्लाज्म खरिद, संरक्षण एवम् विस्तार,
- बागवानी क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको विशिष्टिकृत क्षमता विकास,
- लक्षित फलफूल बालीहरूको गुणस्तरीय बिरुवाहरूको आपूर्ति शृङ्खलाको सुनिश्चितताको लागि निजी नर्सरीहरूको संस्थागत क्षमता विकासको लागि आयोजनाको स्किम ६ मार्फत पुरक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन।

१.४.२ आयोजनाका लाभग्राही कृषकहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (Production and productivity of project farmers increased)

यस प्रतिफल हासिल गर्न निम्नलिखित क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनेछन्।

- कम्तीमा ३०००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १०००० हेक्टर क्षेत्रफलमा आयोजनाका लक्षित फलफूल बालीहरूको बगैँचा विकास र विस्तार गर्ने,
- कम्तीमा १०००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विस्तार गर्ने,
- आयोजना लक्षित बालीहरूको उन्नत खेती पद्धति प्रवर्द्धनको लागि ४०००० कृषकहरूको प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने,
- आयोजना लक्षित फलफूल बालीहरूको बगैँचा विकास तथा विस्तार गर्न इच्छुक कृषि उद्यमी, कृषि सहकारी तथा कृषक समूहहरूलाई आयोजनाको स्किम २ मार्फत अनुदान प्रवाह गर्ने,
- स्किम २ मार्फत विकास गरिएका फलफूल बगैँचामा रोपिएका फलफूल बिरुवाहरू हुर्काएबापत कार्यविधि अनुसार प्रोत्साहन अनुदान (Plant Survival Incentive) प्रदान गर्ने,
- तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विकासको लागि कार्यविधि बमोजिम आंशिक अनुदान प्रदान गर्ने,
- फलफूल बगैँचा विकास तथा विस्तारको लागि अनुदानग्राहीहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय पहुँच सुनिश्चितताको लागि आयोजनाको स्किम १ मार्फत क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड (Credit Guarantee Fund) को स्थापना गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,
- पहाडी क्षेत्रमा बाँझो रहेका जमिनमा फलफूल बगैँचा विस्तार गरी सोमार्फत हुन सक्ने कार्वन कारोबारको सम्भावनाका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्ने,
- आयोजनाको Crop and Land Database System विकास गरी Customized Digital Advisory System को विकास तथा प्रयोग गर्ने।

१.४.३ पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (Value addition to hilly area horticulture produce enhanced)

यस प्रतिफल हासिल गर्न आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा बागवानीजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खलाका पात्रहरूको (Actors) सहभागिताको सुनिश्चततामार्फत नाफामूलक बजारीकरण अवसरहरूको सृजना तथा उपयोगको लागि कृषि सहकारी, निजी व्यवसायी तथा सेवा प्रदायक तथा स्थानीय तहहरूलाई मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न आयोजनाका विभिन्न स्किमहरूमार्फत आयोजनाले निम्नलिखित पुरक अनुदान क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ।

- कृषक सहकारी तथा स्थानीय कृषक संस्थाहरूलाई व्यावसायिक योजना तयारी, असल कृषि अभ्यास, खाद्य स्वच्छता तथा अन्य मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण पद्धतिहरूका विषयहरूमा क्षमता विकास गर्ने,
- बागवानीजन्य उत्पादनका खरिदकर्ताहरू तथा उत्पादक कृषक उद्यमी, कृषक समूह तथा सहकारीहरूबीच खरिद सम्बन्धी सम्झौता (Buy back agreement) तथा सोको दिगोपनका लागि सहजीकरण गर्ने,
- बागवानीजन्य वस्तुको उत्पादानोपरान्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधि, पूर्वाधार तथा औजार उपकरणहरूमा अनुदान सहयोग गर्ने,
- मूल्य शृङ्खला विकासका संरचनाहरूको विकासका लागि आयोजनाको स्किम ३ मार्फत सहकारीहरूलाई, स्किम ४ मार्फत निजी कृषि व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकहरूलाई पुरक अनुदान तथा स्किम ५ मार्फत स्थानीय तहहरूलाई सहलगानी प्रदान गर्ने।

१.५ आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहहरू


यो आयोजना कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी जम्मा ५ वटा प्रदेशका ३४ जिल्लाहरूका १०० वटा स्थानीय तहहरू ब्याच १, ब्याच २ र ब्याच ३ गरी जम्मा १०००० हेक्टरमा तालिका १ अनुसार सञ्चालन हुनेछ।

तालिका १: आयोजना कार्यान्वयन हुने प्रदेश, जिल्ला, लक्षित क्षेत्रफल र स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या

प्रदेश	जिल्ला	लक्षित क्षेत्रफल (हे.)	स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या			
			ब्याच १	ब्याच २	ब्याच ३	जम्मा
कोशी	७	२२००	१	११	१०	२२
बागमती	३	११५०	१	७	०	८
गण्डकी	१०	२५००	२	१३	१९	३४
कर्णाली	९	२६००	१	९	१०	२०
सुदूरपश्चिम	५	१५५०	१	६	९	१६
जम्मा	३४	१००००	६	४६	४८	१००

यस आयोजना सञ्चालन हुने ५ वटा प्रदेशका ३४ जिल्लाहरू र अन्तर्गतका १०० वटा स्थानीय तहहरू एवम् ती स्थानीय तहहरूमा तोकिएका लक्षित फलफूलबालीहरूको क्षेत्रफल सहितको विस्तृत विवरण तालिका २ मा उल्लेख गरिएको छ।

यस आयोजना कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी जम्मा ५ वटा प्रदेशका ३४ जिल्लाहरूका १०० वटा स्थानीय तहहरू ब्याच १, ब्याच २ र ब्याच ३ गरी जम्मा १०००० हेक्टरमा तालिका १ अनुसार सञ्चालन हुनेछ।

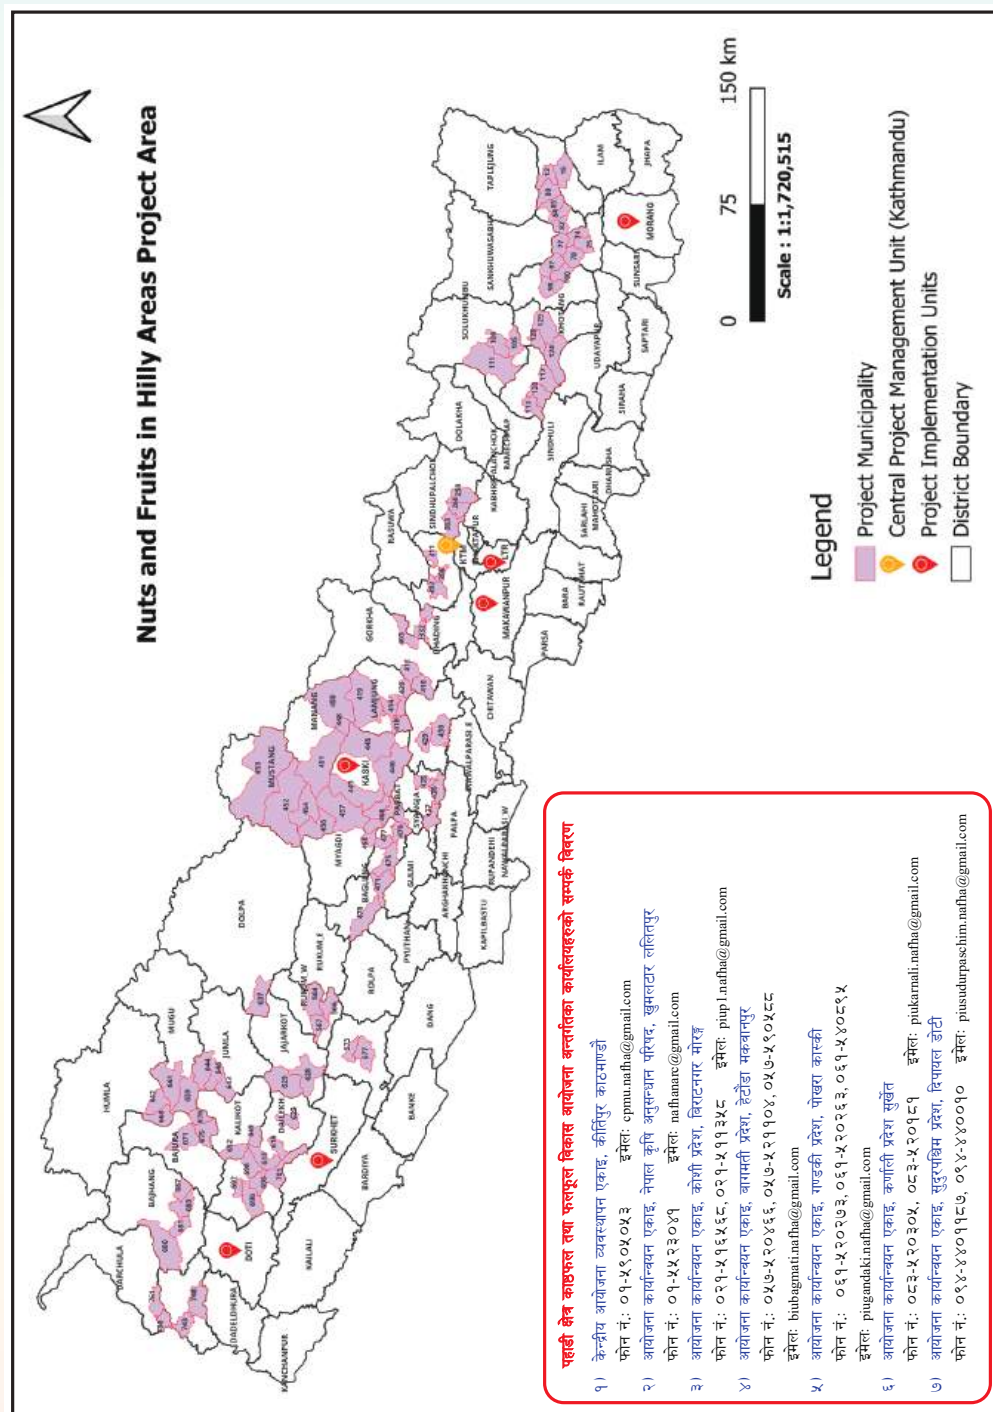

तालिका २: आयोजना कार्यान्वयन हुने प्रदेश, जिल्ला, लक्षित फलफूलबालीहरूको क्षेत्रफल सहितको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	स्थानीय तह	फलफूलको क्षेत्रफल
१	कोशी (७ जिल्लाका २२ स्थानीय तहहरू)	पाँचथर	हिलिहाड, फिदिम	• स्याउ (उच्च घनत्वसमेत) ५० हे. • एभोकाडो ३०० हे. • सुन्तला/जुनार ७०० हे. • किवी ४०० हे. • कागती ४०० हे. • ओखर ५० हे. • मेकाडेमिया नट २०० हे. जम्मा २१०० हे.
		तेह्रथुम	आठराई, लालीगुराँस, म्याङलुङ, फेदाप	
		धनकुटा	छथर जोरपाटी, धनकुटा, महालक्ष्मी, पाखिबास	
		भोजपुर	अरुण, भोजपुर, पौवादुङमा	
		खोटाङ	हलेसी तुवाचुङ, रावा बेसी, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी	
		ओखलढुंगा	चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ, सुनकोशी	
		सोलुखुम्बु	सोलुदुधकुण्ड, थुलुङ दुधकोशी, माण्य दुधकोशी	
२	बागमती (३ जिल्लाका ८ स्थानीय तहहरू)	नुवाकोट	लिखु, तादी	• सुन्तला/जुनार २५० हे. • मेकाडेमिया नट ३०० हे. • कागती २५० हे. • ओखर १०० हे. • एभोकाडो १५० हे. • किवी १०० हे. जम्मा ११५० हे.
		सिन्धुपाल्चोक	चौतारा साँगाचोकगढी, ईन्द्रावती, मेलम्ची	
		धादिङ	नेत्रावती डबजोङ, त्रिपुरासुन्दरी, गजुरी	
३	गण्डकी (१० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहहरू)	गोरखा	आरूघाट, पालुङटार, सिरानचोक	• स्याउ (उच्च घनत्वसमेत) १०० हे. • किवी १५० हे. • सुन्तला/जुनार ८५० हे. • ओखर २५० हे. • कागती ७५० हे. • मेकाडेमियानट नट २५० हे. • एभोकाडो १५० हे. जम्मा २५०० हे.
		लमजुङ	बेसीशहर, मध्यनेपाल, मर्स्याङ्दी, राइनास, सुन्दरबजार	
		तनहुँ	म्याग्दे, ऋसिङ	
		कास्की	अन्नपूर्ण, मादी, पोखरा	
		स्याङ्जा	विरुवा, चापाकोट, गल्याङ	
		पर्वत	जलजला, कुश्मा, मोदी, फलेवास	
		मुस्ताङ	वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो-घेकर दामोदरकुण्ड, घरपझोङ, थासाङ	
		मनाङ	नासौ, मनाङ डिस्याङ, चामे	
		म्याग्दी	अन्नपूर्ण, बेनी	
		बागलुङ	बडिगाड, गल्कोट, जैमिनी, काठेखोला, निसीखोला	

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	स्थानीय तह	फलफूलको क्षेत्रफल
४	कर्णाली (९ जिल्लाका २० स्थानीय तहहरू)	रुकुम पश्चिम	बाँफिकोट, मुसिकोट, सानी भेरी	• सुन्तला/जुनार ५०० हे. • कागजी बदाम ५० हे. • ओखर ६०० हे. • स्याउ (उच्च घनत्वसमेत) १००० हे. • चुचे ओखर ५० हे. • किवी १०० हे. • कागती ३०० हे. जम्मा २६०० हे.
		सल्यान	सिद्ध कुमाख, शारदा	
		जाजरकोट	छेडागाड, जुनीचाँदे	
		दैलेख	आठवीस, नारायण, चामुन्डा बिन्द्रासैनी	
		कालीकोट	शुभकालिका, नरहरीनाथ	
		जुम्ला	हिमा, सिंजा, कनकासुन्दरी	
		मुगु	खत्याड, सोरु	
		हुम्ला	ताँजाकोट, अदानचुली	
		डोल्पा	मुङ्केचुला	
५	सुदूरपश्चिम (५ जिल्लाका १६ स्थानीय तहहरू)	अछाम	बान्नीगढी जयगढ, कमलबजार, मङ्गलसेन, पञ्चदेवल विनायक, तुर्माखाँद	• स्याउ (उच्च घनत्व समेत) २५० हे. • पिकानट १०० हे. • सुन्तला/जुनार ३०० हे. • कागजी बदाम ९० हे. • कागती १३० हे. • ओखर ६५० हे. • किवी ३० हे. जम्मा १५५० हे.
		बाजुरा	बुढीनन्दा, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर	
		बैतडी	दशरथचन्द, पाटन	
		बझाङ	छविसपाथिभेरा, मष्टा, जयपृथ्वी, बुङ्गल	
		दार्चुला	शैल्यशिखर, लेकम	
जम्मा	५	३४	१००	१०००० हे.

आयोजना लक्षित बालीहरु :



कागजी बदाम



स्याउ



मेकाडेमिया



किवी



एभोकाडो



सुन्तला



ओखर



कागती



जुनार

तरकारी तथा अन्य वाली



कोदो



जौ



फापर




चुच्चे ओखर


तरकारी वाली



१.६ आयोजनाको सङ्गठन संरचना

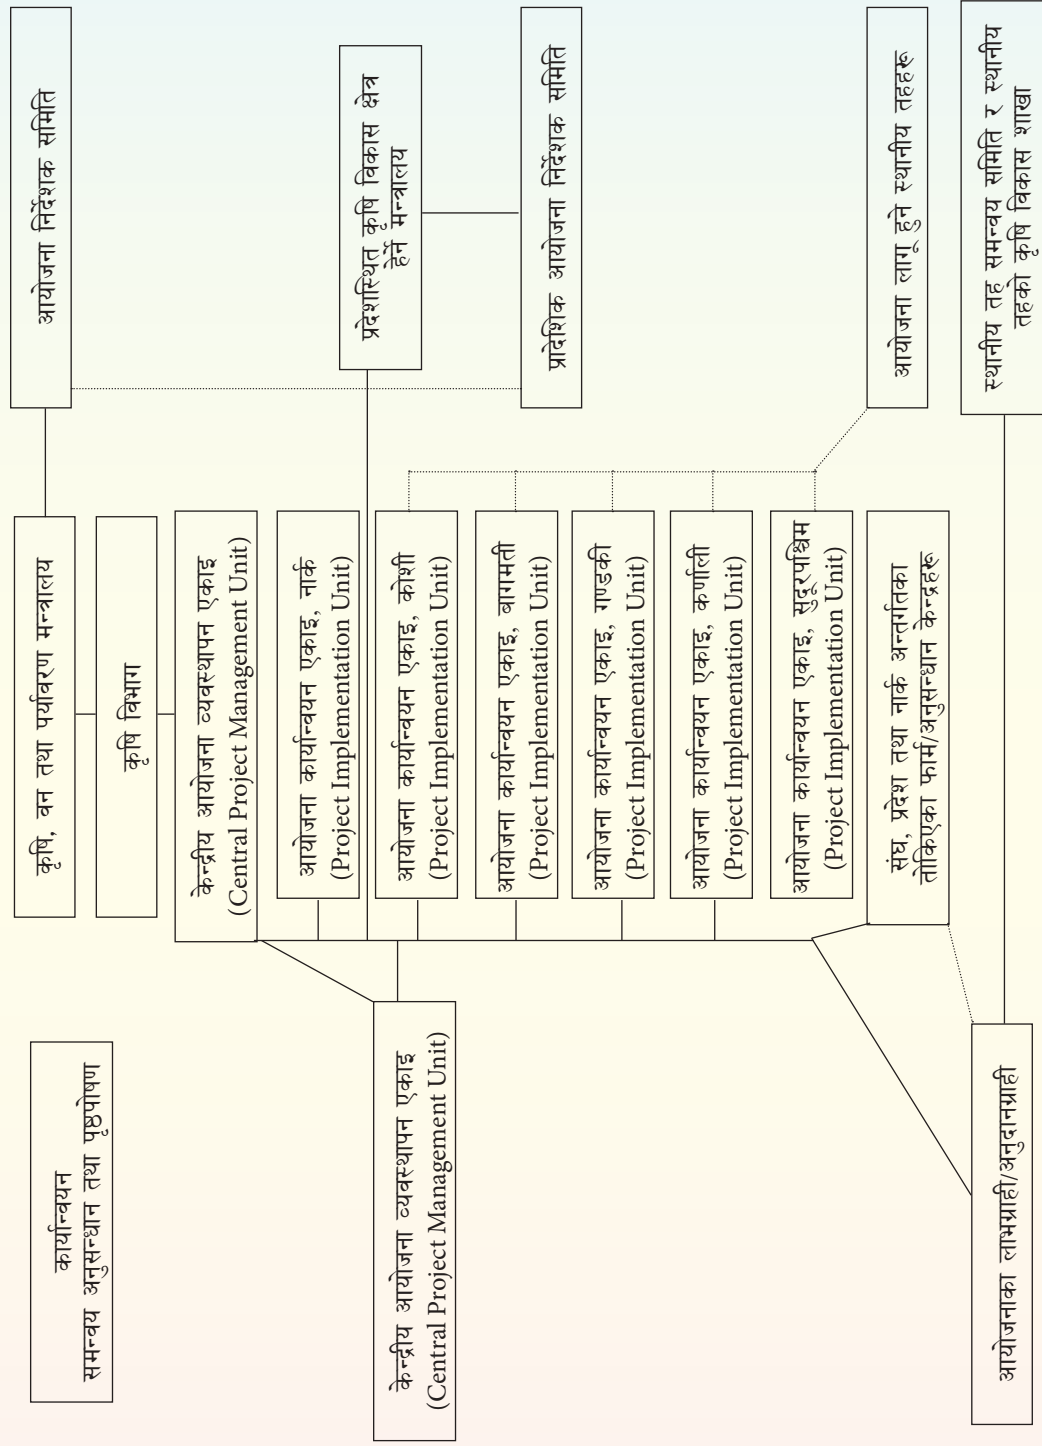

१.७ केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको सङ्गठन संरचना

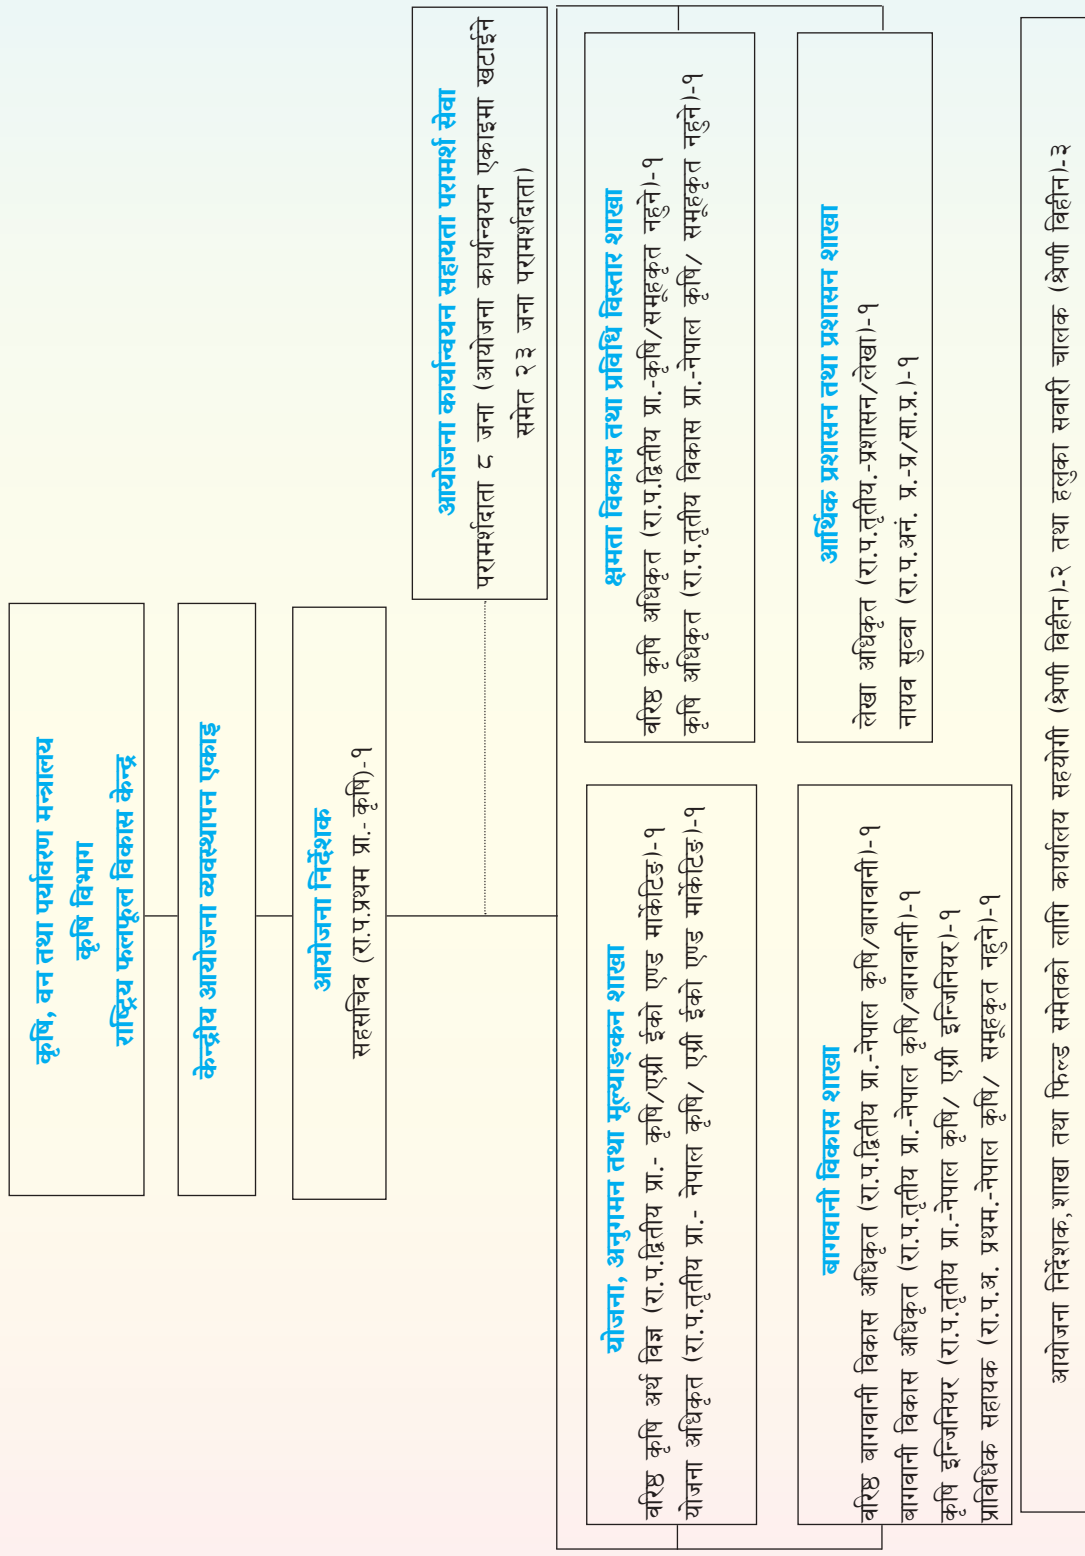

तालिका ३: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको स्वीकृत दरवन्दी


क्र. सं.	पद	श्रेणी	सेवा	समूह	स्वीकृत दरवन्दी	कैफियत
१	आयोजना निर्देशक	रा.प. प्रथम	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	स्थायी कर्मचारीबाट पद पूर्ति हुने
२	वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ	रा.प. द्वितीय	नेपाल कृषि	एग्री.इको. एण्ड मार्केटिङ	१	
३	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	रा.प. द्वितीय	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	
४	वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत	रा.प. द्वितीय	नेपाल कृषि	बागवानी	१	
५	योजना अधिकृत	रा.प. तृतीय	नेपाल कृषि	एग्री.इको. एण्ड मार्केटिङ	१	
६	कृषि अधिकृत	रा.प. तृतीय	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	
७	लेखा अधिकृत	रा.प. तृतीय	प्रशासन	लेखा	१	
८	बागवानी विकास अधिकृत	रा.प. तृतीय	नेपाल कृषि	बागवानी	१	
९	प्राविधिक सहायक (कृषि)	रा.प.अनं. प्रथम	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	
१०	नायब सुब्बा	रा.प.अनं. प्रथम	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	१	
११	कृषि इन्जिनियर	रा.प. तृतीय	नेपाल कृषि	एग्री इन्जिनियरिङ	१	स्थायी/करारबाट पद पूर्ति हुने
१२	हलुका सवारी चालक	श्रेणी विहीन			३	
१३	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहीन			२	
	जम्मा				१६	

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइलाई आयोजना कार्यान्वयन सहयोगका लागि आयोजना कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाताहरूको (Project Implementation Support Consultants) देहाय बमोजिम संरचनाको व्यवस्था रहेको छ।

Responsibility	Position	Inputs
Project management support consultants	Team leader/Horticulturist	CS06–(national-45 PM)
	Financial management specialist	CS06–(national-18 PM)
	Monitoring and evaluation specialist	CS06–(national-45 PM)
	Procurement specialist	CS06–(national-13 PM)
	Rural finance specialist	CS06–(national-23 PM)
	Social safeguards specialist	CS06–(national-11 PM)
	Environment safeguards specialist	CS06–(national-11 PM)
	GESI specialist	CS06–(national-11 PM)
	GAFFSP coordinator	

CS = consulting services; GESI = gender equality and social inclusion; PM = person months.

१.८ आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको सङ्गठन संरचना

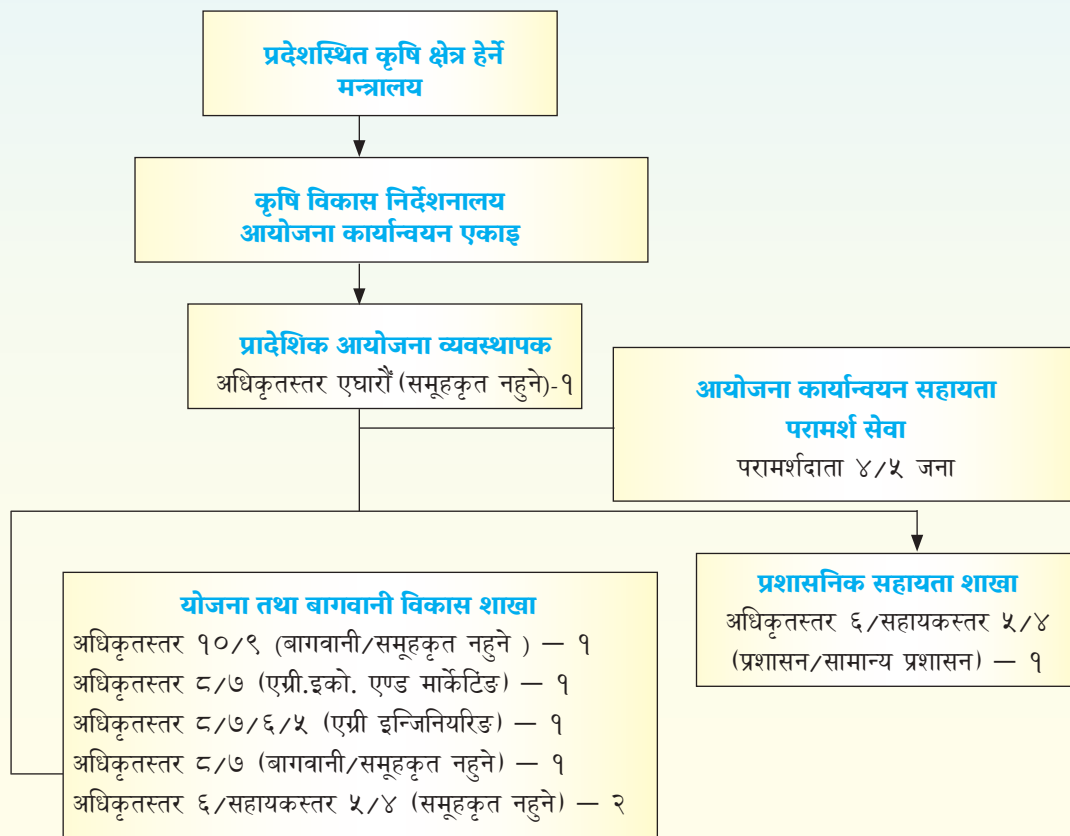

प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापक, शाखा तथा फिल्ड समेतको लागि कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहीन)-१ तथा हलुका सवारी चालक (श्रेणी विहीन)-१)

Responsibility	Position	Class ^a
Provincial project coordination	Provincial project manager	Chief, DOAD
Planning and horticulture development	Horticulture / agriculture officer	Level 10/9
	Agriculture economist	Level 8/7
	Agriculture engineer / engineer / sub-engineer	Level 8/7/6/5
	Horticulture / agriculture officer – gender focal ^b	Level 8/7
	Agriculture technician (junior technician / junior technical assistant) – 2 positions	Level 6/5/4
Financial management	Account officer	Level 8/7/6
Administrative support	Administration	Level 6/5/4
	Driver	
	Office Assistant	

Responsibility	Position	Class ^a
Project management support consultant	Provincial team leader	CS06–(national-60 PM)
	Provincial gender and social specialist	CS06–(national-30 PM)
	Provincial environment specialist	CS06–(national-30 PM)
	Agriculturist	CS06–(national-60 PM) ^c

^a Flexibility on position level is allowed depending on staff availability.

^b Gender focal will be assigned from among the officers.

^c Gandaki Province with two positions.

१.५ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्कको सङ्गठन संरचना

Responsibility	Position	Class
NARC Component implementation coordination	Principal / senior scientist (NAFHA focal person)	S4/S6
Research planning and implementation	Scientist (horticulture)	S1/S2
Design and supervision of construction works	Agriculture engineer	S1/S2
Administrative management	Administrative officer	A6/A7
Financial management	Account officer	A6/A7
Project management support consultant	Supported by CPMU project management support consultant (see Table 1)	CS06

१.१० आयोजना सम्बद्ध निकाय एवम् समितिहरूको कार्य विवरण र जिम्मेवारी (Project Implementation Organizations Roles and Responsibilities)

Project Implementation Organizations	Roles and Responsibilities
Project steering committee (PSC)	Chair: Secretary MOALD Members: • Joint Secretary, NPC • Joint Secretary, International Economic Cooperation Coordination Division, MOF • Executive Director, NRB • Executive Director, NARC • Joint Secretary, Office of Prime Minister and Council of Ministers • Joint Secretary, Planning and Development Cooperation Coordination Division, MOALD • Joint Secretary, Agriculture and Livestock Business Promotion Division, MOALD • Director General, Department of Agriculture, MOALD • Director General, Department of Food Technology and Quality Control, MOALD • Chief, Plant Quarantine and Pesticide Management Center, MOALD • Registrar, Department of Cooperatives • Secretaries of respective provincial agriculture ministries of Koshi, Bagmati, Gandaki, Karnali, and Sudurpashchim Provinces (who are Chair of provincial project steering committees)^a • Chief, Finance section, MOALD • Chief, Seed Quality Control Center (SQCC) • Representatives of partner financial institutions • Representative of Financial Comptroller General Office • Representatives of the Agriculture and Forestry University and the Institute of Agriculture and Animal Science of Tribhuvan University. Project Director, Chief of the NCFD, shall be the Member Secretary of the PSC. Member Secretary of the PSC will call for the PSC meeting. Independent professionals, representatives from academia, and the ADB/NRM representatives will be invited as observers as needed. The PSC will be responsible for the following: • Establish MOALD working group committee • Ensure collaboration among federal, provincial, and local levels for the effective implementation of the project and address any implementation issues • Ensure timely and effective implementation of project activities and achievement of project outcome, rectifying any problems that arise during implementation • Promote policy, administrative and legislative reforms to achieve project's goals • Review and endorse the annual project work program and budget, including conditional grants to the PIUs • Review quarterly financial management reports, and semi- annual environment and social safeguards monitoring reports • Review semiannual and annual project implementation progress reports • Review internal and external audit observations and recommendations and monitor seven IAs' implementation of these recommendations in a timely fashion • Monitor the use of credit guarantee fund and provide recommendations based on biannual review of the fund The PSC meeting will be convened biannually, but additional meetings will be convened as needed.

Project Implementation Organizations	Roles and Responsibilities
Provincial project steering committee (PPSC) in each of respective provincial agriculture ministries in Koshi, Bagmati, Gandaki, Karnali and Sudurpashchim	Chair: Secretary of the respective provincial agriculture ministry (see footnote a) Members: Representatives from • Provincial Office of the Chief Minister and Council of Ministers • Policy and Planning Commission • Ministry of Economic Affairs and Planning • Relevant ministry of Forest and Environment • Provincial Treasury Controller Officer • NARC Provincial Regional Directorate • Ministry of Physical Infrastructure Development • Food Security and Agribusiness Promotion Division, respective provincial agriculture ministry • Land Resources Mapping Division, respective provincial agriculture ministry • Chief, Planning Division of relevant agriculture ministry • Gender focal person, respective provincial agriculture ministry Provincial Project Manager (Chief of DOAD) shall be the Member Secretary of the PPSC. Member Secretary of the PPSC will call for the PPSC meeting. Representatives from academia and from farmer organizations and civil society organizations will be invited as observers.¹⁷ The PPSC will be responsible for the following: • Review and approve the annual provincial-level work program and budget, coordinating with existing or new provincial programs and activities to maximize development impact of the project • Ensure timely and effective implementation of project activities and achievement of project outcome, rectifying any problems that arise during implementation • Coordinate with respective provincial agriculture ministry and NCFD in relation to effective project implementation, budget provision, and dispute resolution • Coordinate among different participating local governments, AKCs and other relevant stakeholders to ensure effective project implementation • Review internal and external audit observations and recommendations and monitor IA's implementation of these recommendations in a timely fashion • Review quarterly progress report including financial management report and environment and social safeguards reports • Review annual project implementation progress reports • Discuss and select crop varieties for any of the project local level, if necessary, and select technically suitable ones among project-supported crops proposed with prior approval from CPMU The PPSC meeting will be convened biannually, but additional meetings will be convened as needed.
Executing agency: Ministry of Agriculture and Livestock Development (MOALD)	The EA shall be responsible for overall coordination, implementation, and monitoring of the project. A working committee of the MOALD shall be established to discuss project matters within the EA. More specifically, the EA will: • Provide overall strategic planning and make timely decisions on all matters related to effective project management • Ensure adequacy of overall project financing and secure annual budget allocations for implementation • Lead coordination among implementing agencies • Oversee overall financial management including undertaking financial audits and implement recommended actions • Ensure compliance of loan and grant covenants, and environmental and social safeguards, and facilitate corrective actions as required

Project Implementation Organizations	Roles and Responsibilities
	• Approve project-related operational guidelines and other relevant working procedures with prior concurrence from MOF • Be responsible for providing the status report to the PSC on the use of credit guarantee fund consolidating input from partner financial institutions (supported by a Credit Guarantee Fund Team, comprising 3 rural finance consultants and 5 province- based farm loan facilitators, in the CPMU) • Ensure that a Central Project Management Unit (CPMU) is fully staffed, operational and sufficiently funded • Support ADB project review missions • Ensure compliance with ADB Safeguard Policy Statement (SPS, 2009) and national requirements
Implementing agency 1: NCFD Supported by Central Project Management Unit (CPMU)	The IA-1 or NCFD will function as the secretariat to the MOALD/EA and as the overall project's focal point to ADB, supported by the CPMU. In addition, the IA-1 will lead project implementation at the central level. Chief, NCFD will head CPMU as Project Director and serve as the focal contact with ADB. Staffing details of the CPMU are provided in the PAM Attachment A. The IA-1, supported by the CPMU, will be responsible for the following: General Project Administration • Manage overall day-to-day project implementation • In coordination with PIUs (NARC and five DOADs), be responsible for (i) preparing annual contract awards and disbursement projections; (ii) requesting budgetary allocations for counterpart funds; (iii) collecting and retaining supporting documents; and (iv) preparing and sending withdrawal applications to ADB • Maintain separate advance accounts for each ADB financing source • Maintain separate book of accounts for the project, prepare consolidated project financial statements and cause them to be audited separately on an annual basis • submit the audited project financial statements (a consolidated one for the entire NAFHA project) to ADB within 9 months from the end of the fiscal year • Ensure implementation of the GESI/AP • Conduct and coordinate project review missions • Prepare quarterly progress reports for submission to ADB by consolidating implementation progress reports from the implementing agencies • Establish project performance monitoring system, including monitoring of the GESI/AP and a website for disclosure of project information • Ensure performance monitoring and supervision of consultants engaged • Monitor and ensure compliance with loan and grant covenants • Carry out baseline, midterm, and project completion surveys • Prepare project completion report at the end of the project and submit it to ADB Technical Oversight and Support • Prepare annual work plan and budget for the activities to be implemented by the IA-1 • Commission research on more adaptable and resilient varieties of fruits and nuts • Manage partial subsidies for farmers and cooperatives (payments greater than NRs 5 million) • Recruit and supervise contractors under output 1 and output 3 • Prepare nursery standards, regulation, and inspection system (implementation of output 1 activities) • Develop and roll out a pilot nursery certification scheme with participating private nurseries (implementation of output 1 activities)

Project Implementation Organizations	Roles and Responsibilities
	Safeguards Compliance • Take overall responsibility for environment and social safeguards by monitoring and ensuring compliance with ADB's SPS 2009, government requirements, and other related requirements in project documents particularly safeguards monitoring reports and tender documents • Address safeguards issues from affected people following the grievance redress mechanisms established in the project • Consolidate project's safeguard monitoring results updated by PIUs, and provide consolidated input to the project progress and safeguard monitoring reports • Submit semi-annual environmental and social monitoring reports to ADB.
Implementing agency 2: DOAD, Ministry of Industry, Agriculture and Cooperatives Koshi Implementing agency 3: DOAD, Ministry of Agriculture and Livestock Development, Bagmati Implementing agency 4: DOAD, Ministry of, Agriculture and Land Management, Gandaki Implementing agency 5: DOAD, Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives, Karnali Implementing agency 6: DOAD, Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives, Sudurpashchim	Led by Chief of DOAD of the respective provincial agriculture ministry (see footnote a), the IA 2-6 will be responsible for the following: • Ensure timely delivery of outputs • Ensure that PIUs are fully staffed, operational and sufficiently funded • Monitor and ensure compliance with loan and grant covenants, and environmental and social safeguards related to the work at the provincial and local levels, and facilitate the implementation of safeguard plans • Ensure implementation of the GESI/AP

Project Implementation Organizations	Roles and Responsibilities
Project Implementation Unit 1: DOAD, Koshi Project Implementation Unit 2: DOAD, Bagmati Project Implementation Unit 3: Gandaki Project Implementation Unit 4: DOAD, Karnali Project Implementation Unit 5: DOAD, Sudurpashchim	A Project Implementation Unit (PIU) at the provincial level will be established within DOAD of each province. A PIU will support each provincial IA (i.e. IA 2-6) for implementing provincial level activities. The PIU will be led by Chief of DOAD as Project Manager who will serve as the provincial-level focal. Staffing details are provided in Attachment A. General Project Administration • Advertise a call for expressions (EOI) of interest for partial subsidies for farmers and cooperatives for orchard, vegetable and other farming land development; • Manage overall day-to-day project implementation at the province level • Lead annual province level project planning and budgeting. • Maintain separate book of accounts for the project, maintain separate control registers in an agreed format and prepare project financial reports and statements as required • Support the project audit and address audit observations in a timely manner • Submit claims and supporting documentation or copies of such documentation to the CPMU, retain supporting documents, submit all reporting requirements, including financial statements • Manage project management support consultant deputed to the province
	• Coordinate project review missions and prepare progress reports with the CPMU • Support the CPMU to carry out baseline, midterm, and outcome surveys • Establish province-level project performance monitoring system, including monitoring of the GESI/AP and for disclosure Technical oversight and support • Support NCFD to supervise contractors that are implementing outputs 1, 2 and 3 at provincial level • Manage subsidy for orchard development (payments up to NRs5 million) • Implement nursery standards, regulations, and inspection system at provincial level • Support NCFD to roll out pilot nursery certification scheme with participating private nurseries • Manage cooperative development and capacity building (output-3) • Upgrade horticulture station/center facilities for germplasm maintenance, testing production technologies, sapling quality check, and transfer of genetic technologies to private nurseries Safeguards compliance • Monitor and ensure safeguards compliance with ADB's SPS 2009, government requirements, and other related requirements particularly safeguards monitoring reports and tender documents at provincial level • Address grievances related to the project following the grievance redress mechanisms established in the project and provide safeguards monitoring inputs to the CPMU • Facilitate public consultations with project beneficiaries and other stakeholders at the provincial level

Project Implementation Organizations	Roles and Responsibilities
Implementing agency 7: NARC Supported by Project Implementation Unit 6: NARC	Led by Executive Director, NARC, the IA 7 will be responsible for the following: • Prepare an annual work plan and budget of project-supported NARC stations • Monitor and ensure compliance with loan and grant covenants, and environmental and social safeguards, and facilitate the implementation of safeguard plans • Ensure that the project-supported NARC stations' compliance with ADB's procurement regulations and upgrade horticulture station facilities for testing and cleaning mother plants, and generation-1 germplasm maintenance, utilizing budget in a timely manner • Ensure implementation of the GESI/AP • Coordinate project review missions and prepare progress reports • Maintain separate book of accounts for the project, maintain separate control registers in an agreed format and prepare project financial reports and statements as required • Support the project audit and address audit observations in a timely manner • Submit claims and supporting documentation or copies of such documentation to the CPMU • Support the CPMU to carry out baseline, midterm, and outcome surveys • Contribute to the implementation of nursery standards, regulations, and inspection system • Address grievances related to the project following the grievance redress mechanisms established in the project and provide safeguards monitoring inputs to the CPMU The PIU-6 will be established under the NARC to coordinate the implementation of output 1 activities. PIU-6 will be headed by Project Manager, appointed by NARC as the focal to the project and staffed with NARC's accountant officer. CPMU-based consultants will also support NARC for project administration
Project implementation related committees	• MOALD working group committee to coordinate the EA's work (supported by CPMU) • Competitive Grants Management Committee (CGMC) to review and approve matching grant proposals (related to Schemes 3, 4, 5 and 6) on a competitive basis^a • Local Level Coordination Committees (LLCC) (related to Scheme 2) to (i) conduct preliminary screening of EOIs; (iii) make a selection recommendation to the PIU-led Subsidy Management Committee (SMC) or CPMU, depending on the size of orchard investment (investment beyond NRs. 5 million goes to the CPMU-led SMC) • Subsidy Management Committees (SMC) under PIU (related to Scheme 2) to review and approve orchard development applications after LLCC's recommendation. SMCs will be formed at both CPMU and PIU levels (investment beyond NRs. 5 million goes to the CPMU-led SMC). At the CPMU, CGMC will play the role of SMC so a separate SMC is not required. • Credit Guarantee Fund Management Committee (CGFMC) to review and approve time deposits to PFIs and to ensure the compliance of the credit guarantee fund related covenants (scheme 1). CGFMC will be supported by a Credit Guarantee Fund Team, comprising 3 rural finance consultants and 5 province-based farm loan facilitators, in the CPMU. This is to be confirmed by MOF through follow-up meetings after the inception mission that was held in December 2022.

Project Implementation Organizations	Roles and Responsibilities
PFI	• Conduct financial due diligence for loans proposed by project beneficiaries, supported by project-financed loan facilitators • Propose loans for guarantee issuance to MOALD through the CPMU credit guarantee fund team • Issue loans to eligible project beneficiaries according to government and ADB policies and requirements • Maintain separate ledger account and accounting records for the funds received under the project • Prepare a statement of utilization of funds annually and cause it to be audited by independent auditor • Submit the audited statement of utilization of funds and audited entity financial statements (AEFS) to MOALD working group committee through CPMU annually
ADB	• Review overall implementation of the project including compliance with loan and grant agreements and ADB guidelines • Conduct regular loan review missions • Review and issue no-objection to procurement and disbursement documents • Overall coordination and advisory support • Review and disclose safeguards screening and monitoring reports

17 Civil society organizations will be invited to apply for the position of project implementation service providers. To avoid conflicts of interest, the PPSC will invite them as observers, not as members.

ADB = Asian Development Bank; AKC = agriculture knowledge center; AP = action plan; DOAD = Directorate of Agriculture Development; DTCO= District Treasury Controller's Office; EA = executing agency; FCGO = Financial Comptroller General Office; GESI = gender and social inclusion; IA = implementing agency; LLCC = local-level coordination committee; MOALD = Ministry of Agriculture and Livestock Development; NARC = Nepal Agricultural Research Council; NCFD = National Center for Fruit Development; NRB = National Rastra Bank; PFIs = partner financial institutions; PPSC = provincial project steering committee; PSC = project steering committee; PTCO= Provincial Treasury Controller's Office; SMC = subsidy management committee; TSA = treasury single account.

a. Respective provincial agriculture ministries refers to the following: Ministry of Agriculture in Province 1, Ministry of Agriculture and Livestock Development in Bagmati, Ministry of Land Management, Agriculture, Cooperatives and Poverty Alleviation in Gadaki, Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives in Karnali, and Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives in Sudurpashchim.

b. There are six different financing schemes to be implemented under the project: (i) Scheme 1: credit guarantee fund;

(ii) Scheme 2: partial subsidies for farmers and cooperatives; (iii) Scheme 3: matching grants for cooperatives; (iv) Scheme 4: matching grants for agri-enterprises; (v) Scheme 5: matching grants for local-level infrastructure; and (vi) Scheme 6: matching grants for private nursery upgrading.

Source: ADB.

१.११ आयोजनाबाट प्रवाह हुने अनुदान सहयोग (स्कीमहरू)

यस आयोजनाबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन देहायका स्कीमहरू सञ्चालन हुनेछन्:

आयोजनाको स्कीम	लक्षित लाभग्राही	लक्षित गतिविधि	कैफियत
क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड-स्कीम १	वित्तीय संस्थाहरू	स्कीम २ का लाभग्राहीहरूको वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता	स्कीम सञ्चालनका लागि कार्यविधि तथा कार्यान्वयन मोडालिटीमा काम भइरहेको
कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई आंशिक अनुदान-स्कीम २	उद्यमी/कृषक समूह/सहकारी	फलफूल वगैँचा तथा तरकारी/अन्य बालीको फार्म विकास	प्रति अनुदानग्राही अधिकतम २५ हेक्टरमा ३ करोडसम्म अनुदान सहयोग, कृषक समूह र सहकारीको हकमा अनुदानयोग्य कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत र कृषि उद्यमीको हकमा अनुदानयोग्य कूल लागत रु. १ करोड २० लाखसम्म स्वीकृत भएमा अनुदानयोग्य कूल लागतको ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी भएमा अनुदानयोग्य कूल लागतको ४० प्रतिशत अनुदान।
सहकारीमा आधारित मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार स्कीम ३	सहकारीहरू	आयोजना लक्षित बालीहरूको मूल्य अभिवृद्धि गतिविधिहरू	५०% अनुदान सहायता, प्रति अनुदानग्राही अधिकतम १ करोड अनुदान सहयोग।
सार्वजनिक-निजी पूर्वाधार विकास स्कीम ४	कृषि उद्यमी तथा सेवा प्रदायकहरू	आयोजना लक्षित बालीहरूको मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि	४०% अनुदान सहयोग, प्रति अनुदानग्राही अधिकतम २ करोड अनुदान सहयोग।
स्थानीय पूर्वाधार विकास स्कीम ५	स्थानीय तह/प्रदेशहरू	आयोजना लक्षित बालीहरूको मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि	अधिकतम ५०% सहलगानी, प्रति अनुदानग्राही अधिकतम १ करोड ५० लाख अनुदान सहयोग।
निजी नर्सरी सुधार स्कीम ६	निजी नर्सरीहरू	बिरुवाको गुणस्तर तथा आपूर्ति प्रणाली सुधार	अधिकतम ५०% अनुदान, प्रति अनुदानग्राही ५ वटा नर्सरीहरूलाई अधिकतम १ करोड २५ लाख तथा ३५ वटा नर्सरीहरूलाई अधिकतम ६० लाख अनुदान सहयोग।

१.१२ जनशक्ति वितरण

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर

क्र.सं.	पद	दरबन्दी	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	प्रमुख (रा.प.प्र.)	१	१	०	
२	वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ	१	१	०	
३	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	१	१	०	
४	वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत	१	१	०	
५	योजना अधिकृत	१	१	०	
६	बागवानी विकास अधिकृत	१	१	०	
७	कृषि अधिकृत	१	१	०	
८	कृषि इन्जिनियर	१	१	०	करारमा
९	लेखा अधिकृत	१	१	०	
१०	नायव सुब्बा	१	१	०	
११	प्राविधिक सहायक	१	१	०	
१२	हलुका सवारी चालक (करार)	३	३	०	
१३	कार्यालय सहयोगी (करार)	२	२	०	
जम्मा		१६	१६	०	

१.१३ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं.	पद	नाम/थर	संकेत नम्बर	श्रेणी	समूह	सम्पर्क नं	कैफियत
१	आयोजना निर्देशक	महेश चन्द्र आचार्य	१७४९१९	रा.प.प्र.प्रा.	वाली संरक्षण	९८५१२३०२७१	
२	वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत	सूर्य प्रसाद बराल	१५८५७७	रा.प.द्वि.प्रा.	बागवानी	९८४१५४८२८४	
३	वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ	सन्तोष राज पौडेल	१९३०३५	रा.प.द्वि.प्रा.	एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ	९८५५०५३२१८	
४	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	सुरेन्द्र सुवेदी	२०७८४७	रा.प.द्वि.प्रा.	वाली संरक्षण	९८५११८७६६९	
५	योजना अधिकृत	कृष्ण प्रसाद उपाध्या	२१७०५२	रा.प.तृ.प्रा.	एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ	९८५१२४०२४३	
६	कृषि अधिकृत	गणेश कुमार के.सी.	२०३६९४	रा.प.तृ.प्रा.	बागवानी	९८५८०५२३६०	
७	लेखा अधिकृत	सीमा कुमारी झा	१९८२९३	रा.प.तृ.प्रा.	लेखा	९८४४०१५९०५	
८	बागवानी विकास अधिकृत	मधुसुदन घिमिरे	२१६९१९	रा.प.तृ.प्रा.	बागवानी	९८४१६५४५६८	
९	कृषि इन्जिनियर	विपिन पौडेल	-	रा.प.तृ.प्रा.	कृषि इन्जिनियरिङ	९८४५८९२२९७०	करार
१०	नायब सुब्बा	घनाकुमारी भुसाल	२१७७८६	रा.प.अनं.प्र.	सामान्य प्रशासन	९८४९४४३६७९	
११	प्राविधिक सहायक	दोलराज उपाध्याय	१९९५५३	रा.प.अनं.प्र.प्रा.	एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ	९८५११४१६९८	
१२	ह.स.चा.	विरचन घलान	-	श्रेणी विहीन	-	९८४९८३९४५८	करार
१३	ह.स.चा.	रामचन्द्र देवकोटा	-	श्रेणी विहीन	-	९८१३५१००५६	करार
१४	ह.स.चा.	हरि बहादुर श्रेष्ठ	-	श्रेणी विहीन	-	९८४१७०५६९१	करार
१५	का.स.	रविन्द्र रेग्मी	-	श्रेणी विहीन	-	९८४५३७१७९९	करार
१६	का.स.	श्रेया पौडेल	-	श्रेणी विहीन	-	९७४१७२०२८९	करार

१.१४ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन भएका प्रयासहरू

- सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था,
- कार्यक्रम, जिम्मेवारी बाँडफाँड र अधिकार प्रत्यायोजन,
- मातहतका निकायको नियमित सुपरीवेक्षण,
- सुझाव पेटिका, उजुरी पेटिकाको व्यवस्था,
- कार्यतालिका बनाई नियमित कार्यक्रम अनुगमन तथा पृष्ठपोषण,
- लग बुकको व्यवस्था,
- सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमका आवश्यक समितिहरूको गठन,
- गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत,
- कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत,
- निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत,
- फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ स्वीकृत,
- अगुवा कृषक परिचालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत।

१.१५ आयोजनाका हालसम्मका आयोजना निर्देशकहरूको विवरण

क्र.सं.	कार्यालय प्रमुखको नाम	पद	कार्यकाल	
			देखि	सम्म
१	श्री राजेन्द्र कोइराला	आयोजना निर्देशक	२०७९/०८/१५	२०८०/०५/२९
२	डा. शान्ता कार्की	आयोजना निर्देशक	२०८०/०६/२९	२०८१/०७/०४
३	श्री महेश चन्द्र आचार्य	आयोजना निर्देशक	२०८१/०७/०७	हालसम्म



खण्ड-ख

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति विवरण



२. आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र प्रगति विवरण

२.१ आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा स्रोतगत विनियोजन विवरण

आ.व. २०८१/८२ मा यस केन्द्रीय आयोगना व्यवस्थापन एकाइ र अन्तर्गतबाट व.उ.शी.नं. ३१२०१११३ अन्तर्गत पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। उक्त कार्यक्रम केन्द्रीय आयोगना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश र आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी जम्मा ७ वटा कार्यालयहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब ४४ करोड २२ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।

तालिका ४: आ.व. २०८१/८२ को कार्यगत बजेट विनियोजन

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)		
		वृत्त	चालु	पूँजीगत
१.	केन्द्रीय आयोगना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं (३१२०१३५०३)	५७३७९०	४७०६१५	१०३१७५
२.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (३१२०१३४१०)	७०४८२	१४९८२	५५५००
३.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ (७०१०११३०३)	१९३०७२	१८१७७२	११३००
४.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर (७०१०११३०३)	११२७७४	९७४७४	१५३००
५.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की (७०१०१३९०२)	२१७०४७	१८१२९७	३७५५०
६.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत (७०१०१६८०५)	१३३१४७	१३२८४७	३००
७.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी (७०१०१७१०३)	१४१९०७	१०८६०७	३३३००
जम्मा		१४४२२११	११८७५१४	२५४६२५

तालिका ५: स्रोतगत बजेट वाडफाँडको अवस्था

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालय	ए डि बि क्रण	ए डि बि अनुदान	जि ए एफ एस पि अनुदान	नेपाल सरकार	जम्मा	प्रदेश सरकार	कूल जम्मा
१	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर	३५८६००	४८३००	९५४००	७१४९०	५७३७९०		५७३७९०
२	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्	२८२००	१७१००	१०००	२४१८२	७०४८२		७०४८२
३	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश	१२४१००	३५९००	१८८००	१४२७२	१९३०७२	८०४०	२०१११२
४	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश	७१८००	१८५००	९७००	१२७७४	११२७७४	६६२२	११९३९६
५	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश	१४०२००	३५५००	१८४००	२२९४७	२१७०४७	९३२७	२२६३७४
६	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश	७४७००	३२१००	१५९००	१०४४७	१३३१४७	८००३	१४११५०
७	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश	८०१००	३१४००	१२५००	१७९०७	१४१९०७	९०९४	१५१००१
आयोजनाको जम्मा		८७७७००	२१८८००	१७१७००	१७४०११	१४४२२११	४१०८६	१४८३३०५

२.२ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

२.२.१ आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगतिको विश्लेषणात्मक समीक्षा

यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०८१/८२ मा केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर र ६ वटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरू (नार्क, कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश) गरी जम्मा ७ वटा कार्यालयमा वार्षिक रु. १ अर्ब ४४ करोड २२ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा संघ तर्फको रु. २९ करोड ८८ लाख ७५ हजार खर्च भई ४७.२८ प्रतिशत भारित तथा २०.२७ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। आयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन कै चरणमा रहनु तथा गुणस्तरीय विरुवाको उपलब्धता, कार्यविधि तयारी, दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुनु, कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता प्रारम्भिक कार्यहरूका कारण लक्ष्य बमोजिम प्रगति हासिल हुन सकेन।

२.२.२ आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण

२.२.२.१ आयोजनाको कार्यालयगत भारित प्रगतिको सारांश

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर र ६ वटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट आ.व. २०८१/८२ मा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। आयोजना व्यवस्थापन एकाइ तर्फको १०.०५ प्रतिशतसहित ७ वटा कार्यालयको एकमुष्ट भारित प्रगति ४७.२८ प्रतिशत रहेको थियो।

तालिका ६: आ.व. २०८१/८२ को कार्यालयगत वार्षिक भारत लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/कार्यालयको नाम	वार्षिक बजेट (रु. हजारमा)	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
१.	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	५७३७९०	३९.७९	१८.६६	४६.९१
२.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर	७०४८२	४.८९	२.३३	४७.५९
३.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	१९३०७२	१३.३९	४.३४	३२.४१
४.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	११२७७४	७.८२	६.२६	८०.०१
५.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	२१७०४७	१५.०५	९.३१	६१.८६
६.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत	१३३१४७	९.२३	२.३१	२५.००
७.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	१४१९०७	९.८४	४.०८	४१.४५

२.२.२.२ आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगतिको विस्तृत विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. लाखमा)			वार्षिक निकास/खर्च (रु. लाखमा)			विनियोजनको तुलनामा खर्चको %
		चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१.	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	४७०६१५	१०३१७५	५७३७९०	७३२४९	५५५५	७८८०४	१३.७३
२.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्	१४९८२	५५५००	७०४८२	१०५९७	२०२८९	३०८८६	४३.८२
३.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	१८१७७२	११३००	१९३०७२	३६४८३	१७८४	३८२६६	१९.८२
४.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	९७४७४	१५३००	११२७७४	१७५८५	५३९	१८१२३	१६.०७
५.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	१८१२९७	३५७५०	२१७०४७	५९२१३	५३१८	६४५३१	२९.७३
६.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत	१३२८४७	३००	१३३१४७	३२९८१	३००	३३२८१	२५.००
७.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	१०८६०७	३३३००	१४१९०७	२६४३४	८५५१	३४९८४	२४.६५
जम्मा		११८७५१४	२५४६२५	१४४२२१९	२५६५४१	४२३३४	२९८८७५	२०.७२

२.२.३ आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको विस्तृत विवरण

आ.व. २०८१/८२ मा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनामार्फत सञ्चालन भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरिएको छ।

फलफूल बालीहरूको बगैंचा स्थापना

यस आयोजनाको स्किम २ अन्तर्गत आयोजना अवधिभर ३० हजार घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १० हजार हेक्टरमा १० वटा आयोजना लक्षित फलफूलबालीहरू स्याउ, ओखर, पिकान, आल्मोण्ड, एभोकाडो, मेकाडेमिया नट, सुन्तला, कागती, जुनार र किवीको फलफूल बगैंचा विकास तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस स्किम "कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१" अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ। कार्यविधि बमोजिम छनौट भएका अनुदानग्राहीहरूलाई सम्झौता अनुरूपको कार्य सम्पन्न र सोको स्थलगत प्रमाणिकरणपश्चात् मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। कार्यविधि बमोजिम फलफूल बगैंचा विकास र विस्तारको लागि कृषक समूह र सहकारीको हकमा बगैंचा स्थापना तथा सिँचाइ व्यवस्थापनको लागि अनुदानयोग्य कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी कृषि उद्यमीको हकमा अनुदानयोग्य कूल लागत रु. १ करोड २० लाखसम्म स्वीकृत भएमा बगैंचा स्थापना तथा सिँचाइ व्यवस्थापनको लागि अनुदानयोग्य कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान तथा अनुदानयोग्य कूल लागत रु. १ करोड २० लाखभन्दा बढी भएमा अनुदानयोग्य कूल लागतको ४० प्रतिशत अनुदान तोकिए बमोजिमका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ तर यसरी प्रवाह हुने सबै अनुदानको अधिकतम सीमा प्रति अनुदानग्राही रु. ३ करोडभन्दा बढी नहुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको छ।

आ.व. २०८१/८२ को अवधिसम्म स्थलगत अनुगमनपश्चात् कूल १०६७.२५ हेक्टरका लागि आवेदनहरू छनौट तथा सम्झौता भई २५९.०५ हेक्टरमा फलफूल बगैंचा स्थापना भइसकेको छ भने बाँकी ८०८.२० हेक्टरका लागि बगैंचा स्थापना कार्य भइरहेको छ। यसैगरी हालसम्म १८.७६ हेक्टरका लागि अनुदानग्राहीहरूलाई कार्य सम्पन्नताको आधारमा रु. ३७६५८५६।०० अनुदान भुक्तानी समेत भइसकेको छ।

तालिका ७: आयोजनाको फलफूल बगैंचा विस्तार लक्ष्य तथा हालसम्मको प्रगति विवरण

बाली	लक्षित क्षेत्रफल (हे.)	सम्झौता गरिएको क्षेत्रफल (हे.)	बगैंचा स्थापना भएको क्षेत्रफल (हे.)	कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी भएको क्षेत्रफल
स्याउ (परम्परागत)	१४५०	१.००		
स्याउ (उच्च घनत्व)		३०.००	१.००	
आल्मोण्ड	१४०	२१.१०		
ओखर	१६५०	८३.९०	९.५०	
पिकान	१५०	३.००		
किवी	७८०	१२४.०५	१.००	
सुन्तला	२५५०	४५२.३०	१९७.०५	५.७५
जुनार				

बाली	लक्षित क्षेत्रफल (हे.)	सम्झौता गरिएको क्षेत्रफल (हे.)	बगैँचा स्थापना भएको क्षेत्रफल (हे.)	कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी भएको क्षेत्रफल
कागती	१९३०	२१६.७०	३६.००	१३.००
मेकाडेमिया	७५०	२८.४०	९.५०	
एभोकाडो	६००	१०६.८०	५.००	
जम्मा	१००००	१०६७.२५	२५१.०५	१८.७५

फलफूल बगैँचा स्थापनाका प्रक्रियामा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू

क. आवेदनका लागि सिमित समय

सम्भावित आवेदकहरूलाई निश्चित समयसीमा दिई आवेदन माग गरिने हुँदा सो तयार गरी पेश गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध नभएको।

ख. स्थानीय तहसँग कमजोर समन्वय तथा अभिमुखीकरण

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्थानीय तहबीच आवश्यक अर्थपूण समन्वयको कमी रहनुका साथै कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी लक्षित लाभग्राहीसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगनु।

ग. कमजोर सामाजिक परिचालन तथा जनचेतना

सम्भावित आवेदकहरूलाई आयोजनाका प्रावधान, योग्यता मापदण्ड तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे पर्याप्त अभिमुखीकरण गर्न नसक्नुका साथै आवेदनपूर्व आवश्यक परामर्श तथा सहजीकरणको अभाव।

घ. निर्देशिकाको अपर्याप्त अध्ययन तथा बुझाइ

आवेदकहरूले कार्यविधिका प्रावधानहरूको पर्याप्त अध्ययन नगरी आवेदन पेश गर्नु। यसैगरी कतिपय लाभग्राहीहरूले सम्झौता सम्पन्न भएपश्चात् समेत आयोजनाका शर्त तथा प्रावधानहरूको बारेमा बुझाई कमजोर हुँदा कार्यक्रमबाट बाहिरिने (Drop-out) अवस्था देखिएको।

ङ. न्यूनतम क्षेत्रफलको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण

प्रत्येक उप-आयोजनाका लागि न्यूनतम क्षेत्रफल १ हेक्टर (२० रोपनी) हुनुपर्ने व्यवस्था पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका साना तथा खण्डीकृत जग्गाधनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको हुँदा कल्टरिङ्गमा समस्या भई न्यूनतम मापदण्ड पुर्याउन कठिन भएको।

च. न्यूनतम क्षेत्रफल तथा योग्यता मापदण्ड पूरा नभएको

न्यूनतम क्षेत्रफल तथा अन्य आधारभूत योग्यताका मापदण्ड पूरा नगर्ने आवेदकहरूबाट समेत आवेदन प्राप्त हुने गरेको।

छ. गुणस्तरिय फलफूल बिरुवाको अभाव

पर्याप्त परिमाणमा लक्षित फलफूलका बिरुवाहरू उपलब्धता नहुनुका साथै हिउँदे फलफूल बालीहरू जस्तै: स्याउ (उच्च घनत्व), ओखर, पिकान, आल्मोण्ड, आदि बालीका बिरुवा अभावका कारण बगैँचा स्थापना लागि सम्झौता भए तापनि रोपणको कार्य हुन नसक्दा लक्ष्य प्राप्तमा कठिनाई भएको।

सुधारका लागि सुझावहरू

१. आवेदन पेश गर्ने समयावधि पर्याप्त राख्ने तथा समयमै सूचना प्रकाशन गर्ने।
२. आवेदन आह्वानअघि स्थानीय तह तथा लक्षित लाभग्राहीहरूलाई लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
३. सामाजिक परिचालन तथा जनचेतनामूलक गतिविधिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
४. कार्यविधिको सरल नेपाली सारांश तथा आवेदन तयारी मार्गदर्शन सामग्री तयार गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कृषक सहजकर्ता र सामाजिक परिचालकहरूलाई उपलब्ध गराउने।
५. आवेदन स्वीकृति पूर्व योग्यता परीक्षण (Pre-screening) व्यवस्था लागू गर्ने।
६. पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका लागि समूह/क्लष्टर आधारित वा लचिलो क्षेत्रफल मापदण्डको व्यवस्था गर्ने।
७. आवेदन तयारीका क्रममा समेत प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श उपलब्ध गराउने।
८. सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने।

फार्म पूर्वाधार विकास

आयोजनाको प्रतिफल १ अन्तर्गत राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र अन्तर्गतका ३ वटा फार्म, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतका ७ वटा अनुसन्धान केन्द्र र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका ६ वटा फार्म गरी तालिका ३ बमोजिमका जम्मा १६ वटा फार्म केन्द्रहरूको नर्सरी पूर्वाधार तथा क्षमता विकास तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस अवधिसम्म गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, तालिम तथा स्रोत केन्द्र, पोखरा, कास्की र बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उपोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, त्रिशुली, नुवाकोटको एक/एक वटा प्याकेजको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सकेको छ भने अन्य प्याकेजहरूको डिजाइन तथा लागत अनुमानको कार्य भइरहेको छ।

तालिका ८: लक्षित फलफूलबाली र फार्म केन्द्रको सम्बन्ध

बाली	नार्क अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र	बागवानी विकास केन्द्र
स्याउ (Apple)	बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, राजिकोट, जुम्ला, कर्णाली प्रदेश	समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, माफा, मुस्ताङ, गण्डकी प्रदेश (NCFD) बागवानी विकास केन्द्र, दार्जी (हुम्ला), कर्णाली प्रदेश (प्रदेश)
कगजी बदाम (Almond)	क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्ले, कास्की, गण्डकी प्रदेश	समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, माफा, मुस्ताङ, गण्डकी प्रदेश (NCFD) सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र, सतबाँझ, बैतडी, सुदूरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश)
एभोकाडो (Avocado)	कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीबास, धनकुटा, कोशी प्रदेश	बागवानी विकास केन्द्र, त्रिशुली, नुवाकोट, बागमती प्रदेश (प्रदेश) समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाडौं, बागमती प्रदेश (NCFD)
किवी (Kiwi)	राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुर, बागमती प्रदेश	बागवानी विकास केन्द्र, बाँच, दोलखा, बागमती प्रदेश (प्रदेश) बागवानी केन्द्र, फाग्लु, सोलुखुम्बु, कोशी प्रदेश (प्रदेश)

बाली	नार्क अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र	बागवानी विकास केन्द्र
सुन्तलाजात (Citrus- जुनार, कागती, सुन्तला)	राष्ट्रिय सुन्तलाजात फलफूल अनुसन्धान कार्यक्रम, परिपातले, धनकुटा, कोशी प्रदेश	सुन्तलाजात फलफूल विकास केन्द्र, तानसेन, पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश (NCFD) कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, तालिम तथा स्रोत केन्द्र, पोखरा, कास्की, गण्डकी प्रदेश (प्रदेश)
मेकाडेमिया (Macadamia)	बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, मालेपाटन, कास्की, गण्डकी प्रदेश	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, तालिम तथा स्रोत केन्द्र, पोखरा, कास्की, गण्डकी प्रदेश (प्रदेश) उपोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, त्रिशुली, नुवाकोट, बागमती प्रदेश (प्रदेश)
पिकान (Pecan)	राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, ललितपुर, बागमती प्रदेश	समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाडौं, बागमती प्रदेश (NCFD)
ओखर (Walnut)	बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, राजिकोट, जुम्ला, कर्णाली प्रदेश	सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र, सतबौझ, बैतडी, सुदूरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश) बागवानी विकास केन्द्र, दार्जी (हुम्ला), कर्णाली प्रदेश (प्रदेश) समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, माफा, मुस्ताङ, गण्डकी प्रदेश (NCFD)

कृषक पोषण पाठशाला

यस आयोजना अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Program) को प्राविधिक सहायतामार्फत आयोजना लागू भएका १०० स्थानीय तहहरूमा तरकारी तथा अन्य बालीहरूमा आधारित भई कृषक पोषण पाठशाला (पाठशाला) सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसरी सञ्चालन गरिने पाठशाला प्रति स्थानीय तहमा बढिमा १०० जना कृषकहरू समावेश हुने गरी ४ वटा सञ्चालन हुनेछन् भने प्रत्येक पाठशालामा २० देखि ३० जना कृषकहरू सहभागी हुनेछन्। पाठशालाका सहभागी कृषक छनौट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कम्तीमा ६० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्नेछ।

उपरोक्त व्यवस्था अनुसार हालसम्म Training to Facilitators (TOF) को पाठ्यक्रम कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट स्वीकृत भई कृषक पोषण पाठशाला सञ्चालनको लागि Training to Facilitators (TOF) ५ वटा तालिम सम्पन्न गरिएको छ। यसका साथै आयोजना अन्तर्गत कृषक पोषण पाठशालामा सहभागी हुने कृषकको छनौटका आधार तथा विधिसमेत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ भने कृषक पोषण पाठशाला सञ्चालनका लागि कृषक पोषण पाठशाला म्यानुअल (FNS Manual) को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ।

अगुवा कृषक परिचालन

यस आयोजनाले अगुवा किसान (Lead Farmers) को पहिचान, तालिम तथा क्षमता विकासमार्फत किसानदेखि किसानसम्म कृषि प्रसार सेवा (Farmer-to-Farmer Extension-F2FE) को अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अगुवा किसानहरूको पहिचान गर्न, उनीहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहहरूलाई संलग्न गराइएको छ। अगुवा कृषकहरूको पहिचान छनौट तथा परिचालनका लागि अगुवा कृषक परिचालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार आयोजना लागू भएका १०० स्थानीय तहहरूमा प्रति स्थानीय तह ५ जनाका दरले कूल ५०० अगुवा कृषकहरू परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। कूल

अगुवा किसानमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पिछडिएको समुदाय (Disadvantaged Groups) बाट रहने व्यवस्था गरिनेछ।

अगुवा किसानहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रसँग सान्दर्भिक सिफारिस गरिएका कृषि अभ्यासहरू (Package of Practices–POPs) को प्रयोग सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनुका साथै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइएको छ। अगुवा किसानहरूको तालिम परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यकालभर निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। अगुवा किसानहरूले समूहगत रूपमा स्थलगत तालिम सञ्चालन गर्ने, अनुगमन तथा फलोअप गर्ने, प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बैठकहरू आयोजना गर्ने तथा कृषकहरू जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरू र परियोजना प्रतिनिधिहरूबीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यहरू समावेश हुन सक्छन्। यसैगरी अगुवा कृषकहरूलाई तोकिएको कार्यहरू गर्नका लागि प्रोत्साहनबापत (यातायात तथा सञ्चार खर्च व्यवस्थापन गर्न) रु. पाँच हजार मासिक रूपमा भत्ता आयोजनाबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिसम्म तालिका ४ बमोजिम कूल २७४ जना अगुवा कृषकहरूको छनौट भई परिचालनसमेत गरी सकिएको छ भने बाँकी अगुवा कृषकहरू आगामी आ.व. २०८२/८३ मा छनौट गरी परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

तालिका ९: प्रदेशगत अगुवा कृषक परिचालनको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

क्र. सं.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ	स्थानीय तह सङ्ख्या	अगुवा कृषक परिचालनको लक्ष्य (सङ्ख्या)	हालसम्म परिचालित अगुवा कृषक सङ्ख्या
१	कोशी	२२	११०	६५
२	बागमती	८	४०	२८
३	गण्डकी	३४	१७०	५७
४	कर्णाली	२०	१००	४५
५	सुदूरपश्चिम	१६	८०	७९
	जम्मा	१००	५००	२७४

आ.व. २०८२/८३ वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको चालु आ.व. २०८१/८२ वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आगामी आ.व. २०८१/८२ का लागि Project Administration Manual (PAM) ले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको बारेमा छलफल गरी प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा ६ वटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको तथा कृषि विभाग एवम् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संलग्नतामा मिति २०८१/१२/०२ देखि ०३ सम्म दुई दिने गोष्ठी राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको सभाहल, कीर्तिपुरमा सम्पन्न गरिएको थियो। यस अवसरमा आ.व. २०८१/८२ वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारे अभिमुखीकरण गर्नुका साथै आ.व. २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो।

स्थानीय तहमा आयोजना अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न

चालु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप आयोजना कार्यान्वयन हुने ५ वटा प्रदेशहरू (कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश) का ब्याच ३ का स्थानीय तहहरूमा

आयोजना अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अनुरूप अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न गरी आयोजनाबारे जानकारी गराइएको थियो। सो क्रममा आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो।

परामर्श सेवा खरिद

यस अवधिमा आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवम् आयोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत खरिद योजना अनुसार देहायका परामर्श सेवा खरिदका कार्यहरू सम्पन्न गरिएको छ।

तालिका १०: आयोजनाको खरिद योजना अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा परामर्श सेवा खरिद विवरण

क्र. सं.	परामर्श सेवाको विवरण	खरिद योजना अनुसारको प्याकेज	सेवा खरिद सम्झौता मिति	सम्झौता रकम रु. (भ्याटसहित)	परामर्शदाताको विवरण	परामर्श सेवा अवधि
१	Project Implementation Support Consultant (PISC) (CPMU procurement)	NAFHA/ CPMU/ Consulting/ PISC/CS-06	२०८१ फागुन १ (3 Feb 2025)	२५७२००३१७	Center for Research and Development and Total Management Service JV in association with Nepal Farmers' Advisory Council (CRDN-TMS JV in association with NFAC)	13 Feb 2025 to 31 Aug 2029
२	Farmers Group and Cooperative Facilitation (FGCF) Consultant (PIU-Koshi procurement)	NAFHA/ PIU-Koshi/ Consulting/ FGCF/CS-05A	15 September 2024	१४९६६४४३२	CMS-ERMC-RIMC JV, Kathmandu	30 June 2029
३	Farmers Group and Cooperative Facilitation (FGCF) Consultant (PIU-Bagmati procurement)	NAFHA/ PIU-Koshi/ Consulting/ FGCF/CS-05B	13 December 2024	६१०६७४००	ERMC-CMS JV, Kathmandu	June 30, 2029
४	Farmers Group and Cooperative Facilitation (FGCF) Consultant (PIU-Gandaki procurement)	NAFHA/ PIU-Koshi/ Consulting/ FGCF/CS-05C	July 22, 2024	२२६३१००७२	CMS-ERMC JV, Kathmandu	June 30, 2029
५	Farmers Group and Cooperative Facilitation (FGCF) Consultant (PIU-Karnali procurement)	NAFHA/ PIU-Koshi/ Consulting/ FGCF/CS-05D	September 3, 2024	१३५१५५६८४	ERMC-CMS JV, Kathmandu	June 30, 2029
६	Farmers Group and Cooperative Facilitation (FGCF) Consultant (PIU-Sudurpaschim procurement)	NAFHA/ PIU-Koshi/ Consulting/ FGCF/CS-05E	December 27, 2024	१०००१५३९६	CRD Nepal-TMS-MPDS JV in association with NFAC	June 30, 2029

क्र. सं.	परामर्श सेवाको विवरण	खरिद योजना अनुसारको प्याकेज	सेवा खरिद सम्झौता मिति	सम्झौता रकम रु. (भ्याटसहित)	परामर्शदाताको विवरण	परामर्श सेवा अवधि
७	Preparation of Packages of Practice (POPs) for Fruit Crops (CPMU procurement) Individual Consultants	NAFHA/ CPMU/ Consulting/ PoP/CS02 AA/TL/PHE/ NME/EN/PP/ AE/SS (7 Individuals)	October 24, 2024	४९,८६३०६	Team Leader: Dr. Giri Dhari Subedi, Post Harvest Expert: Dr. Durga Mani Gautam, Nursery Management Expert: Yubraj Pandey, Entomologist: Dinesh Babu Tiwari, Pathologist: Dr. Hira Kaji Manandhar, Agri-Economist: Laxman Prasad Poudel & Soil Scientist: Tanka Bahadur Karki	April 23, 2025
८	Pest Risk Analysis (PRA) Individual Consultants	NAFHA/ CPMU/ Consulting/ PRA/CS08	April 18, 2025	३२९३५५०	Team leader/Plant Pathologist: Dr. Hira Kaji Manandhar Entomologist: Resham Bahadur Thapa	June 12, 2026
९	Project Website and MIS	NAFHA/ CPMU/Non-Consulting/ NCS-01/PMIS	27 May 2025	१५९२१७०	Improvement Company Nepal, Pvt. Ltd, Kathmandu-13	January 13, 2026

आयोजना लक्षित फलफूलबालीहरूको खेती प्रविधि (Package of Practices-POPs) सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशन र क्षमता विकास तालिम सञ्चालन

आयोजना लक्षित फलफूलबालीहरूको खेती प्रविधि (Package of Practices-POPs) सम्बन्धी ५ वटा बाली (सुन्तला, कागती, जुनार, मेकाडेमिया नट र एभोकाडो) को पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ। यसका साथै खेती प्रविधि (Package of Practices-POPs) सम्बन्धी कृषकस्तरमा क्षमता विकासका विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिएको थियो।

फलफूल बिरुवा गुणस्तर परीक्षण तथा नर्सरी नियमन सम्बन्धी कार्य

फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ अनुसार आयोजना लक्षित फलफूल बिरुवा आपूर्ति गर्न सूचीकृत हुने नर्सरीहरूको निरीक्षण गर्न ४८ जना कृषि प्राविधिकहरूको ६ दिने नर्सरी निरीक्षण (Technical Audit) तालिममार्फत क्षमता विकास गरिएको जसबाट गुणस्तरीय बिरुवा आपूर्ति सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Training on Procurement and Financial Management

आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूमा आयोजनाको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा लेखा सम्बद्ध कर्मचारीहरूको खरिद तथा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले मिति २०८२ वैशाख १२ देखि १३ गतेसम्म २ दिने तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त तालिममा ADB Procurement Guidelines तथा Financial Management सम्बन्धी विषयमा क्षमता विकास गरिएको थियो। उक्त तालिममा एसियाली विकास बैंक तथा केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइका विज्ञहरूबाट सम्बन्धित विषयहरूमा सहजीकरण गरिएको थियो।

आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कर्मचारीहरूलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी तालिम

आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूमा कार्यरत अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा परामर्शदाताहरूलाई आयोजनाको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकलाई पेश गर्नुपर्ने Quarterly Progress report (QPR), Consolidated Annual Progress Report, Social Safeguard Monitoring Report-SMR (Biannually), Environmental Monitoring Report-EMR (Biannually), Audited Project Financial Statements, GAFSP Progress Report (Biannually), Due diligence Report तयार गर्ने विषयमा क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले मिति २०८१ माघ ४ देखि ६ गतेसम्म ३ दिने आवासीय तालिम पोखरामा सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त तालिम कार्यक्रममा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूमा कार्यरत सम्बन्धित कर्मचारी तथा परामर्शदाताहरूसमेत गरी २२ जना कर्मचारीहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गरिएको थियो भने केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइका विज्ञहरूबाट सम्बन्धित विषयहरूमा सहजीकरण गरिएको थियो।

कार्यविधि स्वीकृति

आयोजना लागू भएका स्थानीय तहका कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूलाई लक्षित फलफूल बालीहरूको बगैँचा स्थापना एवम् कृषक समूहहरूलाई तरकारी तथा अन्य बालीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सृजना तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न तथा स्किम २ लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ र आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने गुनासोहरूको सम्बोधन तथा समाधानको लागि गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको। यस्तै अगुवा कृषक परिचालन कार्यविधि, २०८१, निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ र फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको।

MoALD Working Group Committee Meeting

MoALD Working Group Committee को बैठक आयोजना कार्यान्वयनका लागि कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, अगुवा कृषक परिचालन कार्यविधि, निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदामा रहेका प्राविधिक विषयहरूमा छलफल गरी कार्यविधि अनुरूप प्रवाह हुने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा अनुदानका विभिन्न मोडालिटीहरूका छलफल गरी सुझाव प्राप्त गरिएको थियो।

२.३ विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण

२.३.१ कच्चेबारी प्रगति विवरण

२.३.१.१ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): ५२३७.४५

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					९७४.७५			
११.६.२.२५९	फलफूल आनुवांशिक स्रोत सामग्रीहरू खरिद तथा आयात (G05 A) (गत आ.ब. को निरन्तरता)	३११३१	पटक	१	१.१३	६५	१	०.००	
११.६.२.२६०	फलफूल आनुवांशिक स्रोत सामग्रीहरू खरिद तथा आयात (G05 B)	३११३१	पटक	१	१.७४	१००	१	०.००	
११.६.१५.४४	आयोजनाको वेबसाइट तथा MIS प्रणाली विकास (Sapling tracking system समेत) (गत आ.ब. को निरन्तरता)	३११३४	पटक	१	०.३५	२०	१	०.३५	
११.४.२.१०४९	शीतोष्ण वागवानी विकास केन्द्र, माफामा पूर्वाधार विकास (गत आ.ब. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१	२.६१	१४९.७५	१	२.६१	
११.४.२.१०५०	राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र अन्तर्गतका फार्म केन्द्रहरू (पाल्पा, कीर्तिपुर र माफा) मा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माण (गत आ.ब. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१	११.१५	६४०	०	०.००	
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					५७	०	०.००	
११.३.१.१३	मोटरसाइकल खरिद	३११२१	सङ्ख्या	४	०.२३	१३	४	०.२३	
११.३.७.१४८८	कार्यालय प्रयोजनको लागि Electronics उपकरणहरू (Laptop-10, Monitor-5, Desktop-5, Photocopy Machine-1, Multifunction Printers-5, Multimedia Projector-1, Smart TV-1, Smartphones-3, Tablets-10, आदि) खरिद (G 01 AA)	३११२२	पटक	१	०.७७	४४	१	०.७७	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा									
				१०	१७.९८	१०३१.७५	१०.००	३.९६	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					१५०९.४			
१.२.४.५४६	Competitive Grant Management Committee को बैठक	२११३४	सङ्ख्या	३	०.०९	५.४	३	०.०९	
१.२.४.५४९	अनुसन्धान प्रयोजनलाई जर्मप्लाज्म आयातको लागि Germplasm Exchange Authority Committee को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	८	०.०३	२	२	०.०१	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वार्थ शीर्षक	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.५.२.६७०	Pest Risk Analysis of Project Targeted Crops	२२४११	पटक	१	०.३५	२०	१	०.३५	
२.५.२.६७२	Suitability Study for Varieties of Project Targeted Crops	२२४११	पटक	१	०.३१	१८	०	०.००	
२.५.२.६७३	Individual Consultant Hiring for Training on Specialized Techniques (CS 01)	२२४११	पटक	२	१.५७	९०	०	०.००	
२.५.२.६७५	Crop and Land Database management Consulting Service (CS03)	२२४११	पटक	१	१.७४	१००	०	०.००	
२.६.१.५८४	नर्सरी निरीक्षण सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय तालिम	२२५११	सङ्ख्या	२	०.३५	२०	२	०.३५	
२.६.१.५८५	Training on Specialized Techniques	२२५११	सङ्ख्या	२	०.२८	१६	०	०.००	
२.६.१.५८६	आयोजनाका कार्यन्वयन क्षमता अभिवृद्धिको लागि वैदेशिक तालिम तथा भ्रमण	२२५११	पटक	२	३.४९	२००	१	१.७५	
२.६.४.१४३१	scheme 6 का लाभग्राहीहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन तालिम	२२५१२	पटक	१	०.०७	४	०	०.००	
२.७.६.४५८	लक्षित फलफूल वालीका विरुवाहरूको रोगकीरा परीक्षण	२२५२२	पटक	४	०.१७	१०	४	०.१७	
२.७.१५.२.६७६	Clean Plant Center को कार्यन्वयनको खाका तयारी सम्बन्धी बैठक तथा अन्तर्क्रिया	२२५२२	पटक	१	०.१	६	१	०.१०	
२.७.१५.२.६७४	स्किम ६ को व्यावसायिक योजना Reviewer को पारिश्रमिक	२२५२२	सङ्ख्या	४०	०.०३	२	४०	०.०३	
२.७.१५.२.६७२	नर्सरी मापदण्ड सम्बन्धी दस्तावेज तयारी	२२५२२	पटक	१	०.०५	३	१	०.०५	
२.८.१.१०३२	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यन्वयन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	१८	०.२३	१३	१८	०.२३	
२.७.१५.२.७३२	निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरणका लागि पुरक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 6) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३	पटक	२	१७.४३	१०००	२	१७.४३	
२	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल वालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)					१९२०.४	०	०.००	
१.२.४.४८२	Subsidy Management Committee को बैठक	२११३४	पटक	२	०.०४	२.५	२	०.०४	
२.५.२.६७६	आयोजना लक्षित फलफूल वालीहरूको Package of Practice (PoP) तयारी-व्यक्ति करार (गत आ.व. को निरन्तरता) (CS 02 AA)	२२४११	पटक	१	०.८७	५०	१	०.८७	
२.५.२.६८०	आयोजना लक्षित फलफूल वालीहरूको Package of Practice (PoP) अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरूमार्फत् Review गराउने-व्यक्ति करार (CS 02AB)	२२४११	पटक	१	१.५७	९०	०	०.००	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.५.२.६८१	आयोजना लक्षित बालीहरूका PoP हरूको प्रचारप्रसारको लागि मल्टिमिडिया सामग्रीहरू तयारी (गत आ.व. को निरन्तरता) (CS 02B)	२२४११	पटक	१	०.८७	५०	०	०.००	
२.६.१.५३१	विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको Package of Practices सम्बन्धी MTOT सञ्चालन	२२५११	सङ्ख्या	३	०.७३	४२	०	०.००	
२.६.६.१२३०	आयोजनाका कार्याविधिहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.१२	७	१	०.१२	
२.७.१५.२६७९	आयोजनाको Scheme 1 (CGF) कार्यान्वयन तयारी	२२५२२	पटक	१	०.०९	५	०	०.००	
२.७.१५.२६७८	आयोजनाको प्रचारप्रसार तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०७	४	१	०.०७	
२.७.१५.२६७७	आयोजना लक्षित बालीहरूको आवश्यकता अनुसार Package of Practices (POP) सम्बन्धी लिफलेट बुकलेट तथा ब्रोसर प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१७	१०	१	०.१७	
२.७.१५.२६८१	फिल्ड डायरी र नर्सरी रेकर्ड डायरी प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१	६	१	०.१०	
२.७.१५.२६८०	स्क्रिमहरू कार्यान्वयनका लागि कार्याविधि, फारम लगायतका आवश्यक कागजात छपाई	२२५२२	पटक	२	०.१७	१०	२	०.१७	
२.७.२५.१६८८	आयोजना लक्षित बालीहरूको Package of Practices (POP) सम्बन्धी प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.३१	१८	१	०.३१	
२.७.२५.१६८२	Cr Credit Guarantee Fund Management Committee को बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	१०	०.०७	४	०	०.००	
२.७.२५.७६०	Travelling Seminar	२२५२२	पटक	१	०.१२	७	०	०.००	
२.८.१.१०३३	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापनका लागि भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	३०	०.२६	१४.९	३०	०.२६	
२.३.१८.७३	Credit Guarantee Fund सञ्चालन (Scheme 1)	२६४१३	पटक	१	१७.४३	१०००	०	०.००	
२.७.१५.२७३०	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३	पटक	२	१०.४६	६००	०	०.००	
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					१२७६.३५	०	०.००	
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	०	०.४६	२६.३१	०	०.४६	
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	०	०.३४	१९.७४	०	०.३४	
१.१.१.२४२	रा.प. तृतीय	२११११	जना	०	०.४१	२३.५८	०	०.४१	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	९	०.०२	०.९	९	०.०२	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
१.२.२.२.८	कर्मचारीको महँगी भत्ता	२११३२	महिना	९	०.०४	२.१६	९	०.०४	
१.२.४.६६	दरबन्दी स्वीकृत तथा अन्य	२११३४	पटक	२	०.०३	२	२	०.०३	
१.२.४.४८५	आयोजना सहायता तथा अन्य परामर्शदाता खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१०	०.०७	४	१०	०.०७	
१.२.४.४८६	मालसामान तथा अन्य खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	६	०.०४	२.४	६	०.०४	
१.२.४.४८७	गुनासो सुनुवाई समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	४	०.०२	१	१	०.०२	
१.२.८.२२	शिपु स्याहार भत्ता	२११३९	सङ्ख्या	२	०.०२	१	१	०.०२	
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	९	०.०१	०.७६	९	०.०१	
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११	पटक	१	०.०५	३	१	०.०५	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	१५०	०.०३	२	१५०	०.०३	
२.१.३.२	ट्याङ्करको पानी	२२१११	सङ्ख्या	२	०.०१	०.३	२	०.०१	
२.१.६.८	इन्टरनेट महसुल	२२११२	महिना	१	०.०२	०.९६	१	०.०२	
२.१.६.५१	सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी तथा सम्बन्धका लागि सञ्चार खर्च	२२११२	सङ्ख्या	१०	०.०२	१.२	१०	०.०२	
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	पटक	१	०.०२	०.९६	१	०.०२	
२.२.२.९	चार पाइये सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	लिटर	३३६०	०.११	६.०५	३३६०	०.११	
२.२.२.११	मोटरसाइकलको लागि पेट्रोल	२२२१२	लिटर	३६००	०.१२	६.८४	३६००	०.१२	
२.२.२.३३	गाडी, मोटरसाइकलका लागि मोबिल, गियर आयल, ब्रेक आयल, आदि	२२२१२	लिटर	२१६०	०.०४	२.१६	२१६०	०.०४	
२.२.२.३९७	कार्यालयहरूबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षणको लागि इन्धन (आयोजना निर्देशकलाई समेत)	२२२१२	लिटर	५२८०	०.१७	९.५१	५२८०	०.१७	
२.३.१.३	दुई पाइये सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	१५	०.०५	३	१५	०.०५	
२.३.१.११	चार पाइये सवारी साधन मर्मत	२२२१३	वटा	४	०.१४	८	४	०.१४	
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	सङ्ख्या	१५	०.०५	३	१५	०.०५	
२.९.४.४	सवारी साधन नवीकरण शुल्क	२२२१४	सङ्ख्या	१५	०.०३	१.५	१५	०.०३	
२.३.२.३१६	कार्यालयका electronic सामग्री मर्मत खर्च	२२२२१	महिना	१२	०.०३	१.५	१२	०.०३	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.३.९.३८९	आयोजनाका कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता मर्मत सुधार	२२२३१	पटक	१	०.१७	१०	१	०.१७	
२.४.१.१	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलान्द खरिद	२२३११	पटक	१२	०.३१	१८	१२	०.३१	
२.४.१.५	कार्यालय सम्बन्धी छपाई	२२३११	पटक/सङ्ख्या	४	०.०२	१	४	०.०२	
२.४.४.११	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३११	पटक	४	०.०२	१	४	०.०२	
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागि इन्धन	२२३१४	पटक/सङ्ख्या	१२	०.०२	१.२	१२	०.०२	
२.४.१४.७८	विभिन्न खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	७	०.१	५.६	७	०.१०	
२.४.१४.७९	आयोजनाका गतिविधिहरूको प्रचारप्रसार कार्यक्रम	२२३१५	पटक	२०	०.१	६	२०	०.१०	
२.५.२.५९५	परियोजना कार्यन्वयन सहयोग परामर्शदाता (Project Implementation Support Consultant) सेवा करार	२२४११	महिना	१	१४.८१	८५०	१	१४.८१	
२.५.२.६६९	आयोजनाको Baseline survey गरी प्रतिवेदन तयार (गत आ.व. को निरन्तरता) (CS 04 A)	२२४११	पटक	१	१.६६	९५.३३	०	०.००	
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.१	५.९३	२	०.१०	
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	६	०.०३	१.८	६	०.०३	
२.५.७.१२४	सवारी चालक करार (हलुका सवारी)	२२४१३	जना	३	०.१७	९.६२	३	०.१७	
२.५.७.३६१	कृषि इन्जिनियर करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	१	०.०९	५.२५	१	०.०९	
२.५.८.४	सरसफाई सेवा करार	२२४१३	पटक	१	०.०२	१.२	१	०.०२	
२.५.८.१९३	कार्यालयका electronic सामग्री मर्मत सेवा करार	२२४१३	महिना	१	०.०३	१.४४	१	०.०३	
२.५.८.१९४	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	जना	६	०.०१	०.६	६	०.०१	
२.६.१.५८७	Training on Procurement and Financial Management	२२५११	सङ्ख्या	१	०.१	६	१	०.१०	
२.६.२.१४९	कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम	२२५११	जना	१०	०.१	६	१०	०.१०	
२.६.३.६५	PIU का कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन, सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५११	सङ्ख्या	१	०.१	६	१	०.१०	
२.६.४.१३९४	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२	पटक	१	०.१२	७	०	०.००	
२.६.६.७९	चौमासिक/वार्षिक समीक्षा गोष्ठी	२२५१२	पटक	४	०.२१	१२	४	०.२१	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.६.६.१२३१	सरोकारवालाहरूसँग आयोजना कार्यन्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	सङ्ख्या	३	०.१६	९	१	०.१६	
२.६.६.२७१	योजना तर्जुमा गोष्ठी	२२५१२	प्र.श.	१	०.०५	३	१	०.०५	
२.७.२५.१२४०	आयोजना सञ्चालन मिसन व्यवस्थापन	२२५२२	पटक	२	०.२१	१२	१	०.२१	
२.७.२५.१५६०	आयोजना निर्देशक समितिको बैठक	२२५२२	पटक	३	०.०६	३.६	०	०.००	
२.७.२५.१६८१	MoALD Working Group Committee को बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	८	०.०६	३.२	४	०.०६	
२.७.२५.१६८३	विभिन्न तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृति	२२५२२	पटक	३	०.०५	३	३	०.०५	
२.७.२५.१६९१	विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका विविध आयाम सम्बन्धी अन्तरक्रिया	२२५२२	सङ्ख्या	३०	०.०८	४.५	३०	०.०८	
२.७.२५.१६९३	आयोजना सम्बन्धी कार्यविधिहरू तयारी/परिमार्जन तथा अन्य बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	२	०.०८	४.५	२	०.०८	
२.७.२५.१६९४	आयोजना वार्षिक प्रगति पुस्तक प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०७	४	१	०.०७	
२.७.२५.१६९६	आयोजनाका अधिकारीका दस्तावेज अनुवाद	२२५२२	पटक	१	०.०७	४	०	०.००	
२.८.१.१०३४	आयोजना कार्यन्वयन एकाइहरूको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुगमन	२२६११	पटक	१२	०.१२	७	१२	०.१२	
२.८.१.८९४	संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट (नार्कसेमेत) सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रम	२२६११	पटक	१८	०.२१	१२	१८	०.२१	
२.८.२.३	सरुवा भ्रमण	२२६१२	सङ्ख्या	४	०.०४	२.५	४	०.०४	
२.९.६.१	कार्यालयमा दैनिक विद्यापान खर्च	२२७११	पटक	१२	०.०६	३.६	१२	०.०६	
२.९.८.६	कार्यालयमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	१२	०.०४	२.४	१२	०.०४	
२.९.९.१	मासिक मिडिडमा खाजा खर्च	२२७११	सङ्ख्या	१२	०.०४	२.४	१२	०.०४	
२.९.९.१४६	विश्वकर्मा पूजा खर्च	२२७११	पटक	१	०	०.२५	१	०.००	
२.९.९.२०३	आयोजनाका विभिन्न समिति लगायत अन्य बैठकहरूको खाजा	२२७११	पटक	८	०.१	५.६	८	०.१०	
८.१.६.२८	भौगोलिक विकट क्षेत्रहरूमा अनुगमन निरीक्षणका लागि सवारी साधन भाडामा लिने	२८१४३	पटक	४	०.०९	५	१	०.०३	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				१५०६२	८१.१७	४७०६.१५	१५००८	४३	
कुल जम्मा खर्च				१५०७२	९९.९५	५७३७.९	१५०१७.	४६.९	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित प्रतिशत	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	बागवानी फार्म फान्जुलाई आवश्यक विभिन्न मेसिनरी औजार खरिद	३११२२	पटक	१	०.६७	१३	१	०.६७	१००	
२	फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (उच्च प्रविधिक नर्सरी र स्किन हाउस निर्माण, सिँचाई पूर्वाधार, किची बेचा सुदृढीकरण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता	३१५५९	पटक	१	४.९२	९५	०	०.००	०	
३	कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्स्चर	३११२३	पटक	१	०.२६	५	१	०.२६	१००	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा										
				३	५.८५	११३	२	०.९३	१५.१०	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
४	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLCC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	१३	०.५४	१०.४	१३	०.५४	१००	
५	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	१३	०.६७	१३	०	०.००	०	
६	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	१३	०.५४	१०.४	०	०.००	०	
७	Lead farmers मार्फत थोपा सिँचाई प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.१	२	०	०.००	०	
८	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५१२	पटक	२	०.३१	६	२	०.३१	१००	
९	चार पाइप्रे स्वारी साधनमा AC जडान (बागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२२२१३	पटक	१	०.१६	३	१	०.१६	१००	
१०	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१२	०.०५	१	१२	०.०५	१००	
११	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१००	०.५२	१०	२०	०.१०	२०	
१२	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१२	०.२६	५	१२	०.२६	१००	
१३	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	३	०.१६	३	३	०.१६	१००	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक वक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित प्रतिशत	
१४	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	३	०.०५	१	०	०.००	०	
१५	बागवानी विकास स्रोत केन्द्रमा किची फलफूल ब्यक्तमा प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.२६	५	१	०.२६	१००	
१६	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५११	पटक	३	१.०९	२१	०	०.००	०	
१७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११	पटक	१	२०.७२	४००	१	२०.७२	१००	
१८	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	१	०.८४	१६.२५	१	०.८४	१००	
१९	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	१२	०.१२	२.४	६	०.०६	५०	
२०	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१२	०.८३	१६	१२	०.८३	१००	
२१	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	१	०.१	२	०	०.००	०	
२२	सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.१	२	०	०.००	०	
२३	LLCC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	७८	०.६१	११.७	५२	०.४१	६७	
२४	आयोजना लागू हुने Batch ३ का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	९	०.३७	७.२	९	०.३७	१००	
२५	चार पाइग्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१२	०.३२	६.१२	१२	०.३२	१००	
२६	अन्य इन्धन (गर्गसहित) कार्यालय प्रयोजन	२२२१४	पटक	१२	०.०५	१	३	०.०१	२५	
२७	चार पाइग्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	४	०.१६	३	४	०.१६	१००	
२८	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक पुष्टपेपणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	१२	०.१६	३	४	०.०५	३३	
२९	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	४	०.१	२	४	०.१०	१००	
३०	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	२०	०.१६	३	१०	०.०८	५०	
३१	चार पाइग्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१२	०.०५	१	१०	०.०४	८३	
३२	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	१२	०.३१	६	५	०.१३	४२	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	एकड़	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित प्रतिशत	
३३	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	पटक	१२	०.११	२.१५	१	०.०१	८	
३४	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	पटक	२	५९.५६	११५०	०	०.००	०	
३५	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको बौचा व्यवस्थापन, काटछीट सम्बन्धी तालिम	पटक	१	०.१६	३	०	०.००	०	
३६	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	पटक	१३	०.६७	१३	०	०.००	०	
३७	Training on Safeguard Compliance and Reporting	पटक	१	०.३१	६	०	०.००	०	
३८	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	पटक	१४	०.२३	४.३५	९	०.१५	६४	
३९	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	पटक	४	०.०५	१	२	०.०३	५०	
४०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	पटक	४	०.३१	६	४	०.३१	१००	
४१	उच्चस्तरीय joint monitoring	पटक	१	०.२६	५	०	०.००	०	
४२	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	पटक	१२	२.०२	३९	०	०.००	०	
४३	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POB सम्बन्धी तालिम	पटक	३	०.४७	९	०	०.००	०	
४४	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	पटक	२५	०.१९	३.७५	८	०.०६	३२	
४५	PIU का कार्यक्रम सुधार	पटक	१	०.१	२	१	०.१०	१००	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				१४.१५	१८१०.७२		२६.६२	३४.६८	
कुल जम्मा खर्च				१००.००	१९३०.७२		२७.५६०२	३२.४१	

२.३.१.३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर

क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
				प्रारम्भिक	मध्य	वर्तमान	प्रारम्भिक	मध्य	वर्तमान	प्रारम्भिक	मध्य
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू											
१	कार्यालयको कार्यक्षेत्रको लागि AC खरिद तथा जडान	३११२२	पटक	१	०.२७	३	१	०.२७	१००.००	२.९२	९७.१८
२	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (पर्खाल तथा बारबन्देज) गत आर्थिक वर्षको निरन्तरता	३११५९	पटक	१	४.४३	५०	०.२	०.८८६	२०.००	२.४७	४.९४
३	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (स्क्रीन हाउस, hi tech प्रिन्ट हाउस निर्माण)	३११५९	पटक	१	८.८७	१००	०	०	०.००	०.००	०.००
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा											
३				३	१३.५७	१५३	१.२	१.१६६	८.५२	५.३९	३.५२
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू											
१	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिन्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१	०.३६	४.०९	१	०.३६	१००.००	०.३६	८.८९
२	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	१	०.१९	२.१५	१	०.१९	१००.००	०.३४	१५.७२
३	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१	०.०९	१	१	०.०९	१००.००	०.२७	२६.८७
४	अन्य इन्धन (रग्योसहित) कार्यालय प्रयोजन	२२२१४	पटक	१	०.०९	१	१	०.०९	१००.००	०.७७	७७.०८
५	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	१	०.३३	३.७५	१	०.३३	१००.००	१.११	२९.६०
६	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२२५२२	पटक	१	०.२७	३	१	०.२७	१००.००	१.११	३७.००
७	LACC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	१	०.६४	७.२	१	०.६४	१००.००	१.१३	१५.६९
८	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.०९	१	१	०.०९	१००.००	०.०६	६.४८
९	चार पाइप्रे सवारी साधनमा AC जडान (बागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२२२२१	पटक	१	०.२७	३	१	०.२७	१००.००	२.९४	९७.९९
१०	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.२७	३	१	०.२७	१००.००	१.७२	५७.३७
११	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१	०.०९	१	१	०.०९	१००.००	०.१४	१३.५०
१२	PAU का कार्यक्रम सुधार	२२२३१	पटक	१	०.२७	३	१	०.२७	१००.००	२.९८	९९.४४
१३	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	१	०.४९	५.५	१	०.४९	१००.००	१.४७	२६.७४
१४	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	१	०.०९	१	१	०.०९	१००.००	१.००	१००.००
१५	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.२७	३	१	०.२७	१००.००	२.७५	९१.६४

क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
				लक्ष्य	हस्त	पुष्टि	लक्ष्य	हस्त	पुष्टि	रु. रु.	रु. रु.
१६	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	१	०.२५	२.८५	१	०.२५	१००.००	०.०८	२.६३
१७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शिता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११	पटक	१	१६.४	१८५	१	१६.४	१००.००	१०४.२९	५६.३८
१८	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२	पटक	१	०.५३	६	०	०	०.००	०.००	०.००
१९	फार्म केन्द्रको फलफूल बलकमा प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.४४	५	१	०.४४	१००.००	४.९६	९९.१३
२०	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	१	०.७१	८	०	०	०.००	०.००	०.००
२१	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका रिकमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	१	०.५७	६.४	०	०	०.००	०.००	०.००
२२	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	१	०.८९	१०	१	०.८९	१००.००	८.६९	८६.९४
२३	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	१	२.१३	२४	०	०	०.००	०.००	०.००
२४	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको बगैँचा व्यवस्थापन, काटछौट सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	१	०.२७	३	०	०	०.००	०.००	०.००
२५	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	१	०.५३	६	०	०	०.००	०.००	०.००
२६	सरोकाबालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.१८	२	०	०	०.००	०.००	०.००
२७	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५१२	पटक	१	०.७१	८	०	०	०.००	०.००	०.००
२८	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLCC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.५७	६.४	१	०.५७	१००.००	२.८५	४४.५९
२९	Lead farmers मार्फत थोपा सिँचाइ प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.०९	१	०	०	०.००	०.००	०.००
३०	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५११	पटक	१	०.१८	२	०	०	०.००	०.००	०.००
३१	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५१२	पटक	१	०.३५	४	१	०.३५	१००.००	२.७७	६९.२५
३२	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५११	पटक	१	१.०६	१२	०	०	०.००	०.००	०.००

क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
				मात्रा	शुद्धि	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	प्रतिशत	रु. प्र. क्रि.	रु. प्र. क्रि.
३३	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme २) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२२५२२	पटक	१	२.९३	३३	१	२.९३	१००.००	६.४८	१९.६३
३४	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme २) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३	पटक	१	५०.२८	५६७	१	५०.२८	१००.००	१९.९८	३.५२
३५	उच्चस्तरीय joint monitoring	२२५२२	पटक	१	०.४४	५	०	०	०.००	०.००	०.००
३६	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक पुष्टोपेक्षाका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	१	०.१८	२	१	०.१८	१००.००	१.०६	५३.२३
३७	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१	०.३५	४	१	०.३५	१००.००	२.३१	५७.६९
३८	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१	०.७१	८	१	०.७१	१००.००	१.२५	१५.६७
३९	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC)बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१	०.८	९	१	०.८	१००.००	०.३५	३.८४
४०	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	१	०.१८	२	०	०	०.००	०.००	०.००
४१	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	१	०.१८	२	१	०.१८	१००.००	१.९४	९६.८८
४२	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	१	०.५३	६	१	०.५३	१००.००	०.१७	२.९१
४३	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	१	०.२१	२.४	१	०.२१	१००.००	०.५१	२१.३७
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				४३	८६.४६	१७४.७४	३०	७८.८८	९३.३३	१७५.८५	१८.०४
कुल जम्मा खर्च				४६	१००.०३	११२७.७४	३३.२	८०.०३६	८०.०४	१८३.२४	१६.०७

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			वित्तीय प्रगति	
				नियोजित	भुक्त	वृद्धि	पूरा	आंशिक	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
३	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)										
११.३.२.२०	तुई पाइप्रे सवारी साधन	३११२१	पटक	२.००	०.२९	६.५०	१.९६	०.२८	९८.०६	६.३७	९८.०६
११.३.७.२१२	कार्यालयको कार्यक्षमको लागि AC खरिद तथा जडान	३११२२	पटक	३.००	०.१३	३.००	२.९३	०.१३	९७.६०	२.९३	९७.६०
११.३.१०.४६	प्रयोगशालाको लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण खरिद	३११२२	पटक	१.००	०.८६	१९.५०	१.००	०.८६	९९.५०	१९.५०	९९.५०
११.३.२२.९०	ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर, DSLR Camera, Multimedia Projector, लगायत विद्युतीय उपकरण खरिद	३११२२	पटक	१.००	०.३८	८.५०	०.९८	०.३७	९८.०८	८.३४	९८.०८
११.४.२२.८४	फार्म पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (Hi-Tech नर्सरी, स्कीन हाउस)	३११५९	पटक	१.००	४.२०	९५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११.४.२२.८५	फार्म पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (पखौल, बारबन्देज तथा विकास निर्माण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता	३११५९	पटक	१.००	९.७२	२२०.००	०.०५	०.४९	५.०६	११.१४	५.०६
११.६.१३.४४	कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्स्चर	३११२३	पटक	१.००	०.२२	५.००	१.००	०.२२	१००.००	५.००	१००.००
क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१०.००	१५.८०	३५७.५०	७.१२	१२.५१	७९.३०	५३.४८	१३.८७
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						०.००	०.००	०.००		
१.१.१.२	अधिकृतस्तर एघारौँ	२११११	जना	०.००	०.४७	१०.७२	०.००	०.००	०.००	४.५७	४२.६५
१.१.१.३५	अधिकृतस्तर नवौँ र दशौँ	२११११	जना	०.००	०.४५	१०.०९	०.००	०.००	०.००	८.७९	८७.०७
१.१.१.३६	अधिकृतस्तर सातौँ र आठौँ	२११११	जना	०.००	१.५३	३४.६०	०.००	०.००	०.००	२९.८९	८६.४०
१.१.१.३७	सहायकस्तर पाँचौँ र अधिकृतस्तर छैटौँ	२११११	जना	०.००	१.०४	२३.५८	०.००	०.००	०.००	१६.१३	६८.३९
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११	महिना	१०.००	०.०५	१.२०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.१.७.१	इमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	१.००	०.०५	१.२०	१.००	०.०५	१००.००	०.१९	१५.५०
१.२.२.२	स्थायी कर्मचारीको महँगो भत्ता	२११३२	जना	९.००	०.१०	२.१६	९.००	०.१०	१००.००	१.७६	८१.४८
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	९.००	०.०४	०.९०	७.००	०.०३	७७.७८	०.७०	७७.७८
२.५.७.२	कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	१.००	०.१३	३.००	१.००	०.१३	१००.००	२.९६	९८.८१
२.५.७.१०	करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पोशाक	२२४१३	जना	२.००	०.०१	०.२०	२.००	०.०१	१००.००	०.२०	१००.००
२.५.७.१५	करारका कर्मचारीका लागि चाडपर्व खर्च	२२४१३	जना	२.००	०.०२	०.५६	२.००	०.०२	१००.००	०.५२	९३.४२
२.५.७.४२	हतुका सवारी चालक करार	२२४१३	जना	१.००	०.१५	३.३६	१.००	०.१५	१००.००	३.३१	९८.६१

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति				वित्तीय प्रगति	
				पूरा	भाग	बचे	पूरा	भाग	पूरा	भाग	खर्च	प्रतिफल
२.८.२.२	कर्मचारीहरूको भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१०.००	०.०५	१.२०	१०.००	०.०५	१०.००	०.००	१.२०	९९.८०
२.९.२.१	सवारी साधनको बीमा तथा नवीकरण खर्च	२२२१४	पटक	१.००	०.०२	०.५०	१.००	०.०२	१००.००	०.३२	६४.५१	
३	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)								०.००	०.००	०.००	
१.२.४.२७	LLCC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	१०५.००	०.७०	१५.७५	१०५.००	०.७०	३८.१०	५.७६	३६.५४	
१.२.४.२८	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	२०.००	०.१३	३.००	२०.००	०.१३	१००.००	२.९३	९७.५०	
१.२.४.२९	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	१५.००	०.१७	३.७५	१२.००	०.१४	८०.००	२.८९	७६.९३	
२.२.२.२३	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	१०.००	०.०९	२.१५	६.००	०.०५	६०.००	१.२४	५७.५९	
२.२.२.२४	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	२.००	०.०४	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२.२.२.२५	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	२.००	०.२७	६.१२	२.००	०.२७	१००.००	५.५०	८९.९४	
२.२.३.११	अन्य इन्धन (रजिस्ट्रारको लागि प्रयोजन)	२२३१४	पटक	४.००	०.०४	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२.३.१.२२	चार पाइप्रे सवारी साधनमा AC जडान (बागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२२२१३	पटक	२.००	०.१३	३.००	२.००	०.१३	१००.००	३.००	१००.००	
२.३.१.२३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	४.००	०.०४	१.००	४.००	०.०४	१००.००	०.९८	९७.६५	
२.३.१.२४	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	४.००	०.१३	३.००	४.००	०.१३	१००.००	२.८९	९६.२३	
२.३.२.२४	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	४.००	०.०४	१.००	२.००	०.०२	५०.००	०.४६	४५.६३	
२.४.१.२१	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	४.००	०.२९	६.६०	४.००	०.२९	१००.००	६.०८	९२.०८	
२.४.१.४.८	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	४.००	०.०४	१.००	४.००	०.०४	१००.००	०.९२	९२.००	
२.४.१.४.९	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	४.००	०.१३	३.००	४.००	०.१३	१००.००	२.७०	८९.८७	
२.५.२.३७	PCR/ELISA Test को लागि विज्ञ सेवा कक्षमा लिने (Bio Technologist/Molecular Biologist)	२२४११	पटक	१.००	०.२३	५.२५	१.००	०.२३	९९.८६	५.२४	९९.८६	
२.७.१.५.१३१२	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	३३.००	०.२२	४.९५	५.००	०.०३	१५.१५	०.३४	६.८७	
२.७.१.५.१३१४	आयोजना लागू हुने Batch ३ का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	१६.००	०.७१	१६.००	१६.००	०.७१	१००.००	११.१२	६९.५२	
२.७.१.५.१३१६	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	७५.००	०.८३	१८.७५	७५.००	०.८३	१००.००	१७.८८	९५.३६	
२.७.१.५.१३१९	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२	पटक	१.००	०.२७	६.००	१.००	०.२७	१००.००	२.७०	४५.००	
२.७.१.५.१३२१	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			वित्तीय प्रगति	
				पुरुष	महिला	बच्चा	पुरुष	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
२.७.१५.१३२३	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११	पटक	१.००	२१.५६	४८८.०४	१.००	२१.५६	१००.००	४७८.७४	९८.०९
२.७.१५.१३२४	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३	पटक	२.००	५०.८०	११५०.००	०.०५	१.२७	२.५०	१८.१०	१.५७
२.७.१५.१३२५	व्यावसायिक सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा तथा नर्सरीमा रोग कीराहरूको परीक्षण (Citrus Greening Disease/HLB, Citrus psylla लगायत) र व्यवस्थापन सिफारिस	२२५२२	पटक	७.००	०.३१	७.००	०.५०	०.०२	७.१४	०.२६	३.६४
२.७.१५.१३२७	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३२८	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५१२	पटक	१.००	०.१७	३.९६	१.००	०.१७	१००.००	१.९८	४९.९१
२.७.१५.१३२९	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLCC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३३२	Lead farmers मार्फत थोपा सिँचाई प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१५.००	०.१०	२.२५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३३३	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५११	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३३६	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको बगैँचा व्यवस्थापन, काटछोट सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३३७	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३४०	बागवानी विकास स्रोत केन्द्रमा सुन्तलाजात फलफूल बल्कमा प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१.००	०.२२	५.००	१.००	०.२२	१००.००	४.८६	९७.१०
२.७.१५.१३४१	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३४३	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५१२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.७.१५.१३४४	सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.८.१.६४	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	४.००	०.२२	५.००	४.००	०.२२	१००.००	४.९०	९७.९०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			वित्तीय प्रगति	
				पूरा	आ	बचे	पूरा	आ	भारि	लक्ष्य	प्रतिशत
२.८.१.६५	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	६.००	०.१३	३.००	२.००	०.०४	३३.३३	०.६१	२०.२७
२.८.१.६६	उच्चस्तरीय joint monitoring	२२५२२	पटक	१.००	०.२२	५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.८.१.६७	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१५.००	०.८०	१८.००	३.००	०.१६	२०.००	२.८८	१६.०३
२.८.१.६८	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	४.००	०.४९	११.००	२.००	०.२५	५०.००	३.०६	२७.८५
२.९.८.२	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	४.००	०.०९	२.००	१.००	०.०२	२५.००	०.०४	२.०८
२.९.९.१८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	१२.००	०.२७	६.००	७.००	०.१६	५८.३३	२.८२	४७.०२
२.९.९.१९	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	४.००	०.०९	२.००	३.००	०.०७	७५.००	०.०५	२.५८
२.९.९.२०	मासिक मिटिङ तथा दैनिक विद्यापन	२२७११	पटक	१२.००	०.११	२.४०	१२.००	०.११	१००.००	१.२३	५१.३२
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			४४५.००	८४.१९	११०६.२४	२७३.५५	५१.७५	६१.४७	६६२.६८	३४.७६
	कुल जम्मा खर्च			४५५.००	१९.१९	२२६३.७४	२८१.४७	६१.८६	६१.८६	७१५.८५	३१.६२

२.३.१.५ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	भारित	भारित प्रतिशत
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
१	कार्यालयको कार्यक्षेत्रको लागि AC खरिद तथा जडान	३११२२	थान	१	०.२३	३	०.२३	१००.००
क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१	०.२३	३	०.२३	१००.००
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
२	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१	०.०८	१	०.०३	३५.४२
३	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	१	०.१६	२.१५	०.१३	८३.६०
४	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१	०.४६	६.१२	०.३४	७४.५७
५	अन्य इन्धन (रयाँसहित) कार्यालय प्रयोजन	२२२१४	पटक	१	०.०८	१	०.०७	८७.८५
६	LLCCको बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	१	०.७९	१०.५	०.१९	२३.७६
७	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	१	०.२८	३.७५	०.०६	२१.५२
८	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१	०.२३	३	०.१३	५६.७३
९	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.२३	३	०.२२	९९.६२
१०	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.०८	१	०.०७	९९.२५
११	चार पाइप्रे सवारी साधनमा AC जडान	२२२१३	पटक	१	०.०८	१	०.०७	९९.४१
१२	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१	०.०८	१	०.०८	९९.८९
१३	PGU का कार्यक्रम सुधार	२२५२२	पटक	१	०.३८	५	०.३८	९९.८८
१४	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	१	०.५०	६.६	०.५०	१००.००
१५	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२५२२	पटक	१	०.०८	१	०.०८	१००.००
१६	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.२३	३	०.२३	१००.००
१७	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	१	०.२६	३.४५	०.००	०.००
१८	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२२५२२	पटक	१	५४.०८	७२०	०.००	०.००
१९	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	१	२.२५	३०	०.००	०.००
२०	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यनिधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५१२	पटक	१	०.४५	६	०.३८	८४.०२
२१	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५१२	पटक	१	०.७५	१०	०.७५	९९.३०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	भारित	भारित प्रतिशत
२२	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLCC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.६०	८	०.५२	८६.७६
२३	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	१	०.७५	१०	०.००	०.००
२४	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	१	०.९४	१२.५	०.९०	९५.६७
२५	Lead farmers माफत थोपा सिँचाइ प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.०८	१	०.००	०.००
२६	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५२२	पटक	१	०.४५	६	०.००	०.००
२७	सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.१५	२	०.०७	४८.७३
२८	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको बगैँचा व्यवस्थापन, काटछौट सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	१	०.२३	३	०.२३	१००.००
२९	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	१	०.६०	८	०.५६	९३.९४
३०	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५१२	पटक	१	१.०५	१४	०.००	०.००
३१	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	१	०.५३	७	०.००	०.००
३२	आयोजना लागू हुने Batch ३ का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.६०	८	०.१८	२९.८५
३३	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११	पटक	१	११.१२	१४८	७.५१	६७.५७
३४	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४१३	पटक	१	१७.४२	२३२	९.२७	५३.२३
३५	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१	१.१३	१५	०.१५	१३.३१
३६	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१	०.६८	९	०.६८	९९.९१
३७	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	१	०.२३	३	०.०९	३८.४२
३८	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१	०.३८	५	०.३८	९९.९६
३९	उच्चस्तरीय Joint Monitoring	२२६११	पटक	१	०.४५	६	०.००	०.००
४०	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	१	०.१५	२	०.१३	८४.७३
४१	मासिक बैठक तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	१	०.१८	२.४	०.१७	९५.४४
४२	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	१	०.४५	६	०.१०	२१.७३
४३	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	१	०.१५	२	०.१५	९९.७६
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				११.७७	१३४८.४७	२४.७७	२४.८३
	कुल जम्मा खर्च				१००.००	१३३१.४७	२५.००	२५.००

३.३.१.६ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधि सम्म प्रगति	
				परिमण	भार	बजेट	परिमण	भारित
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								
१	दुई पाइप्रे सवारी साधन	३११२१	पटक	०	०.४६	६.५	०.४६	६.१९
२	सवारी साधन खरिद (४ W/D Pickup) (सतर्बौझ फर्मको लागि १, आयोजना कार्यान्वयन इकाईको लागि १ थान)	३११२१	पटक	०	४.५८	६५	४.५८	६३.६०
३	कार्यालयको कार्यक्षेत्रको लागि AC खरिद तथा जडान	३११२२	पटक	०	०.२१	३	०.२१	२.९६
४	इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद (ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर, Multimedia Projector, तथा अन्य)	३११२२	पटक	०	०.६०	८.५	०.६०	७.८५
५	सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र, बैतडीको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (घर निर्माण, वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माण, निकास प्रणाली निर्माण, गरा सुधार तथा पालेघर निर्माण) (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११७१	पटक	०	८.८१	१२५	०.००	
६	सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र, बैतडीको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (hi tech नर्सरी, callusing घर निर्माण, हेलस्टोन नेट)	३११७१	पटक	०	८.४६	१२०	०.००	
७	कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्स्चर	३११२३	पटक	०	०.३५	५	०.३५	४.९०
क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२३.४७	३३३.	६.२०	८५.५१
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
८	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.०७	१	०.०७	०.९६
९	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.४३	६.१२	०.४३	३.९४
१०	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	०	०.१५	२.१५	०.१५	१.१३
११	अन्य इन्धन (गर्मीसहित) कार्यालय प्रयोजन	२२३१४	पटक	०	०.०७	१	०.०७	०.३०
१२	LLCC को बैटक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.५१	७.२	०.५१	४.२०
१३	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैटक	२११३४	पटक	०	०.२६	३.७५	०.२६	०.९५
१४	मूल्याङ्कन समितिको बैटक भत्ता	२११३४	पटक	०	०.२१	३	०.२१	१.४९
१५	चार पाइप्रे सवारी साधनमा AC जडान (वागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२२२१३	पटक	०	०.२१	३	०.२१	२.९९
१६	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.२१	३	०.२१	१.५५
१७	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.०७	१	०.०७	०.१२
१८	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	०	०.०७	१	०.०७	०.४५

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधि सम्म प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भाति	वजेट
१९	PGU का कार्यक्ष सुधार	२२२९१	पटक	०	०.१४	२		०.१४	१.९६
२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	०	०.४४	६.३		०.४४	५.३३
२१	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	०	०.२१	३		०.२१	०.२३
२२	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	०	०.०७	१		०.०७	०.८७
२३	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२२५२२	पटक	०	४२.२८	६००		१२.३०	११.४०
२४	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५२२	पटक	०	०.५६	८		०.५६	१.३२
२५	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुणस्रो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	०	०.२	२.८५		०.२०	
२६	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५२२	पटक	०	०.५६	८		०.५६	३.००
२७	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५२२	पटक	०	०.४२	६		०.४२	३.४६
२८	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLCC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५२२	पटक	०	०.४५	६.४		०.४५	१.८४
२९	आयोजना लागू हुने Batch ३ का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५२२	पटक	०	०.४५	६.४		०.४५	४.९५
३०	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५२२	पटक	०	०.४९	७		०.४९	०.००
३१	Lead farmers मार्फत थोपा सिँचाइ प्रदर्शन	२२५२२	पटक	०	०.०७	१		०.०७	०.९२
३२	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	०	०.७०	१०		०.७०	९.७९
३३	फार्म केन्द्रको फलफूल ब्लकमा प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	०	०.३५	५		०.३५	३.७१
३४	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	०	१.६९	२४		०.००	०.००
३५	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५२२	पटक	०	०.९९	१४		०.००	०.००
३६	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५२२	पटक	०	०.४५	६.४		०.००	०.००
३७	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको बगैँचा व्यवस्थापन, काटछोट सम्बन्धी तालिम	२२५२२	पटक	०	०.२१	३		०.२१	२.५०
३८	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२५२२	पटक	०	१९.७३	२८०		११.७०	१६६.०५
३९	सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५२२	पटक	०	०.१४	२		०.०३	०.४७

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधि सम्म प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	वजेट
४०	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५२२	पटक	०	०.४२	६		०.४२	६.००
४१	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.५७	८.१		०.५७	३.९७
४२	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	०	०.२१	३		०.२१	०.७२
४३	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.२८	४		०.२८	३.९९
४४	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.८५	१२		०.८५	४.३९
४५	उच्चस्तरीय joint monitoring	२२६११	पटक	०	०.४२	६		०.४२	३.००
४६	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	०	०.१४	२		०.१४	१.९४
४७	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	०	०.१४	२		०.१४	१.५८
४८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	०	०.४२	६		०.४२	१.०८
४९	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	०	०.१७	२.४		०.१७	१.८०
खा) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा					७६.४८	१०८६.०७		३५.३३	२६४.३४
कुल जम्मा खर्च					११.१५	१४११.०७		४१.४३	३४९.८४

२.३.१.७ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्क, खुमलटार

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
(अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
१	Lab Equipment खरिद	पटक	१	४.९८	३५.००	१		४.९८
२	भौतिक पूर्वाधारहरूको पूँजीगत विकास (पारिपत्त्ये)	पटक	१	१४.२२	१००.००			
३	स्क्रीन हाउस निर्माण (जुम्ला र दैलेख)	पटक	१	१४.२२	१००.००			२.१०
४	Mother plant stock house निर्माण (जुम्ला र माँलेपाटन)	पटक	१	२१.३३	१४०.००			
५	सबारी साधन खरिद (4 WD PICKUP)	सङ्ख्या	५	२४.१७	१७०.००	५		२४.१७
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा		१	७८.११	५५५.००		६	३१.३५

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकड़	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधिस्म यस आ.व.को प्रगति	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
(आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						
	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताको लागि संस्थागत अभिवृद्धि (प्रतिफल १)						
१.	Phenological characterization सहजीकरणको लागि प्राविधिक समितिको बैठक		४	०.१७	१.२०	४	०.१७
२.	बायोटेक्नोलोजिस्ट करार सेवा		१	०.७५	५.२५	१	०.७५
३.	प्राविधिक अधिकृत करारमा लिने (Horticulturist)		२	१.४९	१०.४९	२	१.४९
४.	आयोजनाले लक्ष्य गरेका फलफूलको कलमी विरुवा उत्पादन (स्याउ, ओखर, सुन्तला, कागती)		२	२.४२	१७.००	१	२.४२
५.	संकलित/आयातित जातहरूको जालिय मूल्याङ्कन तथा छनौट		१	१.४२	१०.००	०	१.४२
६.	Macadamia nut र Avocado मा वानस्पतिक प्रसारण प्राविधि विकास		१	०.८५	६.००	०	०.८५
७.	स्याउमा उच्चघनत्व विरुवा उत्पादन प्राविधि विकास (Feather branch production, nutrition and hormonal management, rootstock)		१	०.८५	६.००	१	०.८५
८.	आयोजना लक्षित फलफूल वालीहरूको प्रयोगशाला परीक्षणको लागि आवश्यक Reagents and Chemicals		२	०.८५	६.००	०	०.८५
९.	सुन्तलाजात-२, स्याउ-२, ओखर-२, मकाडेमिया-१ फलफूलका जातहरू दर्ताको लागि आवश्यक कार्य गर्ने		१	०.७१	५.००	१	०.७१
१०	अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट जात दर्ताको लागि Varietal Characterization लगायतका अन्य कार्यमा हुने अनुगमन भ्रमण खर्च		१२	१.०७	७.५०	१२	१.०२
(ख)	जम्मा सञ्चालन बजेट		२७	१०.५८	७४.४४	२६.००	१०.५४
११	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					०	
१२	PIU प्रमुखको तलब		०	१.३१	९.२३	०	०.००
१३	PIU मा काम गर्ने वैज्ञानिकको तलब		०	२.२२	१५.५८	०	०.४४
१४	PIU मा काम गर्ने लेखापालको तलब		०	०.९४	६.५८	०	०.००
१५	PIU मा काम गर्ने प्रशासनमा काम गर्नेको तलब		०	०.९४	६.५८	०	०.४७
१६	ने.कृ.अ.प.का कर्मचारीको लागि पोशाक खर्च		५	०.०७	०.५०	०	०.०३
१७	महँगी भत्ता		५	०.१७	१.२०	०	०.०७
१८	मालसमान तथा अन्य खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता		१८	०.३८	२.७०	१५	०.३१
१९	करारमा पदपूर्ति गर्ने समितिको बैठक भत्ता		५	०.१४	१.००	०	०.१४

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
२०	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च		५	०.०३	०.२४	०	०.०३
२१	जारको पिउने पानी		४०	०.०७	०.४८	१०	०.०७
२२	इमेल इन्टरनेट महसुल		१	०.०६	०.४०	१	०.०६
२३	सञ्चार महसुल जडानसमेत		१	०.१४	०.९६	४	०.१४
२४	अनुगमनमा प्रयोग हुने सवारी साधनको लागि इन्धन		१४४०	०.३६	२.५२	१११०	०.३६
२५	चार पाइग्रे सवारी साधनको लागि इन्धन		८४०.	०.२१	१.४७	५१०	०.२१
२६	दुई पाइग्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (आयोजनाका अनुसन्धान केन्द्रहरू लागि समेत)		७२०	०.१८	१.३०	५२०	०.१८
२७	सवारीसाधनको लागि मोबिल ब्रेक आइल आदि		२०	०.०९	०.६०	१	०.०९
२८	दुई पाइग्रे सवारी साधन मर्मत		४	०.११	०.८०	३	०.११
२९	चार पाइग्रे सवारी साधन मर्मत		१	०.३६	२.५०	०	०.३६
३०	मेसिनरी औजार मर्मत		१	०.१४	१.००	०	०.१४
३१	कार्यालय सञ्चालन खर्च (आयोजनाका अनुसन्धान केन्द्रहरू लागि समेत)		४	०.७१	५.००	३	०.७१
३२	कार्यालयको छपाई खर्च		१२	०.१२	०.८४	३	०.१२
३३	आयोजना सम्बन्धित फलफूल वालीहरूको प्राविधिक प्रकाशन		१	०.२८	२.००	०	०.२८
३४	खरिद सम्बन्धी सूचना प्रकाशन		३	०.३०	२.१०	०	०.३०
३५	अन्य प्रशासनिक तथा प्राविधिक भ्रमण खर्च		१०.	०.८५	६.००	१०	०.८५
३६	खरिद समिति मूल्याङ्कन समितिको खाजा खर्च		१५	०.०७	०.५०	५	०.०७
३७	कार्यालयमा दैनिक चियापान, अतिथि सत्कार एवम् भैपरी आउने विविध खर्च		१२	०.२६	१.८०	०	०.२६
	जम्मा			१०.५०	७३.८८	२११५	५.८०
	चालु जम्मा			२१.०९			१६.३४
	कुल जम्मा			१००.००	७०३.३२	२२२३.००	४७.५९

२.३.२ बेरुजु फछौटको वार्षिक प्रगति विवरण

आयोजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको यद्यपि आ.व. २०८०/८१ को महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण भई प्राप्त अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार देहाय अनुसार बेरुजु कायम हुन आएको छ।

कार्यालय	आ.व. को शुरुवातमा रहेको कूल बेरुजु रु.	आ.व. २०८०/८१ बाट कायम भएको थप बेरुजु रु.	असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु.	नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु.	चालु आ.व. अवधिमा फछौट भएको बेरुजु रु.	बाँकी बेरुजु रु.	कैफियत
केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं							
आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर		१३५५००		१३५५००		१३५५००	
आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ							
आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	५०२,०८७	१३४१०	१३४१०	५०२,०८७	०	५१५,४९७	अनियमित बेरुजु-५,०२,०८७ पेस्की बाँकी बेरुजु-१३,४१०
आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की							
आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत							
आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी		४७१२		४७१२		४,७१२	विज्ञापन बोर्डको कोषमा जम्मा नगरेको प्रमाण नपुगेको रु ४७१२।-
जम्मा	५०२०८७	१५३६२२	१३४१०	६४२२९९	०	६५५७०१	

१.४ आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

चालु आ.व. २०८२/८३ मा यस केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ र मातहतबाट सञ्चालन हुने गरी ब.उ.शी.नं. ३१२०१११३ अन्तर्गत १,५१,६२,४५,००० बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यालयगत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

२.१ केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं

(रु.लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				मा	दि	शुक्र	मा	दि	शुक्र	मा	दि	शुक्र	मा	दि	शुक्र	मा	दि	शुक्र
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
१	कम्प्युनेट नभएको					०.४६				०.४६				०				०
११.३.२२.१३५६	ई-हाजिरी मेसिन खरिद तथा जडान	३११२२	सङ्ख्या	१	०.०१	०.४६	१	०.०१	०.४६	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					२,६५.०८				५०				१.१५				१,००.०८
११.३.११.१२६८	ल्याब उपकरण खरिद (QPCR machine and accessories)	३११२२	पटक	१	०.७७	३५.०८	०	०	०	१	०.७७	३५	०	०	०	०	०	०.०८
११.४.२२.१०४९	शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फामा पूर्वाधार विकास (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१	२.८५	१३०	१	१.०९	५०	०	१.७५	८०	०	०	०	०	०	०
११.४.२२.१०५०	राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र अन्तर्गतका फार्म केन्द्रहरू (पाल्पा, कीर्तिपुर र माफरी) मा उच्च प्रविधिक नर्सरी पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माण (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१	२.१९	१००	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	२.१९	१००
५	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					१८				१८				०				०
११.६.४.३२	आयोजनाको वेबसाइट तथा MIS प्रणाली विकास (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	३११३४	पटक	१	०.३९	१८	१	०.३९	१८	०	०	०	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा																		
				५	६.२१	२,८३.५४	३	१.४९	६८.४६	१	२.५२	१.५५	१	०	०	०	२.१९	१,००.०८
ग) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		

क्र. स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमाण	आ	वृत्त	परिमाण	आ	वृत्त	परिमाण	आ	वृत्त	परिमाण	आ	वृत्त	परिमाण	आ	वृत्त
१	कम्पोनन्ट नभएको					१४						८.५			०			०.५
२.७.१५.४१०३	आयोजनाको IEE गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.३१	१४	१	०.११	५	०	०.११	८.५	०	०	०	०.०१	०.५	०.५
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिकल १)					१७,८२,९७			२,४२,५			३,२५.५			३६.५			११,७८,४७
१.२.४.५४६	Competitive Grant Management Committee को बैठक	२११३४	सङ्ख्या	३	०.११	५.०४	४	०.०२	१	४	०.०२	१	१०	०.०५	२.५	१२	०.०१	०.५४
२.५.२.६७३	Individual Consultant Hiring for Training on Specialized Techniques (CS 01)	२२४११	पटक	१	०.५४	२४,८७	०	०	०	०	०	०	१	०.११	५	०	०.४३	१९,८७
२.५.२.६७५	Crop and Land Database management Consulting Service (CS03)	२२४११	पटक	१	०.७	३२	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०.७	३२
२.५.२.७४५	Pest Risk Analysis of Project Targeted Crops (रात आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२२४११	पटक	१	०.७२	३३	१	०.५५	२५	०	०.१८	८	०	०	०	०	०	०
२.६.१.५८५	Training on Specialized Techniques	२२५११	सङ्ख्या	१	०.१८	८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०.१८	८
२.६.१.५८६	आयोजनाका कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धिको लागि वैदेशिक तालिम तथा भ्रमण	२२५११	पटक	१	२.१८	९९.६८	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	२.१८	९९.६८
२.६.१.६७३	नर्सरी निरीक्षण सम्बन्धी कृषि प्रविधिकलाई तालिम	२२५११	सङ्ख्या	१	०.१३	६	०	०	०	१	०.१३	६	०	०	०	०	०	०
२.६.१.६७५	रोगक्रियाको नमुना सङ्कलन तथा परीक्षणको प्रोटोकल सम्बन्धी तालिम	२२५११	सङ्ख्या	१	०.०७	३	१	०.०७	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.६.१.६७६	Crop and Land Database management training for trainer	२२५११	सङ्ख्या	१	०.१४	६,३२	०	०	०	०	०	०	१	०.१३	६	०	०.०१	०.३२
२.६.४.१४३१	Scheme 6 का लाभग्राहीहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन तालिम	२२५१२	पटक	२	०.२२	१०	१	०.११	५	०	०	०	१	०.११	५	०	०	०
२.७.१५.२६७२	नर्सरी मापदण्ड सम्बन्धी दस्तावेज तयारी	२२५२२	पटक	१	०.०६	२.७	०	०	०	१	०.०३	१.५	०	०.०३	१.२	०	०	०

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमाण	आर	वचन	परिमाण	आर	वचन	परिमाण	आर	वचन	परिमाण	आर	वचन	परिमाण	आर	वचन
२.७.१५.२६७४	स्किम ६ को व्यवसायिक योजना Reviewer को पारिश्रमिक	२२५२२२	सङ्ख्या	१००	०.१	४.५	४०	०.०४	२	६०	०.०५	२.५	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२७३२	सुदृढीकरणका लागि पूरक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 6) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३	पटक	४०	३२.८४	१५००.५	१०	४.३८	२००	०	६.५७	३००	०	०	०	३०	२१.९	१०००.५
२.७.१५.३६८५	लक्षित फलफूल बालीका विरवाहरूको रोगकीरा परीक्षण कार्यक्रम (तमुना सङ्कलन तथा ल्याब परीक्षण (निजी प्रयोगशालामा समेत)	२२५२२२	पटक	४	०.६५	२९.७६	१	०.११	५	१	०.११	५	१	०.२२	१०	१	०.२१	९.७६
२.७.१५.३७७०	लक्षित फलफूल बालीका विरवाहरूको रोगकीरा परीक्षणको लागि रसायन तथा अन्य सामग्री खरिद	२२५२२२	पटक	१	०.११	५	०	०	०	०	०	०	१	०.११	५	०	०	०
२.८.१.१०३२	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	१८	०.२८	१२.६	३	०.०३	१.५	३	०.०३	१.५	६	०.०४	१.८	६	०.१७	७.८
३	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)					१३,८३,६९			४०						१,११.४			११,६१.२५
१.२.४.४८२	Subsidy Management Committee को बैठक	२११३४	पटक	२	०.०५	२.२५	०	०	०	२	०.०१	०.५	४	०.०२	१	४	०.०२	०.७५
१.२.४.६०९	Credit Guarantee Fund Management Committee को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	५	०.०४	१.८	०	०	०	२	०.०२	०.८	१	०.०१	०.४	२	०.०१	०.६
२.३.१८.७३	Credit Guarantee Fund सञ्चालन (Scheme 1)	२६४१३	पटक	१	२१.८९	१०००	०	०	०	०	०	०	१	२.१९	१००	०	१९.७	९००
२.५.२.७४८	आयोजनालक्षित बालीहरूको Pop हरूको प्रचार प्रसारको लागि मल्टिमिडिया सामग्रीहरू तयारी (गत आ.व. को निरन्तरता) NCS	२२४११	पटक	१	१.०९	४९.७४	१०००	०.४४	२०	०	०.६५	२९.७४	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमित	आर	वर्तमान	परिमित	आर	वर्तमान	परिमित	आर	वर्तमान	परिमित	आर	वर्तमान	परिमित	आर	वर्तमान
२.६.१.५३१	विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई आयोजनालक्षित बालीहरूको Package of Practices सम्बन्धी MTOT सञ्चालन	२२५११	सङ्ख्या	२	०.६१	२८	१	०.३१	१४	१	०.३१	१४	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६७७	आयोजना लक्षित बालीहरूको आवश्यकता अनुसार Package of Practices (POP) सम्बन्धी लिफलेट, बुकलेट तथा ब्रोसुर प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.२२	१०	०	०	०	१	०.२२	१०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६७८	आयोजनाको प्रचारप्रसार तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू प्रकाशन	२२५२२	पटक	२	०.१३	६	०	०	०	१	०.०७	३	०	०	०	१	०.०७	३
२.७.१५.२६८०	स्किमहरू कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, फारम लगायतका आवश्यक कागजात छुपाई	२२५२२	पटक	१	०.०७	३	१	०.०७	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२७३०	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरता समेत)	२६४१३	पटक	२	५.४८	२५०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२	५.४८	२५०.५
२.७.२५.१६८८	आयोजना लक्षित बालीहरूको Package of Practices (POP) सम्बन्धी प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.२२	१०	०	०	०	१	०.२२	१०	०	०	०	०	०	०
२.७.२५.७६०	Travelling Seminar	२२५२२	पटक	१	०.१५	७	०	०	०	०	०	०	१	०.१५	७	०	०	०
२.८.१.१०३३	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापनका लागि भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	३०	०.३४	१५.४	६	०.०७	३	६	०.०७	३	८	०.०७	३	८	०.१४	६.४
४	पहाडी क्षेत्रका वागवानीज्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)					३.६२.८			१२			२२.२			२५			३.०३.६

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिगण	शु.प्र.	रु.प्र.	प्रतिगण	शु.प्र.	रु.प्र.	प्रतिगण	शु.प्र.	रु.प्र.	प्रतिगण	शु.प्र.	रु.प्र.	प्रतिगण	शु.प्र.	रु.प्र.
२.५.२.७७९	Local infrastructure design & supervision consultant (CS07)	२२४११ पटक	१	०.६६	३०	०	०	०	०	१	०.११	५	०	०.५५	२५	०	०	०
२.६.६.१४८४	आयोजनाका स्किम ३.४ र ५को कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२ पटक	५	०.६४	२९.२	२	०.२६	१२	१७.२	३	०.३८	१७.२	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.३७१४	मूल्य शुद्धिला प्रवर्दनको लागि पुर्क अनुदान (स्किम ३)	२६४१३ पटक	१	२.१९	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	२.१९	१००
२.७.१५.३७१८	मूल्य शुद्धिला प्रवर्दनको लागि पुर्क अनुदान (स्किम ४)	२६४१३ पटक	१	२.१९	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	२.१९	१००
२.७.१५.३७२१	मूल्य शुद्धिला प्रवर्दनको लागि पुर्क अनुदान (स्किम ५)	२६४१३ पटक	१	२.१९	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	२.१९	१००
२.७.१५.३८३८	आयोजना लक्षित बालीको उत्पादन तथा मूल्य शुद्धिला सम्बन्धी अध्ययन	२२५२२ पटक	१	०.०८	३.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०.०८	३.६
५	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)				७४१.६२			१.८९.२८				१.९२.६६			१.७७.४३			१.८२.२५
१.१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११ जना	०	०.५८	२६.३१	३	०.१८	८.१	०	०.१३	६.०७	०	०.१३	६.०७	०	०.१३	६.०७	०
१.१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११ जना	०	०.४३	१९.७४	३	०.१३	६.०७	०	०.१	४.५५	०	०.१	४.५५	०	०.१	४.५५	०
१.१.१.२.४२	रा.प.तृतीय	२११११ जना	०	०.६९	३१.३५	४	०.२१	९.६५	०	०.१६	७.२४	०	०.१६	७.२४	०	०.१६	७.२४	०
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११ पटक	१	०.०७	३.२२	१	०.०२	०.७५	०	०.०२	०.७५	०	०.०२	०.७५	०	०	०.०४	१.७२
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११ जार	१५०	०.०४	२	४५०	०.०१	०.५	४५०	०.०१	०.५	४५०	०.०१	०.५	४५०	०.०१	०.५	४५०
२.१.३.२	टंगाङ्करोको पानी	२२१११ सङ्ख्या	२	०.०१	०.३	०	०	०	०	०	०	०	०	०.१५	५	०	०.१५	५
२.१.६.८	इन्टरनेट महसुल	२२११२ महिना	१	०.०२	०.९६	१	०.०१	०.२४	०	०.०१	०.२४	०	०.०१	०.२४	०	०.०१	०.२४	०
८.१.६.२८	भौगोलिक विकट क्षेत्रहरूमा अनुगमन निरीक्षणका लागि सवारी साधन भाडामा लिने	२८१४३ पटक	४	०.११	५	१	०.०२	१	०	१	०.०२	१	०	०.०२	१	१	०.०४	२
२.१.६.५१	सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी तथा समन्वयका लागि सञ्चार खर्च	२२११२ सङ्ख्या	१०	०.०२	०.७२	३	०.०१	०.३	०	३	०.०१	०.३	०	०	०.१२	३	०	०
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२ पटक	१	०.०२	०.९६	३	०	०.१५	०	३	०	०.१५	३	०	०.१५	३	०.०१	०.५१
१.२.२.८	कर्मचारीको माँसँग भत्ता	२११३२ महिना	१०	०.०५	२.२८	१०	०.०१	०.५७	०	०	०.०१	०.५७	०	०.०१	०.५७	०	०.०१	०.५७

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमित	आ	कुल	परिमित	आ	कुल	परिमित	आ	कुल	परिमित	आ	कुल	परिमित	आ	कुल
२.२.२.१	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	लीटर	३६००	०.१३	५.७६	९००	०.०४	१.६	९००	०.०४	१.६	९००	०.०४	१.६	९००	०.०२	०.९६
२.२.२.११	मोटरसाईकलको लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर	१८७२	०.०७	३.१९	४६८	०.०२	०.८	४६८	०.०२	०.८	४६८	०.०२	१	९००	०.०१	०.४९
२.२.२.३३	गाडी, मोटरसाइकलका लागि मोबिल, गियर आयल, ब्रेक आयल, आदि	२२२१२	लीटर	१०२०	०.०८	३.८८	२५५	०.०२	०.९	२५५	०.०२	०.९	२५५	०.०२	१	२५५	०.०२	१.०८
२.२.२.३९७	कार्यालयहरूबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षणको लागि ईन्धन (आयोजना निर्देशकलाई समेत)	२२२१२	लीटर	६२४०	०.२१	९.५८	१४४०	०.०६	२.८	१४४०	०.०६	२.८	१४४०	०.०६	२.८	१४४०	०.०३	१.१८
२.२.२.१५	अन्य प्रयोजनको लागि ईन्धन	२२३१४	पटक/सङ्ख्या	१२	०.०२	१	३	०.०१	०.३	३	०.०१	०.३	३	०.०१	०.३	३	०	०.१
१.२.४.६६	दरबन्दी स्वीकृत तथा अन्य	२११३४	पटक	२	०.०४	१.८	४	०.०४	१.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.८८	आयोजना निर्देशक समितिको बैठक	२११३४	पटक	३	०.०६	२.७	१	०.०२	१	०	०	०	१	०.०२	१	१	०.०२	०.७
१.२.४.४८४	MoALD Working Group Committee को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	८	०.०६	२.८८	२	०.०२	०.८	२	०.०२	०.८	२	०.०२	०.८	२	०.०१	०.४८
१.२.४.४८५	आयोजना सहायता तथा अन्य परामर्शदाता खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भन्ना	२११३४	पटक	१०	०.०५	२.२५	२	०.०१	०.५	२	०.०१	०.५	४	०.०२	१	२	०.०१	०.२५
१.२.४.४८६	मालसामान तथा अन्य खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भन्ना	२११३४	पटक	६	०.०५	२.१६	२	०.०१	०.४	४	०.०२	०.८	४	०.०२	०.८	२	०	०.१६
१.२.४.४८७	गुनासो सुनुवाई समितिको बैठक भन्ना	२११३४	पटक	४	०.०२	०.९	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.२५	१	०	०.१५
१.२.४.५००	विभिन्न समिति तथा कार्यदलको बैठक भन्ना	२११३४	पटक	१०	०.०४	१.८	०	०	०	४	०.०२	०.८	०	०	०	६	०.०२	१
१.२.८.२२	शिपु स्याहार भन्ना	२११३९	सङ्ख्या	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	१०	०.०२	०.७	०	०	०	०	०	०	१०	०.०२	०.७	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमाण	शत	व्युत्पन्न	परिमाण	शत	व्युत्पन्न	परिमाण	शत	व्युत्पन्न	परिमाण	शत	व्युत्पन्न	परिमाण	शत	व्युत्पन्न
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	१५	०.०६	२.५६	१५	०.०२	०.७५	०	०.०२	०.७५	०	०.०२	०.७५	०	०.०१	०.३१
२.३.१.११	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	वटा	४	०.१६	७.१३	१	०.०४	२	१	०.०४	२	१	०.०४	२	१	०.०२	१.१३
२.३.२.३१६	कार्यालयका Electronic सामग्री मर्मत खर्च	२२२२१	महिना	१२	०.०३	१.५	३	०.०१	०.५	३	०.०१	०.४	३	०.०१	०.३	३	०.०१	०.३
२.३.२.३६९	आयोजनाका कर्मचारीहरूको कार्यक्रम मर्मत सुधार	२२२३१	पटक	१	०.२२	१०	१	०.११	५	०	०.११	५	०	०	०	०	०	०
२.४.१.१	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलन्द खरिद	२२३११	पटक	१२	०.३४	१५.७४	३	०.११	५	३	०.११	५	३	०.०९	४	३	०.०४	१.७४
२.४.१.५	कार्यालय सम्बन्धी छपाई	२२३११	पटक / सङ्ख्या	४	०.०२	०.८५	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.२५	१	०	०.१
२.४.४.११	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३११	पटक	४	०.०२	०.८५	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.२५	१	०	०.१
२.४.१४.७८	विभिन्न खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	७	०.१३	६.१	४	०.०७	३.२	३	०.०५	२.४	०	०	०	०	०.०१	०.५
२.५.२.५९५	परियोजना कार्यन्वयन सहयोग परामर्शदाता (Project Implementation Support Consultant) सेवा करार	२२४११	महिना	१	९.४६	४३२.१६	३	२.१९	१००	३	२.४१	११०	३	२.४३	१११	३	२.४३	१११.१६
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.१३	५.९३	३	०.०३	१.४५	३	०.०३	१.४५	३	०.०३	१.४५	३	०.०३	१.५८
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	६	०.०४	१.८	६	०	०	१८०	०	०	०	०.०४	१.८	०	०	०
२.५.७.१२४	सवारी चालक करार (हलुका सवारी)	२२४१३	जना	३	०.२३	१०.४२	३	०.०५	२.४९	३	०.०५	२.४९	३	०.०५	२.४९	३	०.०६	२.९५
२.५.७.३६१	कृषि इन्जिनियर करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	१	०.११	५.२५	३	०.०३	१.३१	३	०.०३	१.३१	३	०.०३	१.३१	३	०.०३	१.३२
२.५.८.१९४	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	जना	६	०.०१	०.६	०	०	०	०	०	०	१	०.०१	०.६	०	०	०
२.५.१०.२३१	सरसफाई सेवा करार	२२४१९	पटक	१	०.०३	१.५६	१	०.०१	०.३६	०	०.०१	०.३६	०	०.०१	०.३६	०	०.०१	०.४८
२.५.१०.२३२	कार्यालयका Electronic Training on Procurement and Financial Management	२२४१९	महिना	१	०.०३	१.४४	३	०.०१	०.३६	३	०.०१	०.३६	३	०.०१	०.३६	३	०.०१	०.३६
२.६.१.५८७		२२५११	सङ्ख्या	१	०.१३	६	१	०.१३	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	सर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमाण	आर	वर्त	परिमाण	आर	वर्त	परिमाण	आर	वर्त	परिमाण	आर	वर्त	परिमाण	आर	वर्त
१.६.२.१	योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपदान कोष	२१२१२	जना	१	०.०२	१	१	०	०.०६	०	०	०.०६	०	०	०.०६	०	०.०२	०.०२
२.६.२.१४९	कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम	२२५११	जना	१०	०.११	५	०	०	०	१	०.०४	२	०	०	०	०	०.०७	३
२.६.२.६५	PIU का कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन, सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५११	सङ्ख्या	१	०.११	५	०	०	०	१	०.११	५	०	०	०	०	०	०
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	१०	०.०२	०.०५	१०	०	०.११	०	०	०.११	०	०	०.११	०	०.०१	०.५२
२.६.४.१३९४	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२	पटक	१	०.१४	६.५	०	०	०	१	०.१४	६.५	०	०	०	०	०	०
२.६.६.१२३१	सरोकावालाहरूसँग आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गोष्ठी	२२५१२	सङ्ख्या	३	०.२	९	०	०	०	१	०.०७	३	१	०.०७	३	१	०.०७	३
२.६.६.१६५	वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.११	४.८	१	०.११	४.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.६.६.२७१	योजना तर्जुमा गोष्ठी	२२५१२	प्र.श.	१	०.०७	३	०	०	०	०	०	०	१	०.०७	३	०	०	०
२.६.६.५५१	त्रैमासिक समीक्षा गोष्ठी	२२५१२	पटक	३	०.१	४.५	०	०	०	१	०.०३	१.५	१	०.०३	१.५	१	०.०३	१.५
२.७.२५.१२४०	आयोजना सञ्चालन मिसन व्यवस्थापन	२२५२२	पटक	२	०.१७	७.६९	१	०.०९	४	०	०	०	०	०	०	१	०.०८	३.६९
२.७.२५.१६८३	विभिन्न तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृति	२२५२२	पटक	३	०.०३	१.२	१	०.०१	०.४	२	०.०२	०.८	०	०	०	१	०	०
२.७.२५.१६९१	विभिन्न सरोकावालाहरूसँग आयोजनाका विविध आयाम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया	२२५२२	सङ्ख्या	३०	०.१	४.५	५	०.०२	०.७५	१०	०.०३	१.५	१०	०.०३	१.५	५	०.०२	०.७५
२.७.२५.१६९३	आयोजना सम्बन्धी कार्यविधिहरू तयारी/परिमाण तथा अन्य बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	३	०.०९	४.०५	१	०.०३	१.५	०	०	०	०	०	०	२	०.०६	२.५५
२.७.२५.१६९४	आयोजना वार्षिक प्रगति पुस्तक प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०५	२.५	०	०	०	१	०.०५	२.५	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमाण	रुपैयाँ	शत	परिमाण	रुपैयाँ	शत	परिमाण	रुपैयाँ	शत	परिमाण	रुपैयाँ	शत	परिमाण	रुपैयाँ	शत
२.८.१.१०३४	आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुगमन	२२६११ पटक	१२	०.१४	६.५	१	०.०१	०.५	१.५	३	०.०३	१.५	३	०.०३	१.५	५	०.०७	३
२.८.१.८९४	संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट (नार्कसमेत) सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रम	२२६११ पटक	१८	०.२६	१२	२	०.०३	१.२६	१.५	३	०.०३	१.५	६	०.०९	४	७	०.११	५.२४
२.८.२.२३	सरवा भ्रमण खर्च र प्रशासनिक भ्रमण	२२६१२ पटक	४	०.०७	३	१	०.०१	०.२५	०.२५	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.५	१	०.०४	२
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४ सङ्ख्या	१५	०.०८	३.५	१५	०.०७	३	३	०	०	०	०	०	०	०	०.०१	०.५
२.९.४.४	सवारी साधन नवीकरण शुल्क	२२२१४ सङ्ख्या	१५	०.०३	१.५	१५	०.०३	१.५	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.६.१	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च	२२७११ पटक	१२	०.०८	३.६	०	०.०२	०.९	०.९	०	०.०२	०.९	०	०.०२	०.९	०	०.०२	०.९
२.९.८.६	कार्यालयमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार खर्च	२२७११ पटक	१२	०.०५	२.४	०	०.०१	०.६	०.६	०	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६
२.९.९.१	मासिक मिडिडमा खाजा खर्च	२२७११ सङ्ख्या	१२	०.०५	२.४	०	०.०१	०.६	०.६	०	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६
२.९.९.१४६	विश्वकर्मा पूजा खर्च	२२७११ पटक	१	०.०१	०.२५	१	०.०१	०.२५	०.२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.९.२०३	आयोजनाका विभिन्न समिति लगायत अन्य बैठकहरूको खाजा	२२७११ पटक	८	०.१२	५.५५	२	०.०३	१.४	१.४	२	०.०३	१.४	२	०.०३	१.४	२	०.०३	१.२५
(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१,३४,७५	५३.८३	४२,८५.०८	४७,३८	१०.७५	४,८८.७८	६,१९.१	३८.५१	१३.६	६,१९.१	३६,३७	७.६८	३,५०.३३	४०,१५	६१.८४	२८,२६.०७
कुल जम्मा खर्च			१,३४,८०	५३.८३	४५,६८.६२	४७,४१	१३.२४	५,५७.२४	७,३४.१	३८.६०	१६.१२	७,३४.१	३६,३८	७.६८	३,५०.३३	४०,१५	६४.०३	२९,२६.१५

२.४.२ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				पहिलो	दोस्रो	तेश्रो	पहिलो	दोस्रो	तेश्रो	पहिलो	दोस्रो	तेश्रो	पहिलो	दोस्रो	तेश्रो			
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					४			०.७८				०					२.८
११.३.२२.१८	कार्यालयको कार्यक्षेत्रको लागि AC खरिद तथा जडान	३११२२	पटक	४	०	०.०३	०	०.७८	०	०.०२	०	०	०	०	०	०.१२		२.८
३	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)			९५				०.५६			०.५६			०.०८				१३.८
११.४.२२.३३	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (उच्च प्रविधिक नर्सरी र स्किन हाउस निर्माण, सिँचाई पूर्वाधार, किटी बगैँचा सुदृढीकरण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता	३११५९	पटक	९५	०	०.०२	०	०.५६	०	०.०२	०.५६	०	०	०.०८	०	३.९७		१३.८
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा																		
			०	४.१९	९९	०	०.०५	१.३४	०	०.०४	०.९८	०	०	०.०८	०	४.०९		९६.६

अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)			१२०.९९					२२.१३						०.९४			९१.९९
२.१.४.३	पानी तथा बिजुली	२२१११	पटक	०	०.०५	०	०.०४	१	०	०	०	०	०	०	०	०.०१		०.२
२.१.६.४	सञ्चार महसुल	२२११२	पटक	०	०.०३	०	०.०३	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०		०
२.१.७.३	इन्टरनेट महसुल	२२११२	पटक	०	०.०२	०	०.०२	०.४	०	०	०	०	०	०	०	०		०.१
२.२.२.१२	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	०	०.०९	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०.०७		१.६५
२.२.२.१३	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.०७	१.६	०	०.०६	१.५	०	०	०	०	०	०	०		०.१
२.२.२.१४	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.२४	५.७६	०	०.०२	०.५१	०	०.०२	०.५१	०	०.०१	०.१८	०	०.१९	४.५६
२.२.३.९	अन्य इन्धन (रयसहित) कार्यालय प्रयोजन	२२३१४	पटक	०	०.०३	०.६	०	०.०३	०.६	०	०	०	०	०	०	०		०
१.२.४.१३	LACC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.७	१६.५	०	०.०३	०.६६	०	०.०३	०.६६	०	०	०.०८	०	०.६४	१५.१
१.२.४.१४	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनसो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.२९	६.९	०	०.०३	०.७८	०	०.०१	०.२२	०	०	०	०	०.२५	५.९
१.२.४.१५	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	०	०.१३	३	०	०.०३	०.६	०	०	०	०	०	०	०.१		२.४
१.२.४.१६	Provincial project steering committee meeting	२२५२२	पटक	०	०.०८	१.८	०	०.०२	०.४	०	०	०	०	०	०	०.०६		१.४
१.२.४.१७	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भन्ना	२११३४	पटक	०	०.०६	१.५	०	०.०३	०.६	०	०	०	०	०	०	०.०४		०.९
१.२.४.१८	दरबन्दी समितिको बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.०२	०.५	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०		०
२.३.१.११	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.१३	३	०	०.०२	०.५१	०	०.०२	०.५१	०	०.०१	०.१८	०	०.०८	१.८

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
२.३.१.१२	दुई पाइरो सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.०६	१.४	०	०.०३	०.६६	०	०.०३	०.६६	०	०	०.०८	०	०	०
२.३.२.१०	कार्यालय मेसिनरी अंजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	०	०.०७	१.६	०	०.०३	०.६६	०	०.०३	०.६६	०	०	०.०८	०	०.०१	०.२
२.४.१.९	आयोजनाका स्किमहरूको फारमहरू छपाई	२२३११	पटक	०	०.०४	१	०	०.०४	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.१०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	०	०.२५	६	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०.२३	५.५	०
२.४.१.४.६	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	०	०.०४	१	०	०.०२	०.४	०	०	०	०	०	०	०.०३	०.६	०
२.४.१.४.७	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	०	०.१३	३	०	०.०३	०.६	०	०	०	०	०	०	०.१	२.४	०
२.६.६.६९	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा तथा सम्बन्ध गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०४	१	०	०.०२	०.५६	०	०.०२	०.४४	०	०	०	०	०	०
२.७.१.१	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	०	०.०३	०.८	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०.०१	०.३	०
२.७.१.५.३५३	सरोकावालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०४	१	०	०.०३	०.७८	०	०.०१	०.२२	०	०	०	०	०	०
२.८.१.३८	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	०	०.१७	४	०	०.०४	१	०	०	०	०	०	०	०	०.१३	३
२.८.१.३९	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.२	४.८	०	०.०३	०.६६	०	०.०३	०.६६	०	०	०.०८	०	०.१४	३.४
२.८.१.४०	स्थानीय तह सम्बन्ध समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	१.१२	२६.४	०	०.०३	०.७८	०	०.०१	०.२२	०	०	०	१.०७	२५.४	०
२.८.१.४१	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.४१	९.६८	०	०.०३	०.६६	०	०.०३	०.६६	०	०	०.०८	०	०.३५	८.२८
२.९.४.१	ब्रीमा तथा नवीकरण	२२२१४	पटक	०	०.०२	०.५	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.८.५	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	०	०.०८	१.८	०	०.०५	१.२	०	०	०	०	०	०	०.०३	०.६	०
२.९.९.१७	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	०	०.०८	१.८	०	०.०२	०.५१	०	०.०२	०.५१	०	०.०१	०.१८	०	०.०३	०.६
२.९.९.१८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	०	०.३	७.२	०	०.०६	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०.२४	५.७
२.९.९.१९	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	०	०.१	२.४	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०.०८	१.९	०
१	आयोजनामा सेलमन हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)					२१०८.०१			१२.०३			३.२७			०.६			२०९२.११
२.५.२.२७	इन्जिनियरिङ सेवा करार	२२४११	पटक	०	०.०८	२	०	०.०६	१.५	०	०	०	०	०	०	०.०२	०.५	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
२.७.१५.३११	Lead Farmers लाई बैगैचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	०	०.८९	२१	०	०.०२	०.५६	०	०.०२	०.५६	०	०	०.०८	०	०.८४	१९.८
२.७.१५.३१२	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५१२	पटक	०	०.५१	१२	०	०.०३	०.६६	०	०.०३	०.६६	०	०.०१	०.१८	०	०.४४	१०.५
२.७.१५.३२५	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	०	०.५५	१३	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०.५३	१२.५
२.७.१५.३२६	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५१२	पटक	०	०.२५	६	०	०.०५	१.२	०	०	०	०	०	०	०	०.२	४.८
२.७.१५.३२७	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३	पटक	०	७१.९	१७००.४२	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०	७१.८८	१६९९.९२
२.७.१५.३२८	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.३	७.२	०	०.०२	०.५१	०	०.०२	०.५१	०	०.०१	०.१८	०	०.२५	६
२.७.१५.३३७	Lead farmers मार्फत योप सिचिद प्रदर्शन	२२५२२	पटक	०	०.१४	३.३	०	०.०२	०.५६	०	०.०२	०.५६	०	०	०.०८	०	०.०९	२.१
२.७.१५.३३८	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२	पटक	०	०.३४	८	०	०.०५	१.२	०	०	०	०	०	०	०	०.२९	६.८
२.७.१५.३५०	कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई विस्वा हुर्काए वापतको प्रत्याहन अनुदान	२६४१३	पटक	०	०.१३	३	०	०.०६	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०.०६	१.५
२.७.१५.३५१	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	०	०.४७	११	०	०.०३	०.७८	०	०.०२	०.४२	०	०	०	०	०.४१	९.८
२.७.१५.३५२	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	०	२.७९	६६	०	०.०२	०.५६	०	०.०२	०.५६	०	०	०.०८	०	२.७४	६४.८
२.७.१५.३६३	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११	पटक	०	१०.३७	२४५.१९	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०	१०.३५	२४४.६९
२.७.१५.३६४	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	०	०.४२	९.९	०	०.०६	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०.३६	८.४
३	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					२९			३.२९						०.१८			२४.८
२.७.१५.३१७	निजी नर्सरीहरूलाई फलफूल विस्वाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५१२	पटक	०	०.१३	३	०	०.०२	०.५१	०	०.०२	०.५१	०	०.०१	०.१८	०	०.०८	१.८

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमित	भार	व्यति	परिमित	भार	व्यति	परिमित	भार	व्यति	परिमित	भार	व्यति	परिमित	भार	व्यति
२.७.१५.३३९	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूका POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५११ पटक	०	०.८९	२१	०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०.८७	२०.५
२.७.१५.३६५	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५११ पटक	०	०.१५	३.५	०	०.०६	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०.०८	२
२.७.१५.३६५	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५१२ पटक	०	०.०६	१.५	०	०.०३	०.७८	०	०.०१	०.२२	०	०	०	०	०	०.०२	०.५
२	पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)					८		१.०१			०.५१			०.१८				६.३
२.७.१५.३३६	आयोजनाका सम्भावित लाभप्राप्तीहरूको लागि आयोजनाका स्किम ३, स्किम ४ र स्किम ५ सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२ पटक	०	०.२१	५	०	०.०२	०.५१	०	०.०२	०.५१	०	०.०१	०.१८	०	०.१६	३.८	
२.७.१५.३६२	मूल्य शृङ्खलाका सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास तालिम	२२५१२ पटक	०	०.१३	३		०	०.०२	०.५	०	०	०	०	०	०	०.११	२.५	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				०	१५.८३	२२६६	०	१.५१	३८.४६	०	०.४४	१०.४४	०	०.०७	१.१	१३.६७	२३१५.२	
कूल जम्मा खर्च				०	१००.०२	२३६५	०	१.६४	३९.८	०	०.४८	११.४२	०	०.०७	१.५८	१७.७६	२३१६.८	

२.४.३ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश

(रु. लाखमा)

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमित	भार	वचो	परिमित	भार	वचो	परिमित	भार	वचो	परिमित	भार	वचो	परिमित	भार	वचो
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
३	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिकल १)					१३५			०.८४			०.१२			०			१३४.०४
११.४.२.२.३५८	फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (स्कीन हाउस, hi tech ग्राफ्ट हाउस निर्माण)	३११५९ पटक		०	८.२१	१००		०	०.०३	०.४२		०	०.०६	०	०	०	८.१७	९९.५२
११.४.२.२.३५९	फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (पखोल तथा बारबन्देज) गत आर्थिक वर्षको निरन्तरता	३११५९ पटक		०	२.८७	३५		०	०.०३	०.४२		०	०.०६	०	०	०	२.८३	३४.५२
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				०	११.०८	१३५		०	०.०६	०.८४		०	०.१२	०	०	०	११	१३४.०४

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमित	भार	वृत्त	परिमित	भार	वृत्त	परिमित	भार	वृत्त	परिमित	भार	वृत्त	परिमित	भार	वृत्त
आ) चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू																		
२	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					७२.०७			८.७१			०.१२			०			६३.२४
२.१.४.३	पानी तथा विजुली	२२१११	पटक	०	०.१	१.२	०	०.०१	०.१८	०	०	०	०	०	०	०	०.०८	१.०२
२.१.६.८	सञ्चार महसुल	२२११२	पटक	०	०.०५	०.६	०	०.०१	०.१८	०	०	०	०	०	०	०	०.०३	०.४२
२.१.७.९	इन्टरनेट महसुल	२२११२	पटक	०	०.०४	०.५	०	०.०१	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०.०३	०.३५
२.२.२.३.८	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.१९	२.३१	०	०.०१	०.१८	०	०	०	०	०	०	०	०.१७	२.१३
२.२.२.३.९	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	०	०.१६	१.९८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.१६	१.९८
२.२.२.४.०	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.१३	१.६३	०	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.०८	१.०३
२.२.३.३.३	अन्य इन्धन (ग्यास सहित) कार्यालय प्रयोजन	२२२१४	पटक	०	०.०५	०.६	०	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२.६	LACC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.४९	६	०	०.०१	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०.४८	५.९
१.२.४.२.७	दरबन्दी समितिको बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.०४	०.५	०	०.०१	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०.०३	०.३५
१.२.४.२.८	मृत्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	०	०.१८	२.२५	०	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.१७	२.०१
१.२.४.२.९	Provincial project steering committee meeting	२२५२२	पटक	०	०.१५	१.८	०	०.०१	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०.१४	१.७
१.२.४.३.०	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.२२	२.७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.२२	२.७
१.२.४.३.१	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	०	०.१६	२	०	०.०१	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०.१५	१.८५
२.३.१.३.९	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.११	१.४	०	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.१	१.१६
२.३.१.४.०	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.२५	३	०	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.२	२.४
२.३.२.२.८	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	०	०.१३	१.६	०	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.११	१.३६
२.४.१.२.९	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	०	०.३३	४	०	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.२८	३.४
२.४.१.३.०	आयोजनाका स्किमहरूको फारमहरू छपाई	२२३१५	पटक	०	०.०४	०.५	०	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.०२	०.२६
२.४.१.४.९	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	०	०.०८	१	०	०.०३	०.४२	०	०	०.०६	०	०	०	०	०.०४	०.५२
२.४.१.४.१०	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	०	०.२५	३	०	०.०३	०.४२	०	०	०.०६	०	०	०	०	०.२१	२.५२
२.६.६.३.०१	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा तथा सम्बन्ध गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०८	१	०	०.०१	०.१८	०	०	०	०	०	०	०	०.०७	०.८२
२.७.१.२.०१	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	०	०.०७	०.८	०	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.०२	०.२
२.७.१.५.१६५	सरोकाबालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०८	१	०	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.०३	०.४
२.८.१.१.१२	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मृत्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.३९	४.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.३९	४.८

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	सर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिशत	भाग	बजेट	प्रतिशत	भाग	बजेट	प्रतिशत	भाग	बजेट	प्रतिशत	भाग	बजेट	प्रतिशत	भाग	बजेट
२.८.१.११३	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११ पटक	०	०.७९	९.६	०	०.०२	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.७७	९.३६
२.८.१.११४	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११ पटक	०	०.२५	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.२५	३
२.८.१.११५	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११ पटक	०	०.१६	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.१६	२
२.९.४.९	बीमा तथा नवीकरण	२२२१४ पटक	०	०.०४	०.५	०	०.०४	०.०४	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.८.७	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११ पटक	०	०.१५	१.८	०	०.०१	०.०१	०.१८	०	०	०	०	०	०	०	०.१३	१.६२
२.९.९.१७	अन्य विविध खर्च	२२७११ पटक	०	०.१५	१.८	०	०.०१	०.०१	०.१८	०	०	०	०	०	०	०	०.१३	१.६२
२.९.९.१८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११ पटक	०	०.३९	४.८	०	०.०२	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.३७	४.५६
२.९.९.१९	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२७११ पटक	०	०.२	२.४	०	०.०५	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.१५	१.८
४	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)				९९०.४३				१.३६			०.१८			०.१२			९८८.७७
२.५.२.५०	इन्जिनियरिङ सेवा करार	२२४११ पटक	०	०.१६	२	०	०.०२	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.१४	१.७६
२.७.१५.१६२२	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२ पटक	०	०.३	३.६	०	०.०१	०.०१	०.०७	०	०	०	०	०	०	०	०.२९	३.५३
२.७.१५.१६२१	Lead farmers मार्फत थोपा सिंचाइ प्रदर्शन	२२५२२ पटक	०	०.१	१.२	०	०.०१	०.०१	०.०७	०	०	०	०	०	०	०	०.०९	१.१३
२.७.१५.१६२९	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२ पटक	०	०.२५	३	०	०.०१	०.०१	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०.२३	२.८५
२.७.१५.१६३५	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५१२ पटक	०	०.४१	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.४१	५
२.७.१५.१६३०	फार्म केन्द्रको फलफूल बलकमा प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२ पटक	०	०.४१	५	०	०.०२	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.३९	४.७६
२.७.१५.१६४७	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२ पटक	०	०.३३	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.३३	४
२.७.१५.१६५८	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२ पटक	०	०.५३	६.४	०	०.०१	०.०१	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०.५२	६.३
२.७.१५.१६६८	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५११ पटक	०	०.२५	३	०	०.०१	०.०१	०.०७	०	०	०	०	०	०	०	०.२४	२.९३

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिशत	भाग	बाले	प्रतिशत	भाग	बाले	प्रतिशत	भाग	बाले	प्रतिशत	भाग	बाले	प्रतिशत	भाग	बाले
२.७.१५.१६६७	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	०	०.५३	६.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.५३	६.५
२.७.१५.१६६०	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	०	१.९७	२४	०	०	०.०६	०	०	०.०६	०	०	०	०	१.९६	२३.८८
२.७.१५.१६६९	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३	पटक	०	६५.६७	७९९.९१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	६५.६७	७९९.९१
२.७.१५.१६७१	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता कगरमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११	पटक	०	१०.२५	१२४.८२	०	०.०१	०.१२	०	०.०१	०.१२	०	०.०१	०.१२	०	१०.२२	१२४.४६
२.७.१५.१६७०	कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई विरवा हुकाएँ बापतको प्रोत्साहन अनुदान	२६४१३	पटक	०	०.१६	२	०	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.१४	१.७६
३	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					१५			०.३९			०			०			१४.६१
२.७.१५.१६२४	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५११	पटक	०	०.५७	७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.५७	७
२.७.१५.१६४३	निजी नर्सरीहरूलाई फलफूल विरवाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५१२	पटक	०	०.२५	३	०	०.०२	०.२४	०	०	०	०	०	०	०	०.२३	२.७६
२.७.१५.१६६४	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५११	पटक	०	०.४१	५	०	०.०१	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०.४	४.८५
१	पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)					५.५			१.६८			०			०			३.८२
२.७.१५.१६४६	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किम ३, स्किम ४ र स्किम ५ सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	०	०.२१	२.५	०	०.०५	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.१६	१.९
२.७.१५.१६६६	मूल्य शृङ्खलाका सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास तालिम	२२५१२	पटक	०	०.२५	३	०	०.०९	१.०८	०	०	०	०	०	०	०	०.१६	१.९२
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				०	८८.९१	१०८३	०	०.९७	१२.९४	०	०.०१	०.३	०	०.०१	०.१२	०	८७.८५	१०७०.४४
कूल जम्मा खर्च				०	९९.९९	१२१८	०	१.०३	१२.९८	०	०.०१	०.४२	०	०.०१	०.१२	०	९८.८५	१२०४.४८

२.४.४ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक	
				मा	कुल	मा	कुल	मा	कुल	मा	कुल		
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)				२५५		०.१५			०			२५४.८५
११.४.२.२.८८	फार्म पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (Hi-Tech नर्सरी, स्कीन हाउस)	३११५९	पटक	०	२.९	०	०	०	०	०	०	२.९	९५
११.४.२.२.८९	फार्म पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (पबुलिन, बारबन्देज तथा निकास निर्माण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता	३११५९	पटक	०	४.८९	०	०.१५	०	०	०	०	४.८८	१५९.८५
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				०	७.७९	०	०.३५	०	०	०	०	७.७८	२५४.८५
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
३	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)				१५७.४६		२.०५			०			१५५.४१
२.१.४.३	पानी तथा बिजुली	२२१११	पटक	०	०.०४	०	०.१५	०	०	०	०	०.०३	१.०५
२.१.६.८	सञ्चार महसुल	२२११२	पटक	०	०.०२	०	०.१	०	०	०	०	०.०२	०.५
२.१.७.८	इन्टरनेट महसुल	२२११२	पटक	०	०.०२	०	०	०	०	०	०	०.०२	०.५
२.२.२.२६	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.०५	०	०.०५	०	०	०	०	०.०५	१.५८
२.२.२.२७	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.२	०	०	०	०	०	०	०.२	६.४८
२.२.२.२८	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	०	०.०६	०	०	०	०	०	०	०.०६	१.९५
२.२.३.१२	अन्य इन्धन (रयास सहित) कार्यालय प्रयोजन	२२३१४	पटक	०	०.०२	०	०.१	०	०	०	०	०.०२	०.५
१.२.४.३८	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	०	०.०५	०	०.०५	०	०	०	०	०.०४	१.४५
१.२.४.३९	दरबन्दी समितिको बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.०२	०	०	०	०	०	०	०.०२	०.५
१.२.४.४०	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	०	०.१२	०	०.०५	०	०	०	०	०.१२	३.९५
१.२.४.४१	Provincial project steering committee meeting	२११३४	पटक	०	०.०५	०	०.१	०	०	०	०	०.०५	१.७
१.२.४.४२	LLCC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.७८	०	०	०	०	०	०	०.७८	२५.५
२.३.१.२५	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.०९	०	०	०	०	०	०	०.०९	३
२.३.१.२६	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.०४	०	०.१५	०	०	०	०	०.०४	१.२५
२.३.२.२५	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	०	०.०५	०	०.१	०	०	०	०	०.०५	१.५
२.४.१.२५	आयोजनाका स्किमहरूको फारमहरू छुपाई	२२३१५	पटक	०	०.०४	०	०.१	०	०	०	०	०.०३	१.१
२.४.१.२६	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	०	०.२	०	०.१	०	०	०	०	०.२	६.५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिमा	भान	बलु	प्रतिमा	भान	बलु	प्रतिमा	भान	बलु	प्रतिमा	भान	बलु			
२.४.१४.१०	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	०	०.०३	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१
२.४.१४.११	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	०	०.०९	३	०	०	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०	२.९
२.६.६.११६	प्रेरशस्त्रीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा समन्वय गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०३	१	०	०	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०	०.९
२.७.१५.१४८१	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.३२	१०.५	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	०	०	१०.४५
२.७.१५.१४८०	सरोकावालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०६	२	०	०	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०	१.९
२.८.१.७३	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.१५	४.८	०	०	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०	४.७
२.८.१.७४	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	१.२५	४०.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४०.८
२.८.१.७५	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक पुष्टोपणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	०	०.१५	५	०	०	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०	४.८५
२.८.१.७६	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.४२	१३.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१३.६
२.८.२.११	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	०	०.०२	०.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.८
२.९.४.३	बीमा तथा नवीकरण	२२२१४	पटक	०	०.०२	०.५	०	०	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०.३५
२.९.८.३	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	०	०.०५	१.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१.८
२.९.९.२१	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	०	०.२६	८.४	०	०	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०	८.३
२.९.९.२२	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	०	०.०५	१.८	०	०	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०	१.६५
२.९.९.२३	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	०	०.०७	२.४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२.४
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					४०.२५			०.४८									३९.७७
२.५.२.४२	PCR/ELISA Test को लागि विज्ञ सेवा करारमा लिने (Bio Technologists/ Molecular Biologists)	२२४११	पटक	०	०.१६	५.२५	०	०	०.०८	०	०	०	०	०	०	०	०	५.१७
२.७.१५.१४४९	व्यावसायिक सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा तथा नर्सरीमा रोग कीराहरूको परीक्षण (Citrus Greening Disease/HLB, Citrus psylla लगायत) र व्यवस्थापन सिफारिस	२२५२२	पटक	०	०.१८	६	०	०	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०	५.८५
२.७.१५.१४५७	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५११	पटक	०	०.१५	५	०	०	०.१	०	०	०	०	०	०	०	०	४.९
२.७.१५.१४६१	निजी नर्सरीहरूलाई फलफूल बिरुवाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५१२	पटक	०	०.०९	३	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	०	०	२.९५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक	
				रु०	प्रतिशत	रु०	प्रतिशत	रु०	प्रतिशत	रु०	प्रतिशत	रु०	प्रतिशत
२.७.१५.१४७८	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५११ पटक	०.६४	२१	०	०.१	०	०	०	०	०	०.६४	२०.९
४	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)			२८११.२९		०.९५	०						२८१०.३४
२.५.२.४३	इन्जिनियरिङ सेवा करार	२२४११ पटक	०.०६	२	०	०.१	०	०	०	०	०	०.०६	१.९
२.७.१५.१४७७	कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई विरवा हुकाए बापतको प्रोत्साहन अनुदान	२६४१३ पटक	०.१५	५	०	०.०५	०	०	०	०	०	०.१५	४.९५
२.७.१५.१४४२	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११ पटक	०.७.६९	५७९.११	०	०.१	०	०	०	०	०	१७.६९	५७९.०१
२.७.१५.१४४५	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२ पटक	०.१५	५	०	०.१५	०	०	०	०	०	०.१५	४.८५
२.७.१५.१४४८	आयोजनाका लाभप्राप्तीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२ पटक	०.४७	१५.३	०	०	०	०	०	०	०	०.४७	१५.३
२.७.१५.१४४९	आयोजना लागू हुने Batch ३ का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२ पटक	०.४६	१५.२	०	०.१	०	०	०	०	०	०.४६	१५.१
२.७.१५.१४४४	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२ पटक	३.१२	१०२	०	०.१	०	०	०	०	०	३.११	१०१.९
२.७.१५.१४६२	Lead farmers मार्फत थोपा सिंचाइ प्रदर्शन	२२५२२ पटक	०.१६	५.१	०	०.१	०	०	०	०	०	०.१५	५
२.७.१५.१४६३	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२६४१३ पटक	६१.०९	१९९९.५८	०	०	०	०	०	०	०	६१.०९	१९९९.५८
२.७.१५.१४७१	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५११ पटक	०.१८	६	०	०	०	०	०	०	०	०.१८	६
२.७.१५.१४८२	आयोजनाका सम्भावित लाभप्राप्तीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२ पटक	०.२९	९.५	०	०	०	०	०	०	०	०.२९	९.५
२.७.१५.१४८४	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५१२ पटक	०.६	१९.५	०	०.१	०	०	०	०	०	०.५९	१९.४
२.७.१५.१४८५	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५१२ पटक	०.४६	१५	०	०.१	०	०	०	०	०	०.४६	१४.९
२.७.१५.१४८३	Lead Farmers लाई बौद्धिक व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२ पटक	१.०१	३३	०	०.०५	०	०	०	०	०	१.०१	३२.९५
५	पहाडी क्षेत्रका वागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)			९		०.२	०						८.८
२.७.१५.१४४१	मूल्य शृङ्खलाका सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास तालिम	२२५१२ पटक	०.१२	४	०	०.१	०	०	०	०	०	०.१२	३.९
२.७.१५.१४६७	आयोजनाका सम्भावित लाभप्राप्तीहरूको लागि आयोजनाका स्किम ३, स्किम ४ र स्किम ५ सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२ पटक	०.१५	५	०	०.१	०	०	०	०	०	०.१५	४.९
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			०	१२.२	३०४८	०	३.६८	०	०	०	०	१२.१९	३०१५.३२
कूल जम्मा खर्च			०	११.९९	३२०३	०	३.८३	०	०	०	०	११.८९	३२६९.१०

२.४.५ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश

क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक	
				रकम	शुद्ध	रकम	शुद्ध	रकम	शुद्ध	रकम	शुद्ध		
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
८	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)				११५.७५			५.६४					११०.११
२.१.४.६	पानी तथा विजुली	२२१११	पटक	०	०.०९			०	०.०१	०	०	०	०.०९
२.१.६.१४	सञ्चार महसुल	२२११२	पटक	०	०.०६			१	०	०.०१	०	०	०.०५
२.१.७.१५	इन्टरनेट महसुल	२२११२	पटक	०	०.०५			०.८	०	०.०५	०	०	०.७५
२.२.२.३८	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.३७			६.०१	०	०.०१	०	०	५.८९
२.२.२.४२	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	०	०.१			१.६३	०	०	०	०	१.६३
२.२.२.४३	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	०	०.१२			१.९५	०	०.०३	०	०	१.४५
२.२.३.१९	अन्य इन्धन (ग्याससहित) कार्यालय प्रयोजन	२२३१४	पटक	०	०.०७			१.०६	०	०.०२	०	०	०.६६
१.२.४.४१	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२२५१२	पटक	०	०.०९			१.५	०	०	०	०	१.५
१.२.४.४३	दूरबन्दी समितिको बैठक सञ्चालन	२२५१२	पटक	०	०.०३			०.५	०	०.०२	०	०	०.१
१.२.४.४५	Provincial project steering committee meeting	२२५१२	पटक	०	०.११			१.८	०	०.०१	०	०	१.६८
१.२.४.४६	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२२५१२	पटक	०	०.१५			२.४	०	०.०५	०	०	२.३५
१.२.४.४७	LACC को बैठक सञ्चालन	२२५१२	पटक	०	०.९३			१५	०	०.०३	०	०	१४.५
२.३.१.२७	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१२	पटक	०	०.०८			१.२४	०	०.०५	०	०	१.१९
२.३.१.२७	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.०१			०.१६	०	०.०५	०	०	०.११
२.३.१.२८	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१२	पटक	०	०.१६			२.६६	०	०.०१	०	०	२.५४
२.३.१.२८	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.०२			०.३४	०	०.०५	०	०	०.२९
२.३.२.२८	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	०	०.१			१.६	०	०.०१	०	०	१.४८
२.४.१.१६	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	०	०.४१			६.६	०	०	०.०५	०	६.५५
२.४.१.१८	आयोजनाका स्किमहरूको फारमहरू छुपाई	२२३१५	पटक	०	०.०६			१	०	०.०१	०	०	०.८८
२.४.१.४.१९	खरिद तथा अनुदानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	०	०.१९			३	०	०.०१	०	०	२.८८
२.४.१.४.२०	आयोजनासम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३१५	पटक	०	०.०६			१	०	०.०१	०	०	०.८३
२.६.६.२१०	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा तथा समन्वय गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०६			१	०	०	०	०	०.९५
२.७.१.३६	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	०	०.०३			०.५	०	०.०१	०	०	०.३८

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिशत	शुभ	दुःख	प्रतिशत	शुभ	दुःख	प्रतिशत	शुभ	दुःख	प्रतिशत	शुभ	दुःख	प्रतिशत	शुभ	दुःख
२.७.१५.३४०५	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२२५१२	पटक	०	०.३९	६.३	०	०.०२	०.२५	०	०	०	०	०	०	०.३८	०	६.०५
२.७.१५.३४०३	सरोकाबालाहरुसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.१२	२	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	०.१२	०	१.९५
२.८.१.६३	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	०	०.२८	४.५	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०.२५	०	४
२.८.१.६४	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.२२	३.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.२२	०	३.६
२.८.१.६६	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	१.४९	२४	०	०.०१	०.१२	०	०	०	०	०	०	१.४८	०	२३.८८
२.८.१.६८	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.५	८	०	०.०२	०.२५	०	०	०	०	०	०	०.४८	०	७.७५
२.९.४.३	बीमा तथा नवीकरण	२२२१४	पटक	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.८.११	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	०	०.११	१.८	०	०.०१	०.१७	०	०	०	०	०	०	०.१	०	१.६३
२.९.९.२६	मासिक मिडिट तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	०	०.१५	२.४	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	०.१५	०	२.३५
२.९.९.२७	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	०	०.११	१.८	०	०.०२	०.२५	०	०	०	०	०	०	०.१	०	१.५५
२.९.९.२९	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	०	०.४१	६.६	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	०.४१	०	६.५५
९	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)					१४६६.७५			३.४८			०						१४६३.२७
२.५.२.५१	इन्जिनियरिङ सेवा करार	२२४११	पटक	०	०.१२	२	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	०.१२	०	१.९५
२.७.१५.३३८३	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२४११	पटक	०	१३.९४	२२४.८९	०	०.०२	०.४	०	०	०	०	०	०	१३.९२	०	२२४.४९
२.७.१५.३३८२	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	०	०.५६	९	०	०.०१	०.१७	०	०	०	०	०	०	०.५५	०	८.८३
२.७.१५.३३८९	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरतासमेत)	२२५२२	पटक	०	६८.२१	११००.१६	०	०.०१	०.१२	०	०	०	०	०	०	६८.२	०	११००.०४

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिशत	आर	वृद्धि	प्रतिशत	आर	वृद्धि	प्रतिशत	आर	वृद्धि	प्रतिशत	आर	वृद्धि	प्रतिशत	आर	वृद्धि
२.७.१५.३४०६	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५१२	पटक	०	०.६२	१०	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०.५९	९.५	
२.७.१५.३४०७	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५१२	पटक	०	०.३७	६	०	०.०२	०.२५	०	०	०	०	०	०	०.३६	५.७५	
२.७.१५.३४१४	आयोजना लागू हुने स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.४५	७.२	०	०.०२	०.४	०	०	०	०	०	०	०.४२	६.८	
२.७.१५.३४१५	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	०	०.२८	४.५	०	०.०१	०.१७	०	०	०	०	०	०	०.२७	४.३३	
२.७.१५.३४२८	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५१२	पटक	०	०.३७	६	०	०.०२	०.२५	०	०	०	०	०	०	०.३६	५.७५	
२.७.१५.३४२९	कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई विरुवा हुर्काएर बापतको प्रोत्साहन अनुदान	२२५२२	पटक	०	०.१२	२	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०.०९	१.५	
२.७.१५.३४३०	Lead Farmer हरूलाई लक्षित वालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५१२	पटक	०	०.८७	१४	०	०.०१	०.१२	०	०	०	०	०	०	०.८६	१३.८८	
२.७.१५.३४४४	Lead farmers मार्फत थोपा सिंचाइ प्रदर्शन	२२५२२	पटक	०	०.१९	३	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०.१५	२.५	
२.७.१५.३४४३	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	०	१.१२	१८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१.१२	१८	
२.७.१५.३४४२	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	०	३.७२	६०	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	३.७२	५९.९५	
१०	पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)					८.५			०.६२			०					७.८८	
२.७.१५.३३८८	मूल्य शृङ्खलाका सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास तालिम	२२५१२	पटक	०	०.२५	४	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०.२२	३.५	
२.७.१५.३४२७	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किम ३, स्किम ४ र स्किम ५ सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	०	०.२८	४.५	०	०.०१	०.१२	०	०	०	०	०	०	०.२७	४.३८	
७	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					२२			०.५५			०					२१.४५	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमित	भार	वृद्धि	परिमित	भार	वृद्धि	परिमित	भार	वृद्धि	परिमित	भार	वृद्धि	परिमित	भार	वृद्धि
२.७.१५.३३९२	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित वालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५१२	पटक	०	०.८७	१४	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०.८४	१३.५	
२.७.१५.३४०४	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५१२	पटक	०	०.३१	५	०	०	०.०५	०	०	०	०	०	०	०.३१	४.५	
२.७.१५.३४२०	निजी नर्सरीहरूलाई फलफूल विरुवाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५१२	पटक	०	०.१९	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.१९	३	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				०	१००	१६१३	०	०.६२	१०.२९	०	०	०	०	०	०	११.४१	१६.०२.७१	
कुल जम्मा खर्च				०	१००	१६१३	०	०.६२	१०.२९	०	०	०	०	०	०	११.४१	१६.०२.७१	

२.४.६ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमित	भार	वर्गे	परिमित	भार	वर्गे	परिमित	भार	वर्गे	परिमित	भार	वर्गे	परिमित	भार	वर्गे
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
३	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					२४५												
११.४.२.२.३०४	सुब्बा फलफूल विकास केन्द्र, बेतडीको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (hi tech नर्सरी,calling घर निर्माण, हेल्स्टोन नेट)	३११५९	पटक	०	७.५७	१२०	०	०	०	०	१.५८	२५	०	४.१	६५	०	१.८९	३०
	सुब्बा फलफूल विकास केन्द्र, बेतडीको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (घर निर्माण, वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माण, निकास प्रणाली निर्माण, गरा सुधार तथा पालेघर निर्माण) (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	०	७.८९	१२५	०	०	०	०	१.८९	३०	०	४.४२	७०	०	१.५८	२५
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		
११.४.२.२.३०५																		

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिमा	दिने	प्रतिमा	प्रतिमा	दिने	प्रतिमा	दिने	प्रतिमा	दिने	प्रतिमा	दिने	प्रतिमा	दिने	प्रतिमा	दिने
अ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					१०१.२६			२६.१८			२७.९२			२३.५२			२३.६४
२.१.४.४	पानी तथा बिजुली	२२१११	पटक	०	०.०८	१.२	०	०.०२	०.३	०	०.०२	०.३	०	०.०२	०.३	०	०.०२	०.३
२.१.६.१२	सञ्चार महसुल	२२११२	पटक	०	०.०४	०.६	०	०.०१	०.१५	०	०.०१	०.१५	०	०.०१	०.१५	०	०.०१	०.१५
२.१.७.५	इन्टरनेट महसुल	२२११२	पटक	०	०.०३	०.५	०	०.०१	०.१३	०	०.०१	०.१२	०	०.०१	०.१२	०	०.०१	०.१३
२.२.२.२६	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१	०.१	१.६३	०	०.०३	०.४१	०	०.०३	०.४	०	०.०३	०.४	०	०.०३	०.४२
२.२.२.२८	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२२२१२	पटक	१	०.३४	५.३८	१	०.०९	१.३५	०	०.०८	१.३	०	०.०८	१.३	०	०.०९	१.४३
२.२.२.३०	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	पटक	१	०.१२	१.९५	१	०.०३	०.४९	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.४६
२.२.३.२०	अन्य इन्धन (ग्याससहित) कार्यलय प्रयोजन	२२३१४	पटक	०	०.०४	०.६	०	०.०१	०.१५	०	०.०१	०.१५	०	०.०१	०.१५	०	०.०१	०.१५
१.२.४.३१	दरबन्दी समितिको बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.३३	मुल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	०	०.०९	१.५	०	०.०३	०.५	०	०.०५	०.८	०	०.०१	०.२	०	०	०
१.२.४.३४	प्रदेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	०	०.२८	४.४	०	०.०६	१	०	०.०९	१.४	०	०.०६	१	०	०.०६	१
१.२.४.३८	LACC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	०	०.७६	१२	०	०.१९	३	०	०.१९	३	०	०.१९	३	०	०.१९	३
१.२.४.३९	Provincial project steering committee meeting	२११३४	पटक	०	०.११	१.८	०	०	०	०	०.०६	०.९	०	०.०६	०.९	०	०	०
२.३.१.२२	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.१९	३	०	०.०५	०.७५	०	०.०५	०.७५	०	०.०५	०.७५	०	०.०५	०.७५
२.३.१.२५	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०.०९	१.४	०	०.०२	०.३५	०	०.०२	०.३५	०	०.०२	०.३५	०	०.०२	०.३५
२.३.२.१९	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	०	०.१	१.६	०	०.०३	०.४	०	०.०३	०.४	०	०.०३	०.४	०	०.०३	०.४
२.४.१.३४	आयोजनाका स्किमहरूको फारमहरू छपाई	२२३११	पटक	०	०.०५	०.८	०	०.०१	०.२	०	०.०१	०.२	०	०.०१	०.२	०	०.०१	०.२
२.४.१.३५	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	०	०.४	६.३	०	०.०९	१.५	०	०.०९	१.५	०	०.०९	१.५	०	०.११	१.८
२.४.१.४.१२	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३११	पटक	०	०.१९	३	०	०.०६	१	०	०.१३	२	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.१३	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२२३११	पटक	०	०.०६	१	०	०.०१	०.२	०	०.०२	०.२५	०	०.०२	०.२५	०	०.०२	०.३

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वयं शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमाण	आर	बचत	परिमाण	आर	बचत	परिमाण	आर	बचत	परिमाण	आर	बचत	परिमाण	आर	बचत
२.६.६.१७८	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा तथा समन्वय गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०.०६	१	०	०.०१	०.२	०	०.०२	०.२५	०	०.०२	०.२५	०	०.०२	०.३
२.७.१.२७	भ्रमण खर्च	२२५२१	पटक	०	०.०५	०.८	०	०.०४	०.६	०	०	०	०	०	०	०	०.०१	०.२
२.७.१५.५२३०	सरोकावालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तर्क्रिया गोष्ठी	२२५२२	पटक	०	०.०६	१	०	०.०४	०.६	०	०.०३	०.४	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५२३३	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	०	०.३२	५.१	०	०.०७	१.१	०	०.१३	२	०	०.०६	१	०	०.०६	१
२.८.१.३९	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्किम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	१.२१	१९.२	०	०.३	४.८	०	०.३	४.८	०	०.३	४.८	०	०.३	४.८
२.८.१.४०	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.२३	३.६	०	०.०६	०.९	०	०.०६	०.९	०	०.०६	०.९	०	०.०६	०.९
२.८.१.४२	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२२६११	पटक	०	०.१६	२.५	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०.०६	१
२.८.१.४३	स्किम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	०	०.४	६.४	०	०.१	१.६	०	०.१	१.६	०	०.१	१.६	०	०.१	१.६
२.९.४.३	जीमा तथा नवीकरण	२२२१४	पटक	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.८.८	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	०	०.११	१.८	०	०.०३	०.४५	०	०.०३	०.४५	०	०.०३	०.४५	०	०.०३	०.४५
२.९.९.३०	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	०	०.११	१.८	०	०.०३	०.४५	०	०.०३	०.४५	०	०.०३	०.४५	०	०.०३	०.४५
२.९.९.३२	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२७११	पटक	०	०.१५	२.४	०	०.०४	०.६	०	०.०४	०.६	०	०.०४	०.६	०	०.०४	०.६
२.९.९.३३	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२२७११	पटक	०	०.३८	६	०	०.०९	१.५	०	०.०९	१.५	०	०.०९	१.५	०	०.०९	१.५
२	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)					१२१०.२४			२४२.६४			२९९.०९			४५९.८४			२०८.६७

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वयं शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				पतिमा	आ	बाली	पतिमा	आ	बाली	पतिमा	आ	बाली	पतिमा	आ	बाली	पतिमा	आ	बाली
२.५.२.५०	इन्जिनियरिङ सेवा करार	२२४११	पटक	०	०.१३	२	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५	०	०.०३	०.५
२.७.१५.५१९४	आयोजना लागु हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्याधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२२५२२	पटक	०	०.३८	६	०	०	०	०	०.३८	६	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५१९३	कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई विरुवा हुर्काए बापतको प्रोत्साहन अनुदान	२२५२२	पटक	०	०.०९	१.५	०	०	०	०	०.०३	०.५	०	०.०६	१	०	०	०
२.७.१५.५२०३	Lead Farmers लाई बाँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२२५२२	पटक	०	०.९५	१५	०	०.६३	१०	०	०.३२	५	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५२०४	Lead farmers मार्फत थोपा सिँचाइ प्रदर्शन	२२५२२	पटक	०	०.१५	२.४	०	०.०६	१	०	०.०९	१.४	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५२०५	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२२५२२	पटक	०	३.०३	४८	०	०.७६	१२	०	०.७६	१२	०	०.७६	१२	०	०.७६	१२
२.७.१५.५२१७	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरता समेत)	२२५२२	पटक	०	५६.७७	८९९.८१	०	९.४६	१५०	०	१२.६२	२००	०	२५.२४	४००	०	९.४५	१४९.८१
२.७.१५.५२१६	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२२५२२	पटक	०	०.४५	७.२	०	०.२३	३.६	०	०.२३	३.६	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५२१२	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२५२२	पटक	०	०.३८	६	०	०.१३	२	०	०.२५	४	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५२२८	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२२५२२	पटक	०	०.६२	९.७५	०	०.२५	४	०	०.३६	५.७५	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५२२४	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२२५२२	पटक	०	११.७	१८५.३८	०	२.९२	४६.३४	०	२.९२	४६.३४	०	२.९२	४६.३४	०	२.९२	४६.३६
२.७.१५.५२२९	आयोजना लागु हुने Batch ३ का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५२२	पटक	०	०.४	६.४	०	०.२	३.२	०	०.२	३.२	०	०	०	०	०	०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				परिमण	आर	बचत	परिमण	आर	बचत	परिमण	आर	बचत	परिमण	आर	बचत	परिमण	आर	बचत
२.७.१५.५.२२५	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२२५२२	पटक	०	०.५	८	०	०.२५	४	०	०.२५	४	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५.२३२	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५२२	पटक	०	०.८१	१२.८	०	०.३८	६	०	०.४३	६.८	०	०	०	०	०	०
१	पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)					६.५			३			३.५			०			०
२.७.१५.५.१९५	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्किम ३, स्किम ४ र स्किम ५ सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५२२	पटक	०	०.१६	२.५	०	०.०६	१	०	०.०९	१.५	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५.२०६	मूल्य श्रृंखलाका सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास तालिम	२२५२२	पटक	०	०.२५	४	०	०.१३	२	०	०.१३	२	०	०	०	०	०	०
३	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					२२			१०			१२			०			०
२.७.१५.५.२०२	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५२२	पटक	०	०.३२	५	०	०.१९	३	०	०.१३	२	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५.२२७	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित वालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२२५२२	पटक	०	०.८८	१४	०	०.२५	४	०	०.६३	१०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.५.२४०	निजी नर्सरीहरूलाई फलफूल विरुवाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५२२	पटक	०	०.१९	३	०	०.१९	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				३	८४.५३	१३४०	२	१७.७७	२८१.८२	०	२१.६४	३४२.५१	०	३०.५	४८३.३६	०	१४.६५	२३२.३१
कुल जम्मा खर्च				३	११.११	१५८५	२	१७.७७	२८१.८२	०	२५.११	३१७.५१	०	३१.०२	६१८.३६	०	१८.१२	२८७.३१

२.४.७ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्


क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिमास	भार	वर्गीकृत	प्रतिमास	भार	वर्गीकृत	प्रतिमास	भार	वर्गीकृत	प्रतिमास	भार	वर्गीकृत			
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
१	कम्पेन्ट नभएको					०.४६			०.४६			०			०			०
११.३.२२.१३५६	इ-हाजिरी मेसिन खरिद तथा जडान	३११२२	सङ्ख्या	१	०.०९	०.४६	१	०.०९	०.४६	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					३.९३			९०			१.८०			१.२२.५			०.५
११.४.२.२.११०४	बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मोलेपटन तथा कृ. अ.ति. लुम्बेमा केन्द्रमा mother plant stock house निर्माण १/१ बटा र ल्याब सुधार १/१ बटा (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१	३०.६८	१६५.५	१	९.२७	५०	०	१२.९८	७०	०	८.३४	४५	०	०.०९	०.५
११.४.२.२.११०५	बा.अ.के. राजिकोटमा १ र बा.अ.के. दैलेखमा १ बटा स्कीन हाउस निर्माण (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१	२०.४९	११०.५	१	३.७१	२०	०	११.१२	६०	०	५.६५	३०.५	०	०	०
११.४.२.२.११०६	रा. सु.अ. का., पारिपाले भौतिक पूर्वाधारहरूको पूँजीगत विकास (हाईटेक नर्सरी निर्माण १, सेड हाउस निर्माण १, गलाहाउस सुधार १, प्याबोली ल्याब सुधार १, जेनेटर घर निर्माण १) (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१	२१.६९	११७	१	३.७१	२०	०	९.२७	५०	०	८.७१	४७	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा																		
				४	७२.९५	३९३.४६	४	१६.७८	१०.५६	०	३३.३७	१८०	०	२२.७	१२२.५	०	०.०९	०.५
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					८२.६१			१४.१			३६.१			१९.०८			१३.३३
१.२.४.५८८	अनुसन्धान क्षेत्रहरूको प्राप्ति समीक्षा गर्ने प्राविधिकहरूको बैठक	२११३४	पटक	४	०.२	१.०८	१	०.०६	०.३	१	०.०६	०.३	१	०.०६	०.३	१	०.०३	०.१८
२.५.२.६२४	बायोटेक्नोलोजिस्ट करार सेवा	२२४११	जना	१	०.९७	५.२५	१	०.२४	१.३	०	०.२४	१.३	०	०.२४	१.३	०	०.२५	१.३५
२.५.२.६९९	प्राविधिक अधिकृत करारमा लिने (Horticulturalist)	२२४११	पटक	४	३.८९	२०.९८	४	०.९७	५.२५	०	०.९७	५.२५	०	०.९७	५.२३	०	०.९७	५.२५
२.७.२.८५३	लक्षित फलफूल वालीका विस्वाहरूको रोगकीरा परीक्षणको लागि रसायन तथा अन्य सामग्री खरिद	२२५२१	पटक	१	१.३	७	०	०	०	१	१.३	७	०	०	०	०	०	०
२.७.३.५९२	Macademia Nut र Avocado मा वानस्पतिक प्रसारण प्रविधि विकास	२२५२१	पटक	१	०.३७	२	१	०.२८	१.५	०	०.०९	०.५	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिमा	आ	वोट	प्रतिमा	आ	वोट	प्रतिमा	आ	वोट	प्रतिमा	आ	वोट	प्रतिमा	आ	वोट
२.७.३.५१३	स्याउमा उच्च घनत्व विरुवा उत्पादन प्रविधि विकास (Feather branch production, nutrition and hormonal management, rootstock)	२२५२१	पटक	१	०.३७	२	०	०	०	१	०.३७	२	०	०	०	०	०	०
२.७.३.६८१	आयोजनामार्फत आयात हुने विभिन्न फलफूल बालीहरूको जातहरूको माउबोट व्यवस्थापन (सम्बन्धित केन्द्रहरूको लागि)	२२५२१	पटक	५	२.७४	१४.८	५	०.३७	२	०	०.१३	५	०	०.७४	४	०	०.७	३.८
२.७.३.६८३	ओखरको हार्टले र पैने जातका माउबोट बमोज्या स्थापना गर्ने (दिलेख)	२२५२१	पटक	१	०.५६	३	०	०	०	१	०.५६	३	०	०	०	०	०	०
२.७.३.६८४	आयोजना लभित बालीहरूको कलमी विरुवा उत्पादन (थप ५० हजार)	२२५२१	सङ्ख्या	५००००	१.६७	९	०	०.५६	३	५००००	०.५६	३	०	०.५६	३	०	०	०
२.७.३.६८७	किजीफलमा परागसेवन Hand pollination को फलको उत्पादकत्व तथा गुणस्तर उत्पादनमा हुने असर बारे अध्ययन गरी सो सम्बन्धी प्रविधि सिफारिस गर्ने (कु.अ.नि., जुम्ले)	२२५२१	पटक	१	०.३७	२	१	०	०	०	०.३७	२	०	०	०	०	०	०
२.७.३.६८८	HLB/CTV लगायतका रोगहरूको परीक्षणको लागि NPHRC, Khumaltar मा कार्य गर्ने गरी दक्ष जनशक्तिको ज्याला	२२५२१	पटक	१	०.५६	३	१	०.१४	०.७५	०	०.१४	०.७५	०	०.१४	०.७५	०	०.१४	०.७५
२.७.१.५.३७४६	सुन्तला तथा जुनारका मुख्य उत्पादन क्षेत्रहरूको स्थानीय जातहरूको Varietal characterization कार्यमा सहजीकरण गरी जात दर्ती कार्य अगाडि बढाउने गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.८३	४.५	०	०	०	१	०.३७	२	०	०.४६	२.५	०	०	०
२.७.१.५.३७४५	सुन्तला र कामतीमा विभिन्न स्टस्टक जातहरूको कलमी Performance अध्ययन गरी उपयुक्त स्टस्टक कलमीको सिफारिस गर्ने (रा.सु.अ.का., पारियाले)	२२५२२	पटक	१	०.३७	२	०	०	०	१	०.३७	२	०	०	०	०	०	०
२.७.१.५.३७४४	ओखरका varietal characterization तथा दुई जातहरूको परीक्षण गर्ने (वा.अ.के., जुम्ला)	२२५२२	सङ्ख्या	१	०.१९	१	०	०	०	१	०.१९	१	०	०	०	०	०	०
२.७.१.५.३७४७	आयोजना लभित फलफूल बालीहरूको Carbon Sequestration को लागि प्रोटोकल तयारी तथा सुन्तलाजात फलफूलको समुना अध्ययन	२२५२२	पटक	१	०.९३	५	०	०	०	१	०.१९	१	०	०.३७	२	०	०.३७	२
५	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					६३.३१			१८.३७			१४.१५			१५.३९			१५.४
१.१.१.३४०	PAU प्रमुखको तलब	२११११	जना	०	१.७१	९.२३	०	०.५३	२.८४	०	०.३९	२.१३	०	०.३९	२.१३	०	०.३९	२.१३
१.१.१.३४१	PAU मा काम गर्ने वैज्ञानिकको तलब	२११११	सङ्ख्या	०	१.४४	७.७९	१	०.४४	२.४	०	०.३३	१.८	०	०.३३	१.८	०	०.३३	१.७९
१.१.१.३४३	PAU मा काम गर्ने प्रशासन कर्मचारीको तलब	२११११	सङ्ख्या	०	१.२२	६.५८	१	०.३७	२.०२	०	०.२८	१.५२	०	०.२८	१.५२	०	०.२८	१.५२
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	४०	०.०९	०.४८	०	०.०२	०.१२	०	०.०२	०.१२	०	०.०२	०.१२	०	०.०२	०.१२
२.१.७.१	इमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२२११२	महिना	१	०.०७	०.४	०	०.०२	०.१	०	०.०२	०.१	०	०.०२	०.१	०	०.०२	०.१

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिमा	आ	वृत्ति	प्रतिमा	आ	वृत्ति	प्रतिमा	आ	वृत्ति	प्रतिमा	आ	वृत्ति	प्रतिमा	आ	वृत्ति
२.१.७.५.५	सञ्चार महसुल (टेलिफोन, इन्टरनेट)	२२११२	महिना	१	०.१८	०.९६	३	०.०४	०.२४	३	०.०४	०.२४	३	०.०४	०.२४	३	०.०४	०.२४
१.२.२.२	महँगौ भत्ता	२११३२	जना	३	०.१३	०.७२	०	०.०३	०.१८	०	०.०३	०.१८	०	०.०३	०.१८	०	०.०३	०.१८
२.२.२.२.५	अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीको इन्धन	२२२१२	लिटर्	९६०	०.३	१.६	२४०	०.०७	०.४	२४०	०.०७	०.४	२४०	०.०७	०.४	२४०	०.०७	०.४
२.२.२.२.९	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	लिटर्	८४०	०.२७	१.४७	२१०	०.०७	०.३६	२१०	०.०७	०.३६	२१०	०.०७	०.३६	२१०	०.०७	०.३६
२.२.२.४०३	दुई पाइ्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (आयोजनाका अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि समेत)	२२२१२	लिटर्	९६०	०.३२	१.७२	२४०	०.०७	०.४	२४०	०.०७	०.४	२४०	०.०७	०.४	२४०	०.०७	०.४
२.२.२.४०४	सवारी साधनका लागि मोबिल ग्रेक आयाल आदि	२२२१२	महिना	१००	०.१५	०.८	५	०.०४	०.२	०	०.०४	०.२	०	०.०४	०.२	०	०.०४	०.२
१.२.४.४८८	मालसामान तथा अन्य खरिदसम्बन्धी मुल्यांकन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	५	०.१२	०.६७	२	०.०६	०.३	३	०.०७	०.३७	०	०	०	०	०	०
१.२.४.४९९	करारमा पद पूर्ति गर्ने समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	५	०.१२	०.६७	५	०.१२	०.६७	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.३.१.२	ने.कृ.अ.प. का कर्मचारीको लागि पोशाक खर्च	२११२१	रु.	३	०.०६	०.३	०	०	०	०	०	०	०	०.०६	०.३	०	०	०
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	६	०.१९	१.०३	६	०.०६	०.३	०	०.०६	०.३	०	०.०६	०.३	०	०.०२	०.१३
२.३.१.११	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	बटा	१	०.२४	१.२८	१	०	०	०	०.०९	०.५	०	०.०९	०.५	०	०.०५	०.२८
२.३.२.१२६	मसिनरी औजार उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	१	०.४६	२.५	१	०.०९	०.५	०	०.०९	०.५	०	०.०९	०.५	०	०.१९	१
२.४.१.२४०	कार्यालय सञ्चालन खर्च (आयोजनाका अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि समेत)	२२३११	पटक	४	०.४७	२.५६	१	०.१४	०.७५	१	०.१४	०.७५	१	०.१४	०.७५	१	०.०६	०.३१
२.४.१.२२१०	कार्यालयको छपाई खर्च	२२३१५	महिना	४	०.०७	०.४	२	०.०४	०.२	०	०	०	२	०.०४	०.२	०	०	०
२.४.१४.८१	खरिद सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.०९	०.५	१	०.०९	०.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	३	०.०३	०.१५	३	०.०१	०.०४	०	०.०१	०.०३	०	०.०१	०.०४	०	०.०१	०.०४
२.७.३.४९९	ज्यामी ज्याला (सवारी चालक)	२२५२१	सङ्ख्या	१	०.४६	२.५	१	०.१३	०.७	०	०.११	०.६	०	०.११	०.६	०	०.११	०.६
२.७.३.६८०	कार्यालय सहयोगी ज्यामी ज्याला	२२५२१	सङ्ख्या	१	०.५	२.७	१	०.१४	०.७५	०	०.१४	०.७५	०	०.१४	०.७५	०	०.०८	०.४५
२.८.१.५६६	अनुसन्धान कार्य कार्यालयको लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	३०	२.२२	१२	१०	०.५६	३	५	०.३७	२	५	०.५६	३	१०	०.७४	४
२.८.१.६३०	अन्य प्रणालीगत तथा प्रविधिक प्रयोग खर्च	२२६११	पटक	५	०.४६	२.५	५	०.१९	१	०	०.०९	०.५	०	०.०९	०.५	०	०.०९	०.५
२.९.९.१८७	कार्यालयमा दैनिक चियापान, अतिथि सत्कार एवम् भैँसी आउने विविध खर्च	२२७११	पटक	१२	०.३३	१.८	०	०.०७	०.४	०	०.०७	०.४	०	०.०९	०.५	०	०.०९	०.५
का) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				५,३०,१३	२७.०२	१,५५,१३	७,१३	६.०२	३२.४७	५,०७,१०	९.३२	५०.२५	७,०२	६.३८	३५.४७	७,०५	५.२९	२८.७३
कुल जम्मा खर्च				५,३०,१५	१९.१७	५,३९,३८	७,५७	२२.८	१,२२,१३	५,०७,१०	१२.६८	२,३०,२५	७,०२	२१.०८	१,५६,१७	७,०५	५.२९	२९.२३



खण्ड-ग
तथ्याङ्कहरु

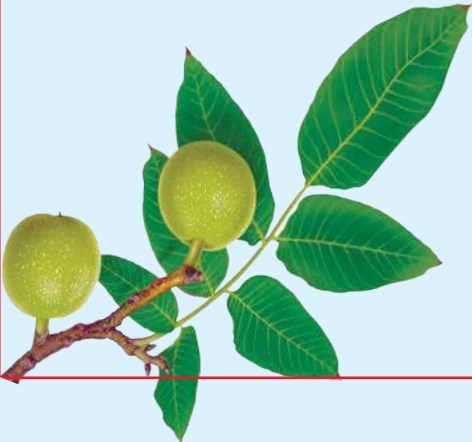

३.१ आ.व. २०८१/८२ को लागि उपलब्ध आयोजना लक्षित फलफूल बिरुवाको विवरण

फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ को परिच्छेद- ५ दफा १० (४) बमोजिम पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट नर्सरी सूचीकरणको लागि ५ वटै आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट ६५ वटा निजी नर्सरीहरूको आ.व. २०८१/८२ को एकमुष्ट सूचीकरण तपसिल बमोजिम गरिएको थियो।

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी

क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	आयोजना लक्षित फलफूल बिरुवाको विवरण												
					सुन्तला (स्थानीय)	(प्रति) मात्रा	कागती				मोटेर बिरुवाको	मोटा कान्ति	किब्री (हेबार्ड, एलिसन, बुनो, मोन्टी, रेड किब्री)	रङ्ग	पेसुल	हास	पेसुल
							१. आम्रकान्ति	२. आम्रकान्ति	३. आम्रकान्ति	४. आम्रकान्ति							
१	सिंहदेवी कृषि फर्म	धनकुटा न.पा.-१०	विपेन्द्र हमाल	९८४२११०६१०	८,०००			४,०००									६ महिने
२	रीतिका एग्रिकल्चर फर्म	महालक्ष्मी-२, धनकुटा	उमा पौडेल	९७६७३८७५७५								१,८००					हे बार्ड, मन्टि र एलिसन
३	इन्द्र फलफूल नर्सरी	धनकुटा न.पा.-१०	शोभा लिम्बु	९८२९३९४९६३	६,०००			२,५००				२,५००					कागती ६ महिने
४	कटुवाल निजी नर्सरी	धनकुटा न.पा.-३	राजु कटुवाल	९८०८७९४७५	१०,०००			२,५००	२,५००								कागती ६ महिने
५	निसान बिरुवा नर्सरी	धनकुटा न.पा.-७	पूर्ण कुमारी गुरागाई	९८२७३६०६३४	५,०००			२,८००	२,८००								कागती ६ महिने
६	हाम्रो धनकुटेली	धनकुटा न.पा.-३	भक्त मल्ल	९८५११२६९००	४,०००			१,२००								१,०००	एमोकाडो जात नखुलेको बिजु
७	विराट एग्रो तथा फलफूल नर्सरी	धनकुटा न.पा.-३	राम कुमार राई	९८४२०७००६५	१०,०००			२०,०००									PCR Test Negative, कागती ६ महिने
८	सिमिनी नर्सरी	धनकुटा-३	नगेन्द्र धिमरे	९८०१०५३१२२	२,५००			५००				५००				१,०००	एमोकाडो नयाँ र बिजु, जात नखुलेको
९	मल्ल एग्रो कृषि फर्म	धनकुटा-३	केशव मल्ल	९८२७०९३७४५	४,०००			१,२००				१,२००					कागती ६ महिने
१०	मार्ग देवी कृषि फर्म	धनकुटा-३	मिन बहादुर कार्की	९८४२०७०२३७	१,०००			५,०००				५,०००					कागती ६ महिने
११	पाथिभरा फलफूल नर्सरी	धनकुटा-१०	तारा बहादुर कार्की	९८४२३४४०८९	५,०००			५,०००									PCR Test Negative, नया बिरुवा ६ महिने

क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	आयोजना लक्षित फलफूल विरवाको विवरण											
					सुन्तला (स्थानीय)	जुनार (स्थानीय)	कामती				सुकाइतिया नर	कान्छी बोटामा	किचो (हिवाड, एलिसन, भुनो, मोन्टी, रेड किचो)	रुखी रुखी	रुखी	पशुकोपोडा
							सुनकागान्छी १	सुनकागान्छी २	नैरुखम स्थानीय							
१२	काकी नर्सरी उद्योग	धनकुटा-३	युवराज काकी	९८४२२५५५०५	१५,०००				५,०००							विरवाको उमेर ६ महिने
१३	दुधकोशी बहुउद्देश्य फलफूल नर्सरी तथा उत्पादन फर्म	शुलुङ दुधकोशी-८, सोलुखुम्बु	युवराज राई	९८६२९३००६४	४,०००				२,५००							विरवाको उमेर ६ महिने
१४	राज कुमार फलफूल नर्सरी	शुलुङ दुधकोशी -८, सोलुखुम्बु	राज कुमार राई	९८६२८५७८६३	१०,०००				१,०००							विरवाको उमेर ६ महिने
	जम्मा				८४,५००	-	४०,७००	९,३००	१७,७००	-	-	१,८००	-	-		१३,०००

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती

क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	आयोजना लक्षित फलफूल विरवाको विवरण										पशु/पक्षी
					सुन्तला (स्थानीय)	(सिर्जना) मो.नं.	कामती			मकैको बजारमा न. नं.	मकैको बजारमा न. नं.	किचो (हिवाड, एलिसन, बुनो, मोन्टी, रेड किचो)	रेड किचो	रेड किचो	पशु/पक्षी
							सुन्तला (स्थानीय)	सुन्तला (स्थानीय)	सुन्तला (स्थानीय)						
१	कृषि वन जडिबुटी नर्सरी	बेथानवोक-३, काभ्रेपलाञ्चोक	राम प्रसाद तिमलसिना	९८४९७९०३०	५००										
२	खहरे कृषि तथा जडिबुटी बहुउद्देश्यीय नर्सरी उद्योग	बेथानवोक-२, काभ्रेपलाञ्चोक	कृष्ण प्रसाद तिमलसिना	९८४९१०४२११											
३	गोल्डेन एगो. ईण्डस्ट्रिय प्रा.लि.	भुलुम-६, काभ्रेपलाञ्चोक	नन्द कुमारी सावद	९८६०४६८६०३											
४	सामरी सुन्तला तथा फलफूल नर्सरी	म्यागाङ-५, तुवाचोट	राम माया डैगोल	९८६२४४५२६६	३,०००										
५	कोलमतेधर एग्रिकल्चर फार्म प्रा.लि.	कागेश्वरी-४, काठमाडौं	विनोद प्रसाद घिमिरे	९८४९१३४३९											
६	सिखडा एण्ड सिखडा एग्रिकल्चर फार्म प्रा.लि.	कागेश्वरी-४, थली	रिता सापकोटा	९८४९२०४८९	१,५००	५००						५००	५००		६००
७	ओम नर्सरी	महालक्ष्मी-३, काठमाडौं	धन प्रसाद घिमिरे	९८४९२४००३३								३००	५००	५००	१,०००

क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	आयोजना लक्षित फलफूल बिरुवाको विवरण											
					सुन्तला (स्थानीय)	जंगल (प्रादेशिक) ग्राफिक	कागती			संकाईनिय नट	कागती भाँडा	खिबी (हेवाड, एलिसन, हूनो, मोन्दी, रेड खिबी)	चुर्चु ओखर	र्याउ	एथोकाई	
							सुनकागती १	सुनकागती २	तौल्युम स्थानीय							
८	मनकामना नर्सरी	बुढानिलकण्ठ-९, काठमाडौँ	कल्पना गुरुङ	९८५११५९६४४											२५०	
९	शैलुङ फलफूल नर्सरी	टोखा-६, काठमाडौँ	सत्यमान मोक्तान	९८४१७३५९८८	१,०००		३,०००			२,०००		६,०००			१,५००	
१०	ब्लु ओसियन एग्रो फर्म प्रा.लि.	दोरम्बा-१, मेघे, रामेछाप	विक्रम तामाङ	९८४०४०१२२६								१,२००				
११	सप्तमो एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.	गोगुलगांगा-३ रामेछाप	लक्ष्मण के सी	९८६१५८८४०३								१००				
१२	अमलक्षरी मल्टिप्रोडक्सन प्रा.लि.	सुनपाती-२, दिमिपोखरी, रामेछाप	मोहन बहादुर घिसिङ	९८५११७१२२३	४००	१,८००		६,०००								
१३	कामना फलफूल बहुउद्देशीय नर्सरी फर्म	ओखेनी-६, रामेछाप	सेर बहादुर तामाङ	९८६४०२७९६४	३,०००	२००	२७५		२,०४०							
	जम्मा				१,४००	३,५००	६,७७५	-	८,०४०	३,०४०	५०	८,१००	-	१,०००	३,७५०	८००

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी

क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	आयोजना लक्षित फलफूल विरुवाको विवरण												
					सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)	सुनकागती (सुनकागती)			
१	रानीटार कृषि फर्म	मध्यविन्दु-८ नवलपुर	नरेन्द्र कुमार के.सी.	९८४७२३८९०३	३,०००												
२	सफल कृषि फर्म	बौदीकाली-६ नवलपुर	दीपक चापागाई	९८५७०४००८६	१४,०००		३,०००										
३	टिकजा कृषि फर्म	आधिखोला-६, स्याङ्जा	यमनारायण ढकाल	९८४६०९४८७६	२,०००												
४	युद्धिहा कृषि फर्म	गल्याङ-७ स्याङ्जा	कृष्णप्रसाद पाठक	९८४९००३८२९													
५	बस्नेत मिश्रित फलफूल नर्सरी फर्म	गोरखा न.पा.-३, गोरखा	राणेश बहादुर बस्नेत	९८४६३२८१०७	८००	८,०००											
६	जनसेवा सुन्तलाजात फलफूल नर्सरी	गोरखा न.पा.-४	अर्जुन प्रताप राणा	९८४६६४८१५१													

क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	आयोजना लक्षित फलफूल विरसको विवरण											
					सुत्ताला (स्थानीय)	जुता (स्थानीय)	कागती			मकाले/सुत्ताला नं.	कालागि बढेको समय	किस्म (हेबार्ड, पेलिसन, बुनो, मोन्टी, रेड किस्म)	बिस्मिल्लो फल	उत्पादन	संख्या	
							सुत्ताला/कागती १	सुत्ताला/कागती २	तौथे/सुत्ताला							
७	शान्ति फलफूल नर्सरी सेवा वयरघारी	वालिङ न.पा.-८, दहथुम	कृष्ण बहादुर अधिकारी	९८४६०६७७३७	१०,०००	२००										
८	गोलाङ फलफूल तथा पशु नर्सरी	नवलपरासी-बसुपू-५	खेम बहादुर गोलाङ	९८४७२७१२७५												
९	विन्दवासिनि मिश्रित फलफूल नर्सरी नोरेश्वर	गोरखा न.पा.-३	निर्मल बाबु श्रेष्ठ	९८४६०८८८१३२	५,०००		६,५००		१०,०००							
१०	मुक्तिनाथ नर्सरी बैंक लि.	काठमाडौं म.न.पा.-३, वसुन्धरा	सिता राम काफ्ले	९८०२३५०१०६	१९,०००											
११	चर्ती नर्सरी उद्योग	बिरवा-२ स्याङ्जा	शामर थापा	९८५६३१५१४७	१,०००											
१२	मायांटारी कफी उद्योग	पुतलीबजार-११, स्याङ्जा	बोधराज अर्याल	९८४६०५२८३१	१०,०००	५,०००										
१३	सप्तगण्डकी एगोटेक प्रा.लि.	जलजला-५ पर्वत	हरिप्रसाद सुवेदी	९८५५०५१९५४	१,४००											
१४	अर्याल एगो कृषि फर्म	भीरकोट-७, स्याङ्जा	तारा अर्याल	९८४६११००६८	३,०००											
	जम्मा				५३,४००	५,२००	२४,३००	८,०००	१३,०००	-	-	-	-	-	-	-

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली

आयोजना लक्षित फलफूल बिरुवाको विवरण															
क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	सुनता (स्थानीय)	कागती				मकेशिनाको नाम	कान्छा बिरुवा	किमी (हेक्टर, एलिसन, बुगो, मोल्दी, रेड किमी)	रुपैयाँ प्रति	रुपैयाँ	रुपैयाँ
						सुनताको नाम		सुनताको नाम	रुपैयाँ प्रति						
						१. सुनताको नाम	२. सुनताको नाम								
१	विरेन्द्र नर्सरी तथा फलफूल उद्योग	भेरी न.पा.-०६, भेरे, जाजरकोट	ललित बहादुर घर्ती		१०,०००										
२	खड्का कृषि फर्म नर्सरी उद्योग	नलगाड न.पा.-०६, थाप्ला, जाजरकोट	पूर्ण बहादुर खड्का	९७६३९१८००२	२,०००										
३	कुशे आर्गाणिक कृषि फर्म	कुशे न.पा.-५, दम्दाला, जाजरकोट	शक्ति बहादुर बली	९७४२४५६०८७	८,०००										
४	बाटोपाखा हाइविड कृषि फर्म	कुशे न.पा.-५, दम्दाला, जाजरकोट	हरी बहादुर थापा	९७४९२६६८६६	४००० (२०००)										
५	प्रविन हिउँदे तथा बों फलफूल फर्म	कुशे न.पा.-५, दम्दाला, जाजरकोट	प्रविन थापा		३,०००										
६	मनकामना कृषि फर्म	कुशे न.पा.-५, दम्दाला, जाजरकोट			३००										
७	विना नर्सरी फर्म	कुशे न.पा.-५, नाउलीखेत, जाजरकोट	धन बहादुर सिंह	९७६८१७९३६२	४००० (३०००)										
८	खत्री नर्सरी उद्योग	छेडागाड-१२, जाजरकोट	भुम बहादुर खत्री	९७४४२७०८५४	७,०००										
१०	खड्का वि वि कृषि तथा पशुपन्छी फर्म	डुङ्गेश्वर-२, दैलेख	सुनिल राज वि सि		९००० (७०००)										
१२	ढकाल बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म	बागचौर-९, सल्यान	प्रेम प्रकाश शर्मा	९८६३११८१८१	१५,०००										
१३	गोल्डेन कृषि फर्म	बागचौर-९, सल्यान	निरज डि सि	९८५७८८२८८८	१३,०००										
१४	के एस बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	बागचौर-९, सल्यान	सन्दिप डोगी	९८६४७२०५१४	१०,०००										
१५	डि एन फलफूल तथा नर्सरी फर्म	बागचौर-९, सल्यान	दिपकराज ओली	९८४३३५५३०४	५,०००										
१६	योगी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म	छुत्रेश्वरी-१, सल्यान	बालराम योगी कुँवर	९८०६२८०९०५	१५,०००										
					८८,३००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	नर्सरीहरूको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नम्बर	आयोजना लक्षित फलफूल बिल्वाको विवरण											
					सुन्तला (स्थानीय)	जुनी (स्थानीय)	कागती			भेकाइ/मिया नद	कागती बढेसम्म	किमी (हवाई, एलिसन, कुनो, मोन्टी, रेड किमी)	चुल्छे आँखा	शेखर	स्थान	पुष्प/फूल/बिजा
							सुन्तलाकागती १	सुन्तलाकागती २	तेह्रथुम स्थानीय							
१	ध्रुव कृषि फलफूल तरकारी उत्पादन केन्द्र	अलिताल-२ लामीडुडा, डडेल्धुरा	लक्ष्मण थापा मगर	९८४५७९४९२६							५,०००	२,०००				
२	नवराज सुन्तला जात फलफूल नर्सरी उद्यान	भोगेश्वर-५ सिराङ, डडेल्धुरा	नव राज जैशी	९८६५६६५६५७	१५,०००			४,०००								
३	देवराज सुन्तला जात फलफूल नर्सरी	भोगेश्वर-५ सिराङ, डडेल्धुरा	देवराज महता	९८४८७३१२२८	४,०००			२,०००								
४	घटाल नर्सरी फलफूल तथा पशुपन्धी फर्म,	भोगेश्वर-५ सिराङ, डडेल्धुरा	राज बहादुर भट्ट	९८६६५५४९५४	३,०००			२००								
५	न्यू लवकुशा बहुउद्देशीय कृषि फर्म	सुर्नय-२ चित्लेपानी, बेतडी	मनोरत्न पाण्डे	९८४८९७२३५६												
६	वासुदेव बहुउद्देशीय कृषि तथा पशुपन्धी फर्म	सुर्नय-२ लिम्कटा, बेतडी	दिपक कुमार पाण्डे	९८४८८३५१५७									८,०००			
७	केदार कृषि नर्सरी	चुरे गा.पा.-१ अलाड, कैलाली	लाल ब. बोहरा	९८६६३२३२७८	१०,०००											
८	इवाणी बहुउद्देशीय पशुपालन तथा कृषि स्रोत केन्द्र	आदर्स गा.पा.-३, डोटी	खेम पाठक	९८५८४८३६३६	१,५००			१,०००								
					३३,५००	-	-	-	-		५,०००	१०,०००	-	-		
	कुल जम्मा				२६९,१००	८,०००	७१,७७५	२४,५००	३८,७४०	२,०५०	५०	१४,९००	२,७५०	१३,८००		

३.२ आयोजना सञ्चालन हुने ल्याच १, ल्याच २ र ल्याच ३ का स्थानीय तहहरूको विवरण

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	आयोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहको नाम	ल्याच १ का स्थानीय तहहरू	ल्याच २ का स्थानीय तहहरू	ल्याच ३ का स्थानीय तहहरू
१	कोशी	पाँचथर	हिलिहाङ, फिदिम			हिलिहाङ, फिदिम
		तेह्रथुम	आठराई, लालीगुराँस, म्याङलुङ, फेदाप			आठराई, लालीगुराँस, म्याङलुङ, फेदाप
		धनकुटा	छथर जोरपाटी, धनकुटा, महालक्ष्मी, पाखिबास	धनकुटा	छथर जोरपाटी, महालक्ष्मी, पाखिबास	
		भोजपुर	अरुण, भोजपुर पौवादुङमा		अरुण, भोजपुर पौवादुङमा	
		खोटाङ	हलेसी तुवाचुङ, रावा बैसी, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी			हलेसी तुवाचुङ, रावा बैसी, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी
		ओखलढुंगा	चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ, सुनकोशी		चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ, सुनकोशी	
२	बागमती	सोलुखुम्बु	सोलुदुधकुण्ड, थुलुङ दुधकोशी, माप्य दुधकोशी		सोलुदुधकुण्ड, थुलुङ दुधकोशी, माप्य दुधकोशी	
		नुवाकोट	लिखु, तादी		लिखु, तादी	
		सिन्धुपाल्चोक	चौतारा साँगाचोकगढी, ईन्द्रावती, मेलम्ची		चौतारा साँगाचोकगढी, ईन्द्रावती, मेलम्ची	
		धादिङ	नेत्रावती डबजोङ, त्रिपुरासुन्दरी, गजुरी	गजुरी	नेत्रावती डबजोङ, त्रिपुरासुन्दरी	
		गोरखा	आरुघाट, पालुङटार, सिरानचोक			आरुघाट, पालुङटार, सिरानचोक
		लमजुङ	बेसीशहर, मध्यनेपाल, मस्याङ्दी, राइनास, सुन्दरबजार			बेसीशहर, मध्यनेपाल, मस्याङ्दी, राइनास, सुन्दरबजार
३	गण्डकी	तनहुँ	म्याग्दे, ऋसिङ्ग		म्याग्दे, ऋसिङ्ग	
		कास्की	अन्नपूर्ण, मादी, पोखरा	पोखरा	अन्नपूर्ण, मादी	
		स्याङ्जा	विरुवा, चापाकोट, गल्याङ		विरुवा, चापाकोट, गल्याङ	
		पर्वत	जलजला, कुश्मा, मोदी, फलेवास	जलजला	कुश्मा, मोदी, फलेवास	
		मुस्ताङ	बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो-धेकर दामोदरकुण्ड, धरपझोङ, थासाङ			बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो-धेकर दामोदरकुण्ड, धरपझोङ, थासाङ
		मनाङ	नासौ, मनाङ डिस्पाङ, चामे		नासौ, मनाङ डिस्पाङ, चामे	
		म्याग्दी	अन्नपूर्ण, बेनी			अन्नपूर्ण, बेनी
		बागलुङ	बडिगाड, गल्कोट, जैमिनी, काठेखोला, निसीखोला			बडिगाड, गल्कोट, जैमिनी, काठेखोला, निसीखोला

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	आयोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहको नाम	व्याच १ का स्थानीय तहहरू	व्याच २ का स्थानीय तहहरू	व्याच ३ का स्थानीय तहहरू
४	कर्णाली	रुकुम पश्चिम	बाँफिकोट, मुसिकोट, सानी भेरी		बाँफिकोट, मुसिकोट, सानी भेरी	
		सल्यान	सिद्ध कुमाख, शारदा		सिद्ध कुमाख, शारदा	
		जाजरकोट	छेडागाड, जुनीचाँदे		छेडागाड, जुनीचाँदे	
		दैलेख	आठवीस, नारायण, चामुन्डा विन्द्रासैनी	नारायण	आठवीस, चामुन्डा विन्द्रासैनी	
		कालीकोट	शुभकालिका, नरहरीनाथ			शुभकालिका, नरहरीनाथ
		जुम्ला	हिमा, सिजा, कनकासुन्दरी			हिमा, सिजा, कनकासुन्दरी
		मुगु	खत्याड, सोरु			खत्याड, सोरु
		हुम्ला	तौजाकोट, अदानचुली			तौजाकोट, अदानचुली
५	सुदूरपश्चिम	डोल्पा	मुडुकेचुला			मुडुकेचुला
		अछाम	बात्रीगढी जयगढ, कमलबजार, मङ्गलसेन, पञ्चदेवल विनायक, तुर्माखाँद			बात्रीगढी जयगढ, कमलबजार, मङ्गलसेन, पञ्चदेवल विनायक, तुर्माखाँद
		बाजुरा	बुढीनन्दा, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर			बुढीनन्दा, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर
		बैतडी	दशरथचन्द, पाटन	दशरथचन्द	पाटन	
		वझाङ	छविसपाथिभेरा, मष्टा, जयपृथ्वी, बुङ्गल		छविसपाथिभेरा, मष्टा, जयपृथ्वी, बुङ्गल	
		दार्चुला	शैल्यशिखर, लेकम		शैल्यशिखर, लेकम	
जम्मा	५	३४	१००	६	४८	४६

खण्ड घ
कार्यक्रमका भेलकहरु

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमका तस्बीरहरु



दिगो कृषि फर्म, जुनीचाँदे गा.पा.-१०, जाजरकोट चुच्चे ओखर (२० रोपनी)



सोलुदुधकुण्ड न.पा., वडा नं-८, डिमिटर एग्रो. प्रा.लि. ले तयार गरेको उच्च घनत्व स्याउको बगैँचा

Detail of varietal characteristics of registered variety “Malepatan Macadamia”





Capacity building program for Project Implementation Unit in South Korea



Implementation Review Mission August 2025



किवी बर्गैचा स्थापना गर्नका लागि रेखाङ्कन कार्य, आयुष अनुष कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.-१, धनकुटा (२० रोपनी)



जे एन एस कृषि फार्म छेडागाड-०१, जाजरकोट-३



पासाङल्हामु कृषि फर्म, भोजपुर न.पा.-२ मा तयार भएको किवी बगैंचा र सिँचाइ संरचना



फिदिम नगरपालिका वडा नं-१२, पाँचथरको डिङमा च्याङछ्युप छयोलिङ महिला कृषक समूहले, २० रोपनी क्षेत्रफलमा किवीको बिरुवा रोपण



आयोजनाको कार्यान्वयन एकाइहरूलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी तालिम



Project Implementation Review Mission August 2025



Joint Workshop of stakeholders of NAFHA Project



Project Orientation to FGE, SM and local level technicians, PIU Koshi



Project Implementation Review Mission September 2024



नर्सरी व्यवस्थापन तालिम, सुर्खेत



इनार्चिङ्ग गरिएको मेकाडेमिया नट बिरुवाहरू, बागवानी विकास केन्द्र, त्रिशुली



कलमी गरिएको एभोकाडो बिरुवाहरू, बागवानी विकास केन्द्र, त्रिशुली



उत्पादनशील अवस्थाको उच्च घनत्व बगैँचा, मुस्ताङ



कागजी बदाम



किवी फलफूल नर्सरी



दि.रु.म.न.पा वडा नं.-२ मा शेर्पा किवी उत्पादन तथा पशुपालन फार्ममा निर्माण भएको किवी बगैँचा




फलफूल नर्सरी निरीक्षण तालिम



सुन्तलाजात फलफूलका बिरुवा उत्पादन, नवराज सुन्तलाजात फलफूल नर्सरी, डडेल्धुरा



Nuts and Fruits in Hilly Areas Project Area

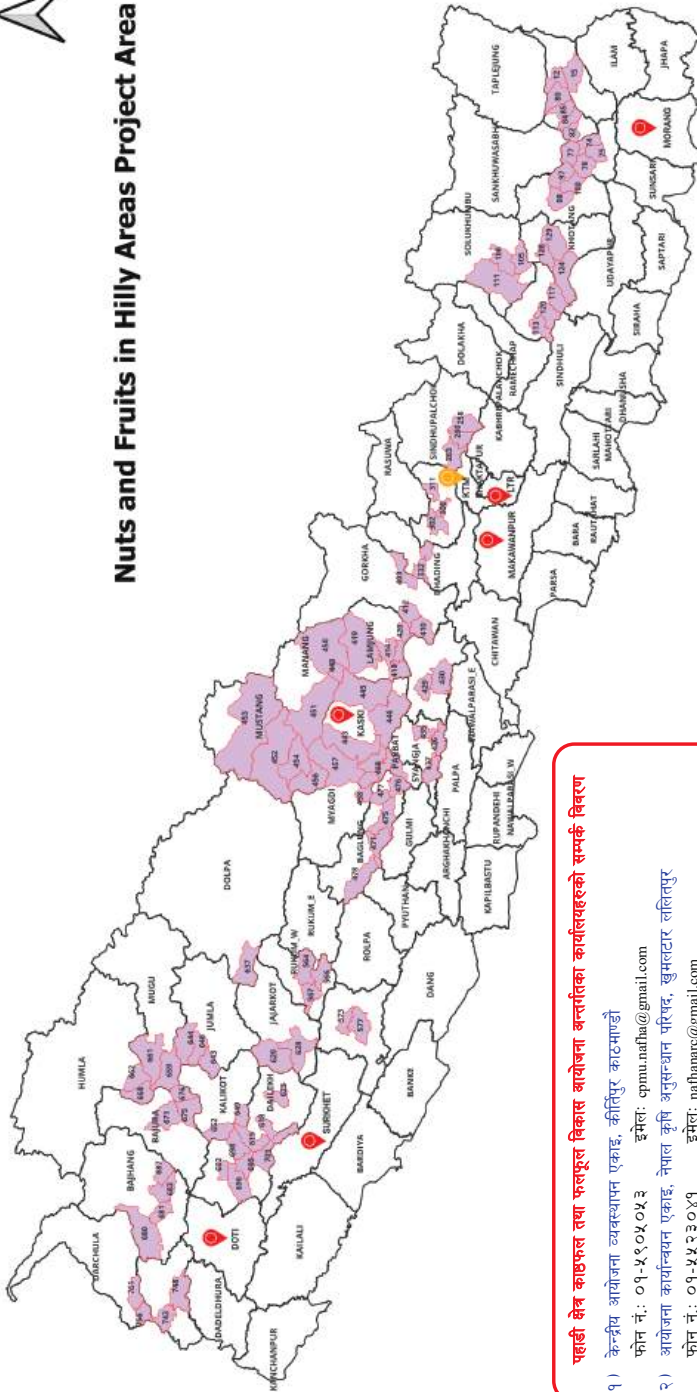

पहाडी क्षेत्र काठफल तथा फलफूल विकास आयोजना वनस्पतिका कार्यालयहरूको सम्पर्क विवरण

- १) केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर काठमाण्डौ
फोन नं.: ०१-४९०४०४३ इमेल: cpnu.nafha@gmail.com
- २) आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, सुमलटार ललितपुर
फोन नं.: ०१-४४२३०४१ इमेल: nafhanarc@gmail.com
- ३) आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, विराटनगर मोरङ
फोन नं.: ०२१-४१६४६८, ०२१-४११३४८ इमेल: pupl.nafha@gmail.com
- ४) आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, हेटौडा मकवानपुर
फोन नं.: ०४७-४२०४६६, ०४७-४२११०४, ०४७-४९०४८
इमेल: bibagmati.nafha@gmail.com
- ५) आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, पोखरा कास्की
फोन नं.: ०६१-४२०२७३, ०६१-४२०२६३, ०६१-४४०८९४
इमेल: piugandaki.nafha@gmail.com
- ६) आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत
फोन नं.: ०८३-४२०३०४, ०८३-४२०१८१ इमेल: piukarnali.nafha@gmail.com
- ७) आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दिपायल डोटी
फोन नं.: ०९४-४४०१९८७, ०९४-४४००१० इमेल: piusudurpaschim.nafha@gmail.com

आयोजना कार्यक्षेत्र र लक्षित बाली



नेपाल सरकार
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
कृषि विभाग
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना
केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ
कीर्तिपुर, काठमाडौं

फोन : ०१-५५०५०३७
इमेल : cpmu.nafa@gmail.com
वेबसाइट : www.nafha.gov.np
